



رئاسة الوزراء

التقرير النصف السنوي الأول

عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي 2018-2022

لغاية 30 نيسان 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رئاسة الوزراء

التقرير النصف السنوي الأول

عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي 2018-2022

لغاية 30 نيسان 2019

المحتويات

1.....	المحتويات
2.....	المقدمة
3.....	المنهجية
4.....	ملخص تحليلي لتنفيذ البرنامج الحكومي
4.....	١. مخطط لسير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي
5.....	٢. المعايير والأوزان المعتمدة في قياس انجاز المشاريع
6.....	٣. معدل نسب الإنجاز والحيود الكلي للبرنامج الحكومي – النصف الأول لسنة 2019
7.....	٤. تفاصيل ما أنجزته الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من مشاريع محاور البرنامج الحكومي للنصف الأول لسنة 2019
8-7.....	جدول يوضح تفاصيل ما أنجزته الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للنصف الأول لسنة 2019
11-9.....	بيانات واحصائيات
64-12.....	الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
.....	ملحق تفصيلي لمشاريع الوزارات

المقدمة

تسعى الحكومة العراقية الى بناء اقتصاد سليم وتقديم أفضل الخدمات لرفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال برنامج حكومي متوازن يدعم مجموعة من القطاعات الخدمية والاقتصادية والأمنية عبر مشاريع طموحة واجراءات وانشطة من شأنها رفع العبء عن كاهل العراقيين، فبعد تكليف السيد عادل عبد المهدي برئاسة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي على المنهاج الوزاري والتصويت على الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الأول 2019، وفقا للمادة (76 / رابعاً) من دستور العراق، أطلقت الحكومة العراقية برنامجها الحكومي في 5 شباط 2019 والذي تضمن (5) محاور بـ (1065) مشروع تعمل تحت (154) فقرة، تمثل ما حددته الوزارات من التزامات لفترة (4) سنوات قادمة، مع العرض ان العمل قد جرى خلال الفترة المنصرمة ولغاية اعداد هذا التقرير.

يعكس هذا التقرير، تنفيذ خطط ومشاريع الوزارات والجهات ضمن التزامها في البرنامج الحكومي لغاية نهاية نيسان من عام 2019، حيث تم تحقيق معدل إنجاز يصل الى (79%) من مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات والجهات في البرنامج الحكومي للفصل الأول والثاني من عمر الحكومة، مازال العمل مستمر لتحقيق كل مستهدفات البرنامج الحكومي.

يشكل هذا التقرير وثيقة مهمة لصانعي السياسات ومتخذي القرار الحكومي، تمكنهم من الوقوف على واقع الحال، بغية دعم وتعزيز الإنجازات المتحققة والعمل على معالجة الأسباب التي اعاققت تنفيذ قسم من البرامج والمشاريع، بوضع خيارات وحلول بديلة وأخذ القرارات المناسبة التي تضمن الاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي وإيفاء الحكومة بالتزاماتها امام المواطنين.

يتألف هذا التقرير من :

1. المقدمة ومنهجية العمل.
2. ملخص تحليلي لتنفيذ البرنامج الحكومي (حجم ما تم تنفيذه من البرنامج).
3. معدل انجاز وحيود الوزارات والجهات مع تحديد أسباب الحيود وتحليل لبياناتها.
4. ملحق تفصيلي لمشاريع الوزارات.


المنهجية

١. يعرض هذا التقرير النصف سنوي (الأول) معدل نسبة إنجاز وحيود البرنامج الحكومي من ٢٠١٨/١١/١ ولغاية ٢٠١٩/٤/٣٠، حيث يوثق إنجاز وحيود المشاريع التي تعمل عليها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. ضمن التزامها في البرنامج الحكومي.
٢. اعتمد تاريخ ٢٠١٨/١١/١، اساس ونقطة شروع لقياس التحسن أو التقدم في نسب الإنجاز للبرنامج الحكومي.
٣. عملت الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي برئاسة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي على المنهاج الوزاري والتصويت على الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ تشرين الأول ٢٠١٩، وفقا للمادة (٧٦ / رابعاً) من دستور العراق، على إعداد منهجية لكي تبني الوزارات خططها للسنوات ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ استناداً الى المنهاج الوزاري وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، لإعداد البرنامج الحكومي خلال (١٠٠) يوم، حيث تضمنت هذه الخطط مشاريع الوزارات ومستهدفاتها لأربع سنوات (عمر الحكومة) كما جرى وضع مستهدفات فصلية لكل سنة بهدف تحقيق قدر عال من الدقة في عملية متابعة التنفيذ هذه الخطط وإصدار التقارير النصف سنوية للبرنامج الحكومي.
٤. تمت المصادقة على البرنامج الحكومي من قبل مجلس الوزراء واعلانه في ٢٠١٩/٢/٥، حيث تم اعداد انموذج الكتروني لجمع البيانات الخاصة بمشاريع واجراءات وانشطة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ضمن التزامها بالبرنامج الحكومي، لغرض اعداد التقارير الفصلية الدورية لمتابعة عملية التنفيذ وتحديد نسب الانجاز والحيود.
٥. عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورش عمل للمعنيين بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي في الوزارات والجهات لمختلف المستويات، بهدف اطلاق الاخير على آلية العمل وطريقة إملاء الانموذج الالكتروني المذكور.
٦. تم استلام البيانات من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفقاً للأنموذج الالكتروني المشار اليه، عن طريق البريد الالكتروني وكذلك البريد الرسمي حيث كان اخر موعد الاستلام البيانات من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢، عقدت بعدها مجموعة من الاجتماعات المنفصلة والمتكررة مع الوزارات لمراجعة وتعديل بياناتها للوصول الى البيانات النهائية حيث جرت عملية تدقيق ومطابقة وتحليل للبيانات قبل اعداد هذا التقرير بصيغته النهائية.

ملخص تحليلي لتنفيذ البرنامج الحكومي

٢٠٢٢-٢٠١٨


١. مخطط لسير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي

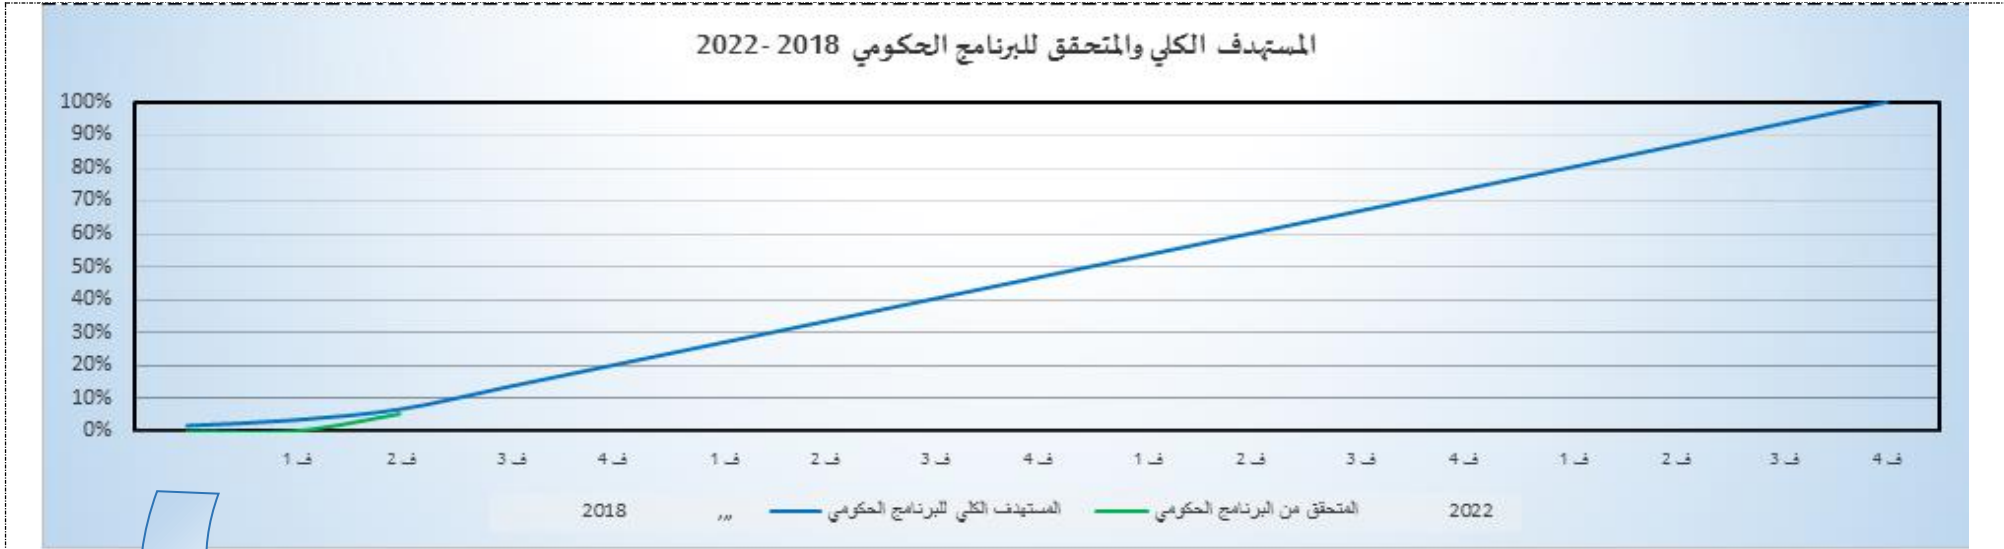

مخطط سير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي

يوضح المخطط في أعلاه، سير عملية تنفيذ البرنامج الحكومي لفترة الأربع سنوات 2022-2018 (عمر الحكومة)، أما المخطط على جهة اليسار فيمثل سير تنفيذ البرنامج الحكومي خلال الفصلين الأول والثاني، حيث يظهر وبشكل واضح الفرق في التنفيذ بين الخط الأزرق والذي يمثل مستهدف البرنامج الحكومي، والخط الأخضر والذي يمثل متحقق البرنامج الحكومي، وهذا الفرق بين الخطين يمثل الجيود.

المستهدف الكلي والمتحقق للفصل الثاني 2019

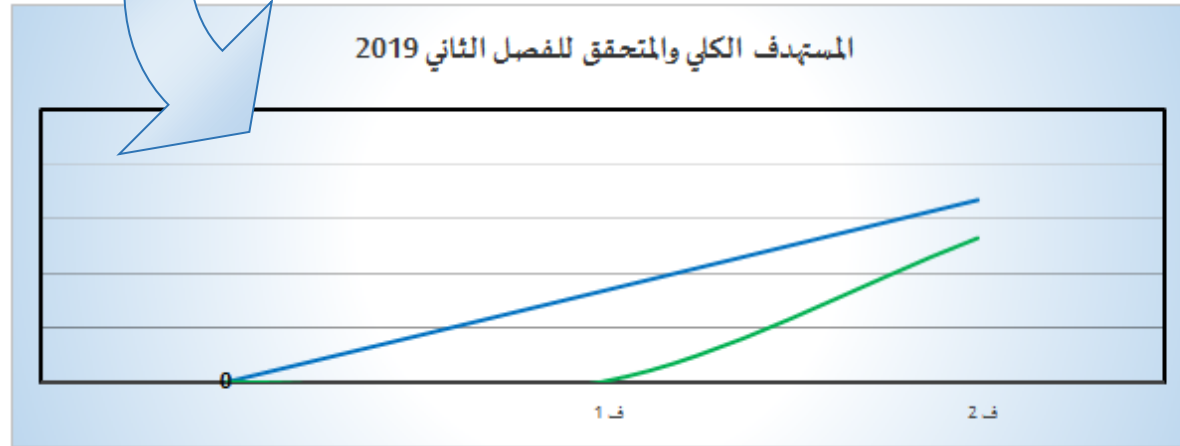


٢. المعايير والأوزان المعتمدة في قياس إنجاز المشاريع:

بُغية وضع تصور واضح عما أنجزته الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ولتوحيد معايير قياس المنجز للمشاريع والإجراءات المتعلقة بها، جرى اعتماد أوزان ومعايير موحدة وجرى تزويد كل الجهات التي لديها مشاريع ضمن البرنامج الحكومي من أجل اعتمادها واستخراج النتائج التي تتيح التعرف على المنجز من البرنامج الحكومي بصورة عامة وعلى وفق كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ونوضح هذه المعايير والأوزان في أدناه:-

١. مساهمة المشروع في تحقيق التزامات الوزارة ضمن البرنامج الحكومي (بدرجة عالية، إلى حدٍ ما، لا يسهم)
 ٢. احتمالية نجاح المشروع في التنفيذ (احتمالية عالية، احتمالية متوسطة، احتمالية واطئة)
 ٣. سرعة ظهور نتائج المشروع (أقل من سنة، سنة-٣ سنوات، أكثر من ٣ سنوات)
 ٤. اعتماده على تنفيذ مشاريع أخرى (بدرجة عالية، إلى حدٍ ما، لا يعتمد)
 ٥. السمة الأساسية للمشروع (بني تحتية، خدمات أساسية، استثماري واقتصادي، تنمية بشرية ومجتمعية، غير ذلك)
 ٦. يوفر فرص عمل اثناء الإنشاء (لاتوفر، ١-١٠٠ فرصة عمل، ١٠١-١٠٠٠ فرصة عمل، ١٠٠١-١٠٠٠٠ فرصة عمل، أكثر من ١٠٠٠٠ فرصة عمل)
 ٧. يوفر فرص عمل مستدامة (لاتوفر، ١-١٠٠ فرصة عمل، ١٠١-١٠٠٠ فرصة عمل، ١٠٠١-١٠٠٠٠ فرصة عمل، أكثر من ١٠٠٠٠ فرصة عمل)
- حيث وضعت أوزان لكل واحدة من خيارات الإجابة على أن لا تتعدى نتائج احتسابها لكل مشروع عن ١٠٠%.

٣. معدل نسب الإنجاز والحيود الكلي للبرنامج الحكومي للنصف الأول من سنة ٢٠١٩

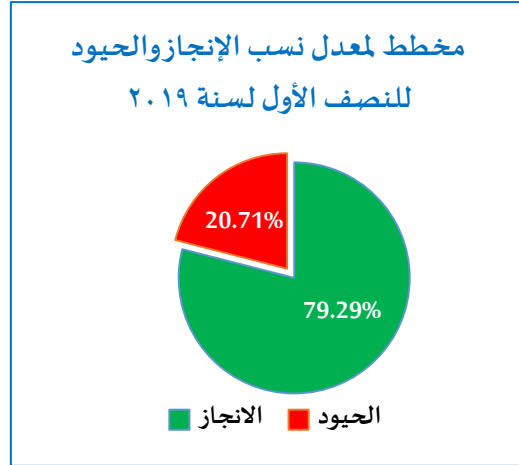

الشكل البياني يمثل نسبة إنجاز الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للبرنامج الحكومي خلال النصف الأول لسنة ٢٠١٩ وهي (79.29%) وبمعدل حيود* (20.71%) خلال

*ملحوظة:- الحيود هو عدد مشاريع وأنشطة الوزارة في البرنامج الحكومي، والتي لم تحقق مستهدفاتها خلال النصف الأول من سنة ٢٠١٩.

أهم أسباب الحيود التي جرى تشخيصها من خلال تحليل البيانات الواردة إلينا من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مرتبة على وفق الأهمية:-

١. عدم إطلاق أو تأخر التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
٢. مناقلة التخصيصات المالية من موازنة الوزارات الى المحافظات.
٣. عدم وجود تخصيصات مالية لعدد من مشاريع الوزارات أو قلّتها.
٤. عدم اقرار خطط الوزارات من قبل وزارة التخطيط أو تأخرها.
٥. الوضع الأمني في بعض مناطق تنفيذ المشاريع.
٦. تعرض عدد من مشاريع الوزارات لأضرار جراء العمليات العسكرية.
٧. تخفيض تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعدد من الوزارات ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٩.
٨. أسباب فنية خاصة بتنفيذ عدد من مشاريع الوزارات.
٩. عدم أو تأخر المصادقة على مشاريع القوانين من قبل السلطة التشريعية.
١٠. عدم موافقة وزارة التخطيط على ادراج فقرات خاصة لعدد من مشاريع الوزارات.
١١. القرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥، والخاص باعادة اولويات ادراج المشاريع والذي ادى تطبيقه الى توقف معظم المشاريع، ولم يتم البت به لغاية الان.

٤. تفاصيل ما أنجزته الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من مشاريع محاور البرنامج الحكومي للنصف الأول لسنة ٢٠١٩

جدول رقم (١) يوضح تفاصيل ما أنجزته الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي للنصف الأول من سنة ٢٠١٩													
ت	الوزارة	اعداد مشاريع محاور البرنامج الحكومي					فقرات الوزارة	اعداد مشاريع الوزارات					
		الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس		الكلي	الإنجاز الكلي		فيها حيود		
									المنجزة	حققت مستهدفها	مستمرة	متوقفة	
1	الخارجية	المحور الأول عبارة عن مجموعة من الإجراءات داخل فقرات وهي ليس من التزام الوزارات	15				6	15	0	15	0	0	
2	الدفاع		19				5	19	0	6	5	8	
3	النفط			26			11	26	2	13	9	2	
4	الداخلية		91				12	91	6	47	12	26	
5	الكهرباء				17		11	17	0	10	6	1	
6	المالية					90	10	90	2	39	37	12	
7	التخطيط		1				5	21	0	15	7	0	
8	التجارة					20	3	20	2	17	1	0	
9	التربية						3	10	0	4	4	2	
10	التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا						5	82	1	62	15	4	
11	العدل		10				2	10	0	9	0	1	
12	الصحة والبيئة				56		9	56	11	45	0	0	
13	العمل والشؤون الاجتماعية					21	4	21	0	17	4	0	
14	الصناعة والمعادن		2				6	55	7	48	2	0	
15	الزراعة			3			5	20	0	17	0	6	
16	النقل						4	47	0	47	0	0	
17	الاتصالات						6	7	1	6	0	0	
18	الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة						6	215	2	144	57	12	
19	الشباب والرياضة						7	88	2	71	6	9	
20	الموارد المائية				75		6		0	17	22	36	
21	الثقافة						8	41	2	27	7	5	
22	الهجرة والمهجرين						5	21	5	9	4	3	
23	أمانة بغداد						2	4	0	1	3	0	
24	البنك المركزي العراقي					8	3		1	3	2	2	
	اعداد مشاريع البرنامج الحكومي		138	177	214	536		1065	44	369	203	129	
	تفاصيل مشاريع المحور الثاني												
	تفاصيل مشاريع المحور الثالث												
	تفاصيل مشاريع المحور الرابع												
	تفاصيل مشاريع المحور الخامس												

بيانات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن ما أنجزته من البرنامج الحكومي خلال النصف الأول لسنة ٢٠١٩

قبل المباشرة بشرح ماجاء في الجدول رقم (١) نود توضيح المفردات الواردة فيه وهي كما مبين في أدناه:-

(١) محاور البرنامج الحكومي:-

المحور الأول "استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي"

المحور الثاني "سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي"

المحور الثالث "الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية"

المحور الرابع "تقوية الاقتصاد"

المحور الخامس "الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية"

(٢) تعريف المفردات الواردة في الجدول:-

ت	المفردة	تعريفها
١	الكلي	هو مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي.
٢	الإنجاز الكلي	مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي، والتي أنجزتها بشكل كامل وبنسبة (١٠٠%) خلال النصف الأول لسنة ٢٠١٩
٣		مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي التي حققت المخطط لها خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة ١٠٠% أو ستحققه خلال النصف الثاني منها والمستمرة بالإنجاز وفق المخطط لها
٤	مستمرة	مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي والتي حققت أقل من المخطط لها خلال النصف الأول لسنة ٢٠١٩
	متوقفة	مشاريع وأنشطة الوزارة المثبتة في البرنامج الحكومي والتي لم تحقق مستهدفاتها خلال النصف الأول لسنة ٢٠١٩

بيانات واحصائيات

يوضح الجدول رقم (١) بيانات الوزارات لتنفيذ البرنامج الحكومي للنصف الأول لسنة ٢٠١٩، وبشأنها نود بيان الآتي:-


أولاً- مشاريع ونشاطات البرنامج الحكومي على وفق الإنجاز والحيود:-

يندرج تحت هذا العنوان (1065) مشروعاً نبين تفاصيلها في أدناه:-

١. على وفق مستوى الإنجاز:-

أ. عدد المشاريع المنجزة هو (44) مشروعاً.


ب. عدد المشاريع التي حققت مستهدفها هو (689) مشروعاً والذي يعني إنه مستمر بالإنجاز ضمن الخطة

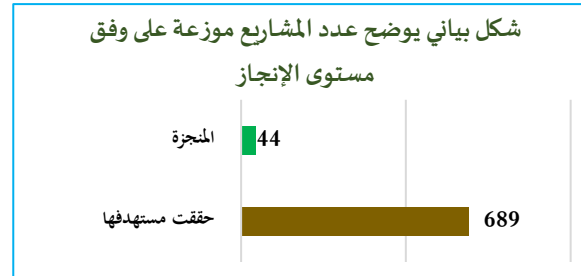

٢. على وفق الحيود:-

أ. عدد المشاريع المستمرة التي حققت أقل من مستهدفها هو (203) مشروعاً.

ب. عدد المشاريع المتوقفة هو (129) مشروعاً.

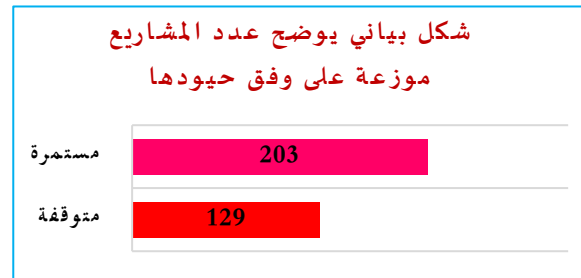

ثانياً- مشاريع ونشاطات البرنامج الحكومي موزعة على وفق محاوره:-

١. عدد مشاريع البرنامج الحكومي موزعة على وفق محاوره:-

المحور الأول: يتضمن المحور الأول (31) اجراءاً أو نشاطاً تدرج تحت (12) فقرة لها (6) أولويات، منها (5) إجراءات منجزة و(24) اجراءاً قيد الإنجاز و(إجرائين) غير منجزة

المحور الثاني: يتضمن هذا المحور على (138) مشروعاً منها:-

أ. (8) مشاريع منجزة بشكل كلي.


ب. (37) مشروع حققت مستهدفها والذي يعني مستمر بالإنجاز ضمن الخطة.

ج. (52) مشروعاً فيها حيود منها (17) مشروع مستمر لكن دون المخطط له و(35) مشروع متوقف.


المحور الثالث: يتضمن هذا المحور على (177) مشروعاً منها:-

أ. (13) مشاريع منجزة بشكل كلي.

- ب. (68) مشروع حققت مستهدفها والذي يعني مستمر بالانجاز ضمن الخطة.
- ج. (77) مشروعاً فيها حيود منها (37) مشروع مستمر لكن دون المخطط له و(40) مشروعاً متوقفاً.
- المحور الرابع: يتضمن هذا المحور على (214) مشروعاً منها:-
- أ. (10) مشاريع منجزة بشكل كلي.
- ب. (82) مشروع حققت مستهدفها والذي يعني مستمر بالانجاز ضمن الخطة.
- ج. (65) مشروعاً فيها حيود منها (46) مشروع مستمر لكن دون المخطط له و(19) مشروعاً متوقفاً.
- المحور الرابع: يتضمن هذا المحور على (536) مشروعاً منها:-
- أ. (13) مشروعاً منجزة بشكل كلي.
- ب. (182) مشروع حققت مستهدفها والذي يعني مستمر بالانجاز ضمن الخطة.
- ج. (138) مشروعاً فيها حيود منها (103) مشروع مستمر لكن دون المخطط له و(35) مشروعاً متوقفاً.

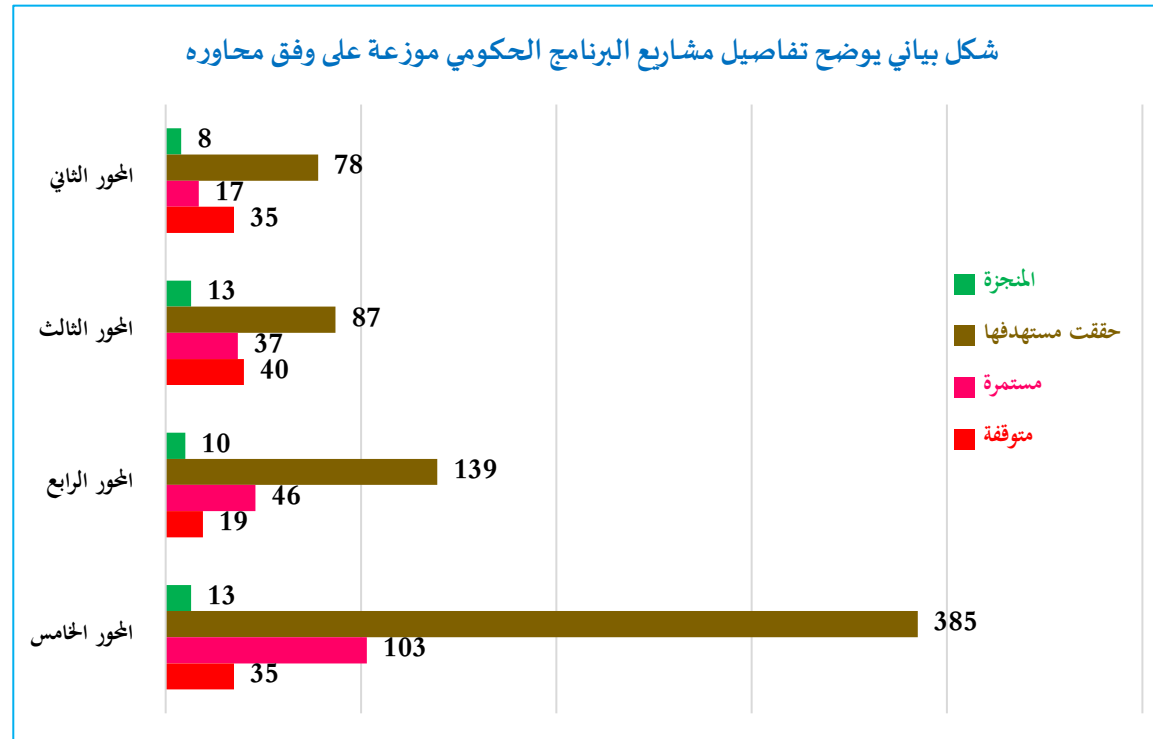

شكل بياني يوضح تفاصيل مشاريع البرنامج الحكومي موزعة على وفق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

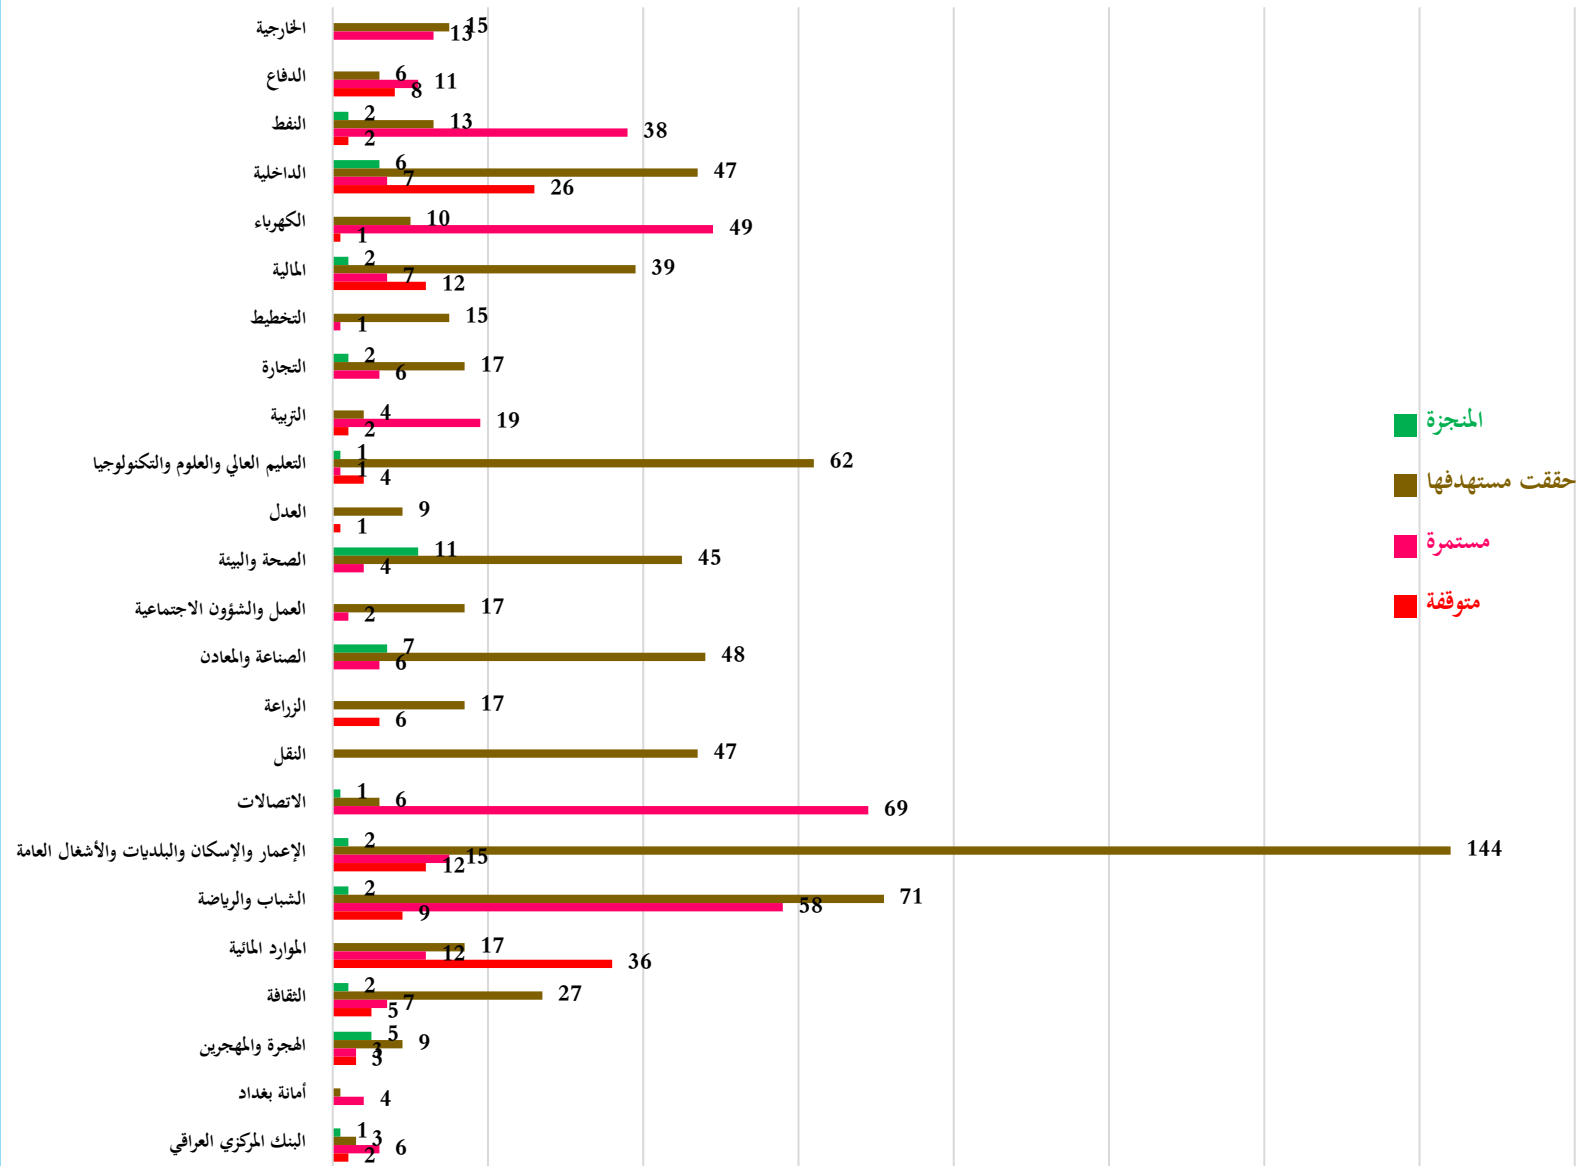

وزارة الخارجية

المحور الثاني


(سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها


■ فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (15) مشروع، (15) منها حققت مستهدفها، وبالتالي ليس لديها اي حيود على مستوى الفقرات والمشاريع والاجراءات والانشطة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، وليس لديها اي حيود يذكر، وانجازها يظهر نتيجة معدل الانجاز في الفقرات (3 و 5)، أما الفقرات (1 و 2 و 4 و 6) فالوزارة ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة.

بالرغم من عدم وجود مستهدفات للفقرات (1 و 2 و 4 و 6) خلال هذا الفصل، فقد حققت الوزارة بعض الانجاز هنا وهناك، فقد تم مفاتحة جميع البعثات العربية والاجنبية في بغداد لدعم حصول الاخير على عضوية مجلس حقوق الانسان ضمن نشاط (الحصول على عضوية المنظمات الدولية) - فقرة (1)، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتشجيع الاستثمار مع الجانب السعودي والكويتي والاردني في مجال تجهيز النفط والاتصالات والنقل وغيرها من الأمور الخدمية ضمن نشاط (توفير مناخ استثماري جاذب وتسهيل دخول رؤوس الأموال للمشاركة في عملية التنمية) - فقرة (4). وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز مكافحة الارهاب العراقي والمجري في 17-11-2018 ضمن نشاط (توقيع اتفاقيات للتعاون في المجال الامني) - فقرة (6).

وزارة الدفاع

المحور الثاني


(سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (19) مشروع، (13) منها فيها حيود و(6) حققت مستهدفها، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي :

1. عدم المصادقة على الخطة من قبل وزارة المالية.
2. عدم اقرار خطة مشاريع الاشغال الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط.
3. عدم وجود تخصيصات مالية.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحاور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (3)- مشروع (توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتادخفيف) (اطلاقه) وكذلك مشروع (توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتادمتوسط) (اطلاقه)، وسببهما عدم ورود اجابة من وزارة الصناعة على طلب وزارة الدفاع.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (4) مشاريع ضمن الفقرة (1)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم توفر التخصيصات المالية لهذه المشاريع والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

لدى الوزارة مشروع واحد باللون الأزرق (مستمر وليس له تخصيصات مالية) – ضمن الفقرة (1)، ويعاني من عدم اطلاق التخصيصات المالية، لكن الوزارة اوجدت حلول بديلة لتنفيذه ليصبح نسبة معدل انجازه (78%).

وزارة النفط

المحور الثالث


(الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود




أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (26) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و (13) حققت مستهدفها و (11) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة ولا يمكن اعتبارها أسباب عامة بل هي ترتبط بالمشروع نفسه مثل:


1. حيود مشروع استثمار غاز بن عمر - لم يتم تقديم عرض شركة اوريون الامريكية.
2. حيود مشروع استثمار الغاز في حقول ميسان (حقل حلفاية) - وجود خلاف على اقرار بعض المواصفات الفيزيائية للغاز.
3. مشروع استثمار غاز حقل الناصرية - وجود نقاط عالقة لا زالت قيد المناقشة بين طرفي العقد بخصوص التصميم الاساسي ومنظومة التجميع.
4. مشروع الانبوب البحري - انتهاء العقد مع المفاوض شركة لايتون وتأخر المصادقة على اتفاقية التسوية الرضائية من قبل المجلس الوزاري للطاقة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (٤) اكمال مشاريع المصافي....




فقرة (٣) القيام بدور بناء وفاق....




فقرة (٢) التعجيل في تطوير وتوسيع....




فقرة (١) الاستمرار في تطوير الطا....




فقرة (8) لمساهمة بتطوير الصناعات....




فقرة (7) لتركيز على ايجاد فرص....




فقرة (٦) دراسة تقليص مساحات....




فقرة (٥) تشكيل فريق هندسي....




فقرة (11) وضع قانون شركة الن....



فقرة (10) تنفيذ مشروع السيارات....



فقرة (9) مد منظومات الغاز الى الأ....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثالث من البرنامج الحكومي وضمن (11) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (11)- مشروع (وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق)، حيث صدر قانون الشركة في عام 2018 الا انه لم يتم وضعه موضع التطبيق لصدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية بعض المواد الواردة فيه مع العرض ان الوزارة تسعى في الوقت الحالي الى اعادة تفعيل عمل الشركة وتعديل قانونها.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. تشكيل فريق هندسي استشاري - ضمن الفقرة (5).

2. تقليص المحرمات النفطية والغازية - ضمن الفقرة (6).

علماً أن الوزارة تعمل على (26) مشروع اغلبها مشاريع استثمارية ومشاريع تدرج ضمن جولات التراخيص.

وزارة الداخلية

المحور الثاني


(سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود




أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (91) مشروع، (6) منها انجزت بشكل كامل و (47) حققت مستهدفها و (38) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي :


1. عدم وجود تخصيصات مالية.
2. تعرض بعض المشاريع لاضرار جراء العمليات العسكرية.
3. القرار 347 لسنة 2015 والذي لم يتم البت به لغاية الان.
4. تخفيض تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارة من (270) مليار الى (122) مليار ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) تكثيف الجهود الرامية ل....




فقرة (٢) ستحرص الحكومة على بناء....




فقرة (٣) فك الاختناقات المروري....




فقرة (٤) استكمال تسجيل المركبات....




فقرة (٥) تحسين الخدمات الأمنية....




فقرة (٦) إعادة تنظيم الشرطة....




فقرة (7) حصر السلاح بيد الدولة....




فقرة (8) تقليص السيطرة من....




فقرة (9) تأمين مراكز المراقبة الفيد....




فقرة (10) تفعيل أنظمة المرور....



فقرة (11) فتح المنطقة الخضراء....



فقرة (12) التوسع في فتح المناطق....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (12) فقرة وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (6)- مشروع (انشاء مقر مديرية شرطة بابل)، وسببه عدم كفاية التخصيصات المالية، ومشروع (انشاء بناية مديرية حماية المنشآت الحيوية في كركوك)، وسببه عدم تأمين التخصيصات المالية، بالرغم من كون المشروعين باللون الاخضر (مشروع مستمر وله تخصيصات مالية)، وكذلك في الفقرات (1 و 5 و 9) وبمجموع اجمالي قدره (38) مشروع فيه حيود.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (28) مشروع ضمن الفقرات الـ (12) وعلى وجه الخصوص الفقرات (7 و 8 و 12)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو التخفيض الذي حصل في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 وكذلك سحب العمل وقرار 347 لسنة 2015 والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل الفقرات (3 و 10 و 11)، وكذلك مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. شراء عجلات مدرعة عدد / 350 نوع هامفي لوزارة الداخلية - ضمن الفقرة (1)،

2. شراء الاجهزة اللاسلكية ذات المواصفات العسكرية نوع هارس - ضمن الفقرة (6).

وزارة الكهرباء

المحور الثالث


(الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (17) مشروع، (10) منها حققت مستهدفها و(7) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي:

1. عدم اطلاق التمويل أو تأخر اطلاقه.
2. تأخر إجراءات المصادقة على المشاريع أو تأخر إجراءات التعاقد.
3. وجود توقفات وتمديدات في بعض المشاريع.



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثالث من البرنامج الحكومي وضمن (11) فقرة وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (4)- مشروع مشروع اكمال مشاريع انتاج الوزارة المتوقفة والمقترحة

حسب خطة الوزارة (تتضمن وحدات بخارية وغازية)، وكذلك في الفقرات (1 و 5 و 8) ولم توضح الوزارة اسباب هذا الحيود.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشروع (الطاقات المتجددة) ضمن الفقرة (5) قد اكمل اجراءات المناقصة وتخصيص الاراضي وحصل على الموافقات وقد تم طرحه والاعلان عنه

كفرصة استثمارية.

وزارة المالية

المحور الرابع


(تقوية الاقتصاد)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود




أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (90) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و (39) حققت مستهدفها و (49) فيها حيود، حيث ان سبب الحيود هذا جاء نتيجة عدم الحصول على التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) اعادة النظر بفلسفة المواز....




فقرة (٢) الانتقال الى الحوكمة الال....




فقرة (٣) الانتقال من فلسفة ان....




فقرة (٤) اعتماد الجبابة

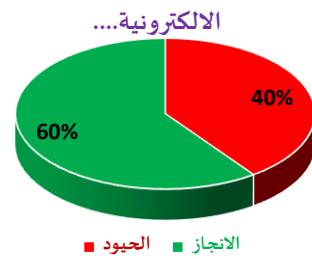


فقرة (٥) تطوير النظام المصرفي....




فقرة (٦) المصارف عتلة التنمية و....




فقرة (7) السعي للانتقال من اقت....




فقرة (8) تسديد مستحقات المقاو....



فقرة (9) مراقبة الدين الداخلي وال....



فقرة (10) الانسجام مع سياسة....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (10) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (1 و2 و3 و4 و6 و7 و9 و10)، ولأسباب مختلفة مثل مشروع (النظام الضريبي الالكتروني الشامل) ضمن الفقرة (4) كون المشروع في مرحلة استحصال موافقات الجهات ذات العلاقة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار كون المشروع استثماري، وكذلك مشروع (توزيع اراضي سكنية للمواطنين) - ضمن الفقرة (10) بسبب مشكلة التجاوزات والمساكن العشوائية.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (21) مشروع ضمن فقراتها الـ (10)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة. وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم اطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

هنالك مشاريع اخرى للوزارة، معدل انجازها (100%) لهذا الفصل مثل مشروع (مستحقات المقاولين /الحصر الاول) - ضمن الفقرة (8) حيث تم تسديد مستحقات المقاولين لثمانية محافظات (الديوانية،

الانبار ، بغداد، ميسان، كربلاء، بابل، ذي قار، صلاح الدين)، وشبكة الاعلام العراقي و وزارة الكهرباء في شهر نيسان من عام 2019.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروع (اعداد السياسات والخطط الاستراتيجية للمصرف لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات حسب متطلبات البنك المركزي العراقي بموجب العقد المبرم مع شركة

القواسمي وشركاه (KPMG) - الفقرة (6) ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي،

وزارة التخطيط

المحور الخامس (الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية)


المحور الثاني (سيادة النظام والقانون وتعزيز الامن الداخلي والخارجي)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود




أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (22) مشروع، (15) منها حققت مستهدفها و(7) فيها حيود، ولم تبين الوزارة اسباب الحيود حتى بعد الاتصال بها.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (٣) حسم موضوع آلاف المشاريع الا....




فقرة (٢) التكامل مع وزارة المالية في تحقيق....




فقرة (١) إعادة النظر بدراسة الجدوى


الاقتصاد....



فقرة (٥) وضع معايير، و/أو تفعيل قوانين....



فقرة (٤) إعادة النظر بشروط احوالة المقاولات....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس والثاني من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في (7) مشاريع من مشاريع الفقرة (2) كمشروع (اعداد استراتيجية للتنمية الحضرية للمحافظات) ومشروع (تعزيز التنمية الريفية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء)، ولم تبين الوزارة اسباب هذا الحيود.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشروع (ادارة الاستثمارات العامة والمشتريات العامة على المستوى الاتحادي / قرض البنك الدولي) - ضمن الفقرة (2)، ليس لديه مستهدفات لعام 2019، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم وجود تخصيص مالي له حيث ان المشروع ليس ضمن موازنة 2019.

وكذلك مشروع الفقرة (3) (فحص وتقييم المشاريع التي تزيد كلفتها عن 12 مليار)، ليس لديه مستهدفات لعام 2019.

حققت الوزارة خلال هذا الفصل مستهدفاتها لمشاريع وانشطة الفقرات (1 و4 و5) ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي.

وزارة التجارة

المحور الرابع


(تقوية الاقتصاد)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود




أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (20) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و (17) حققت مستهدفها و (1) فيه حيود، حيث ان سبب الحيود الرئيسي هو عدم اطلاق التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) دراسة وضع البطاقة التموينية....



فقرة (٢) تسهيل اجراءات منح إجازات....



فقرة (٣) فتح نافذة الكترونية تخاطب....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (3) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (2)- مشروع (اعتماد الارشفة الالكترونية)، وسببه عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية للوزارة مع العرض ان الوزارة قد استعانة باجهزة ارشفة من دائرتها الادارية والمالية لانجاز المستهدف وتقليل الانحراف على الرغم من كون هذه الاجهزة غير كافية وعملية الارشفة تتطلب اجهزة ارشفة حديثة وسريعة مع كادر مؤهل.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان عدد من مشاريع الفقرة (1) والخاصة بوضع البطاقة التموينية (انشاء مجمعات خزن، انشاء واعادة تأهيل سايكولات، زيادة الطاقات الخزن للمطاحن)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم اطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

هنالك مشاريع اخرى للوزارة، معدل انجازها (100%) وهي ايضاً تعاني من عدم اطلاق التخصيصات المالية، لكن الوزارة اوجدت حلول بديلة لتنفيذها مثل مشروع (تنفيذ عمل نقطة تجارة دولية في دائرة تطوير القطاع الخاص) ضمن الفقرة (3)، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ودائرة تطوير القطاع الخاص لاعداد تصميم الموقع الالكتروني وقد تم توقيع العقد مع الشركة المصممة للموقع والمباشرة بالعمل.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. دراسة عن وضع البطاقة التموينية (مفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها)- ضمن الفقرة (1).

2. المنظومة الكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط بكل الاقسام (الرقابة، التدقيق المالي، الحاسبة)- ضمن الفقرة (3).

وزارة التربية

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود




أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (10) مشاريع، (6) منها فيها حيود و(4) حققت مستهدفها، حيث ان سبب هذا الحيود العالي يأتي لعدم تغطية مشاريعها مالياً واسباب اخرى لم تبينها الوزارة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) الاستمرار بتطوير المناهج بما يسهم في....



فقرة (٢) القيام بدورات التطوير ضمن مفهوم..



فقرة (٣) تستمر الوزارة بإنجاز المدارس....




تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (3) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (2) - مشروع (تأهيل وتدريب) حيث يعتمد المشروع على البنك الدولي لتدريب وتأهيل (6000) معلم ومشرف تربوي و(90) قائد مرجعي، والمشروع الان في طور التنفيذ، وكذلك الحيود في الفقرتين (1 و3) يأتي نتيجة عدم التغطية المالية لمشروع (تأهيل وترميم 2000 بنائية مدرسية بمختلف المراحل)، وانتظار مصادقة رئيس الوزراء لاستئناف العمل لمشروع (مشروع الوزارة رقم (1) المشروع بأكمال 1626 بنائية). وتهينة المتطلبات لمشروع (قرض البنك الدولي)

وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا

المحور الخامس

(الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية)

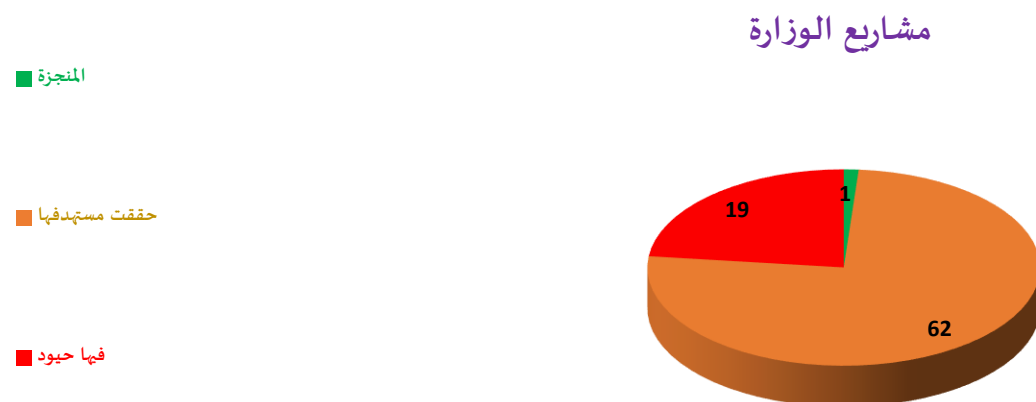


أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (82) مشروع، (1) منها انجز بشكل كامل و (62) حققت مستهدفها و (19) فيها حيود، حيث ان السبب الرئيسي للحيود هذا جاء لعدم اطلاق التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) دخول الجامعات في التصنيفات....




فقرة (٢) اعتماد توأمة حقيقية للجامعات....




فقرة (٣) خطط لخفض الترهل واشاعة....



فقرة (٤) التشجيع على تأسيس الجامعات



فقرة (٥) تشجيع الاستثمار في الكليات....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحاور الخماس من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (1)- مشروع (استكمال البنى التحتية والمباني)، وسببه عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية للوزارة.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان عدد من مشاريع الفقرة (2) - (تفعيل الاتفاقية مع منظمة DAAD) و (اتفاقية الاطار الاستراتيجي الأمريكي) و (مشروع اتفاقية بين العراق والبرازيل) و (توأمة الدراسات العليا) وكذلك الفقرة (4) مشروع (نظام الابتعاث في الجامعات والكليات الاهلية)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة.

أنجزت الوزارة مشروع (تعظيم الموارد المالية في التعليم العالي) بشكل نهائي ضمن الفقرة رقم (5) المحددة بالسرعة ضمن المنهاج الوزاري.

نجحت الوزارة في تمويل (22) مشروعاً فرعياً بكلفة (17) مليار من صناديق التعليم العالي باعتبار الصندوق مصدراً بديل عن التمويل المركزي.

وزارة العدل

المحور الثاني


(سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود



أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (10) مشاريع، (9) منها حققت مستهدفها و(1) فيه حيود، حيث ان سبب الحيود هذا لعدم اطلاق التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (١) ربط جميع دوائر التسجيل العقاري



فقرة (٢) اصلاح نظام السجون العراقية

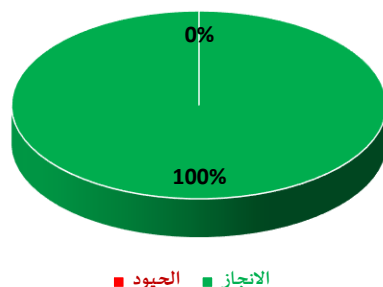

تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثاني من البرنامج الحكومي وضمن (2) فقرة وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (1)- مشروع (انشاء مجمعات عدلية ذات مواصفات عالية يمكن من خلالها

تطبيق مكننة دوائر التسجيل العقاري)، وسببه عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية للوزارة بالرغم من كونه مشروع باللون الاخضر (مستمر وله تخصيصات مالية).

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل مستهدفاتها للفقرة (2)، وبشكل كامل وبمعدل انجاز (100%) من مشاريع وانشطة، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي.

ومن الجدير بالذكر ان لدى الوزارة (10) مشاريع ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، مشروع واحد ضمن الفقرة (1) و(9) مشاريع ضمن الفقرة (2)، وهذا يوضح نسبة معدل الانجاز العالية للوزارة.

وزارة الصحة والبيئة

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود




أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (56) مشروع، (11) منها انجزت بشكل كامل و (45) حققت مستهدفها، وبدون حيود

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) المباشرة فوراً بتقييم الوضع الصحي....




فقرة (٢) تعزيز النظام الصحي العراق عن....




فقرة (٣) الاسراع بتقييم الوضع الصحي....




فقرة (٤) تعزيز قدرات وزارة الصحة والقطاع....




فقرة (٥) اعتماد انظمة واساليب وضوابط....




فقرة (٦) المباشرة فوراً لاكمال بناء وتجه....




فقرة (٧) العمل مع كل القطاعات الحكومية



فقرة (٨) العمل بتنسيق متكامل مع وزارة



فقرة (٩) استخدام وحدات المعالجة الب....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (9) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، وليس لديها اي حيود يذكر، ولكن هذا الانجاز قد ظهر نتيجة معدل الانجاز في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8)، أما الفقرة (9) فالوزارة ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان للفقرة (9) مشروع واحد وهو (تقييم نوعية التصاريح السائلة للأنشطة الملوثة للمصادر المائية وأعداد قاعدة بيانات بذلك)، وليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان هذا المشروع تابع الى وزارة البيئة المدمجة وسبب عدم وضع مستهدفات يعود الى العمل بالانشطة المستهدفة لهذا المشروع سيتم في الفصول القادمة (الثالث والرابع) لتحقيق مستهدفها لعام 2019.

وكذلك مشروع (تطوير القيادات الطبية في المؤسسات الصحية التخصصية) - ضمن الفقرة (4)، والمشروع عبارة عن تنفيذ (4) دورات خلال عام 2019 حيث سيتم البدء بهذه الدورات اعتباراً من شهر حزيران. اما مشاريع انشاء المستشفيات (200 و100) سرير - ضمن الفقرة (6) وهي :

1. انشاء مستشفى سعة (200) سرير في محافظة الانبار / قضاء هيت.

2. انشاء مستشفى سعة (200) سرير في محافظة الانبار / قضاء حديثة.

3. انشاء مستشفى سعة (200) سرير في محافظة الانبار / قضاء القائم.

4. انشاء مستشفى سعة (100) سرير في محافظات صلاح الدين / قضاء سامراء.

5. انشاء مستشفى سعة (100) سرير في محافظات صلاح الدين / قضاء الدور.

فسبب عدم وضع مستهدفات هو عدم تمويل التخصيصات المالية للمشروع من قبل وزارتي التخطيط والمالية على الرغم من كون هذه المشاريع باللون الأخضر (مشاريع مستمرة ولها تخصيص مالي)، والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل الفقرة (1) بمشاريعها الـ (7) علماً ان الفقرة ضمن الأمد السريع، وكذلك مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. تجهيز عيادات طبية متنقلة وسيارات اسعاف في محافظتي (ديالى، صلاح الدين)/قرض البنك الدولي (اعادة اعمار المناطق المحررة) - ضمن الفقرة (3).

2. برنامج تجسير الملاكات الصحية والتمريضية - ضمن الفقرة (4).

أصدار ضوابط واليات جديدة بتوفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والخدمية - ضمن الفقرة (5)

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

المحور الرابع


(تقوية الاقتصاد)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود




أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (21) مشروع، (17) منها حققت مستهدفها و(4) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي :


1. عدم ادراج المشاريع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط.
2. عدم وجود ربط شبكي بين نظام الحماية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة والاعتماد على الأقراص المدمجة الصلبة وهي غير رصينة وعدم تعاون جهات مثل دائرة المرور العامة في مشاركة البيانات.
3. عدم توقيع اتفاقية من الجانب العراقي/وزارة المالية مع الجانب البنك الدولي/الجهة المقرضة.
4. عدم التوقيع النهائي على المحضر بين وزارة الصحة والعمل المتضمنة نقل مراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة الى وزارة العمل.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (٤) شمول جميع المواطنين....




فقرة (٣) مراكز التدريب المهني....



فقرة (٢) مشروع تشغيل الشباب....



فقرة (١) قاعدة بيانات عن العراقيين...



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (4) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (3) - مشاريع البنك الدولي :

1. تطوير خارطة الطريق استراتيجية الحماية الاجتماعية/سببه عدم توقيع اتفاقية من الجانب العراقي/وزارة المالية مع الجانب البنك الدولي/الجهة المقرضة.

2. النقد مقابل العمل والدعم الاجتماعي وفرص كسب الرزق/سببه عدم ادراج المشاريع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط.

3. شبكات امان اجتماعي صامدة/سببه عدم ادراج المشاريع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط.

4. ادارة المشروع الطارئ/سببه عدم ادراج المشاريع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشاريع الفقرة (4) وعدد من مشاريع الفقرة (3) الخاصة ببناء قدرات المدربين وتطوير الملاكات ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو انتظار صدور ضوابط وتعليمات بشأن توزيع قطع الاراضي على المستفيدين وكذلك بانتظار استحصل الموافقات الاصولية على توقيع اتفاقية مع الشركة الكندية والوكالة الالمانية عدم اطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل مستهدفاتها وبمعدل انجاز (100%) مشروع (تحديث بيانات العاطلين الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني) - ضمن الفقرة (3). وكذلك مشاريع اخرى ضمن الفقرات (1 و3).

وزارة الصناعة والمعادن

المحور الرابع (تقوية الاقتصاد)


المحور الثاني (سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود




أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (57) مشروع، (7) منها انجزت بشكل كامل و (48) حققت مستهدفها و (2) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود كانت لقلة التخصيصات المالية للوزارة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) تحويل الاصول الجامدة الى اصول....




فقرة (٢) تقديم دراسة لعدد المصانع الصغ....




فقرة (٣) توحيد شروط وامتيازات مدير....




فقرة (٤) منح الاراضي للأغراض الصناعية مج....



فقرة (٥) فتح الباب للاستثمار الخارجي في مج....



فقرة (٦) التكامل مع وزارة الصناعة العراقي....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع والثاني من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (4)- مشروع (تخصيص الاراضي الصناعية للقطاع الخاص بموجب دراسات الجدوى الاقتصادية المقرة)، وسببه قلة التخصيصات المالية، ومع ذلك فقد قامت الوزارة بمخاطبة المحافظات لتسهيل منح قطع الاراضي للمشاريع الصناعية علماً ان عدد من طالبي الاجازات لديهم قطع اراضي خاصة بهم ولا يحتاجون الى تخصيص.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان عدد من مشاريع الفقرات (1 و2) والبالغة (5) مشاريع، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة. هنالك (9) مشاريع للوزارة مصنفة باللون الازرق (ليس لها تخصيص مالي) ضمن الفقرات (1 و2)، الا ان الوزارة قد حققت فيها مستهدفاتها لهذا الفصل وينسب انجاز عالية.

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. تاهيل مصانع الشركة العامة للزيوت النباتية / المرحلة الثانية (مشاركة)- ضمن الفقرة (1).
2. تاهيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (المرحلة الاولى) - ضمن الفقرة (2).
3. وحدات المعالجة الكيماوية والبايولوجية لمصنع الامين - ضمن الفقرة (2).
4. اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة / قطاع خاص- ضمن الفقرة (2).
5. مشروع تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 للقطاعين الخاص والمختلط- ضمن الفقرة (3).
6. تصنيع الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمقاتلة- ضمن الفقرة (5).
7. انتاج العربات المدرعة- ضمن الفقرة (5).

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، الفقرات (3 و5) ضمن التزامها في البرنامج الحكومي.

وزارة الزراعة

المحور الرابع (تقوية الاقتصاد)


المحور الثالث (الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (23) مشروع، (17) منها حققت مستهدفها و(6) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة، وكما يلي :

1. عدم اطلاق التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

2. عدم موافقة وزارة التخطيط على ادراج فقرات خاصة بالمشاريع.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الرابع والثالث من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود العالي يظهر بشكل واضح في الفقرة (4) - مشروع (مشروع اقراض المزارعين لشراء منظومة ري حديثة لاعادة تأهيل بساتين النخيل والفاكهة والزيتون)، وسببه عدم توفر تخصيص مالي، وكذلك الفقرة (5) - مشروع (تطوير وتأهيل الطيران الزراعي في العراق)، وسببه عدم موافقة وزارة التخطيط على الفقرات المدرجة لعام 2019.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشاريع الفقرة (1)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم إقرار القانون من قبل مجلس النواب لحد الان وعدم الحصول على تخصيص مالي، علماً ان لدى الوزارة (10) مشاريع بدون مستهدفات لهذا الفصل.

وزارة النقل

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها


فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (47) مشروع، وجميعها قد حققت مستهدفها، ولا يوجد حيود لكنها تعاني من عدم اطلاق التخصيصات المالية لمشاريعها.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

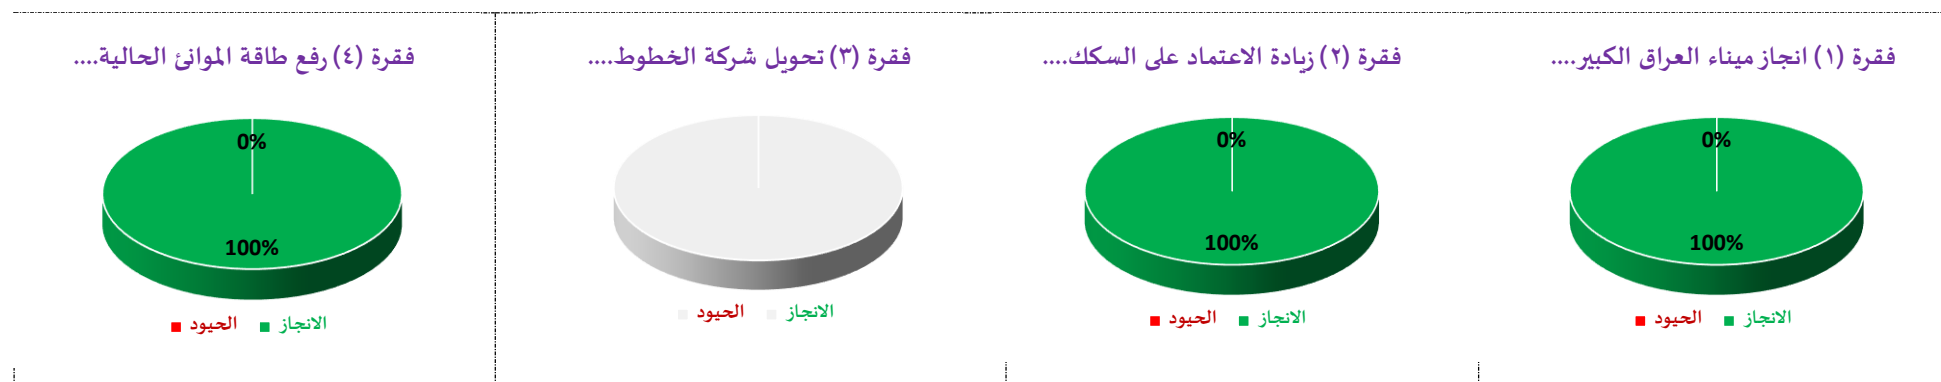

تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (4) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، وليس لديها اي حيود يذكر، ولكن هذا الانجاز قد ظهر نتيجة معدل الانجاز في الفقرات (1 و 2 و 4). أما

الفقرة (3) فالوزارة ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة وهذا ينطبق على (20) مشروع من مشاريع الوزارة .

بالرغم من عدم اطلاق التخصيصات المالية لمشاريعها، فقد حققت الوزارة نسب عالية جداً بمعدلات الانجاز لمشاريع مهمة كمشروع (كاسر الامواج الغربي) لميناء العراق الكبير - الفقرة (1) ونسبة

(100%)، ومشروع (اكمال مشروع خط سكة ساوة -حجامة مع 3 جسور ومقترباتها) و(مشروع (يوسفية -حلة -سماوة) للخطين الجديد الملاصق والقديم) - الفقرة (2) ونسبة (100%) حيث وضعت الوزارة

رؤية لمشاريع السكك الحالية والمستقبلية لتحديث النقل السككي وانشاء شبكة سكك متطورة.

وزارة الاتصالات

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود




أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (7) مشاريع، (1) منها انجز بشكل كامل و (6) حققت مستهدفها، حيث ان اسباب الحيود

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (٣) اكمال متطلبات مشروع الكيبيل....




فقرة (٢) طرح الجيل الرابع من الهاتف




فقرة (١) تشريع قانون للرقابة الإلكترونية....




فقرة (٦) تقديم الاستشارة الخدمية لكافة



فقرة (٥) اعادة خدمة الهاتف الأرضي....



فقرة (٤) مضاعفة سعة وسرعة شبكة الانترنت....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، وليس لديها اي حيود يذكر. ولكن هذا الانجاز قد ظهر نتيجة معدل الانجاز في الفقرات (4 و 5 و 6)، أما الفقرات (1 و 2 و 3) فالوزارة ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة علماً أن الوزارة بحاجة لتشريع عدد من القوانين والتي هي الان في مجلس النواب. لتنفيذ الفقرة (1)، وهي : 1. قانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2. قانون هيئة الاعلام والاتصالات 3. قانون الاتصالات والمعلوماتية 4. قانون الجرائم المعلوماتية

انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشروع (ربط الدوائر في بغداد والمحافظات لاسلكياً (LTE)) - ضمن الفقرة (6)، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي.

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود




أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (215) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و (144) حققت مستهدفها و(69) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة وكما يلي :


1. عدم وجود التخصيص المالي او عدم ورود التمويل.
2. تلكؤ بعض الشركات المنفذة في التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
3. الوضع الأمني في بعض مناطق تنفيذ المشاريع
4. قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 ولم يتم البت به لحد الآن.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (١) إنجاز تحلية مياه البحر في البصرة....




فقرة (٢) إنجاز طرق حلقية لمدينة العراق....




فقرة (٣) البدء ببناء وحدات سكنية....




فقرة (٤) اكتمال طريق المرور السريع وتأهيله....



فقرة (٥) اكتمال مشاريع المجاري والماء في المح....



فقرة (٦) خطة لإنشاء الطرق واكسائها....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحاور الخماس من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (3)- والتي تحتوي على (51) مشروع، يعاني من عدم وجود تخصيص مالي او عدم ورود التمويل.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (100) مشروع ضمن الفقرات الـ (6)، ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم اطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع أو كونها متوقفة حسب القرار 347 لسنة 2015، والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

انجزت الوزارة ضمن مستهدفاتها لهذا الفصل للفقرة (4)، مشروعين، الأول: مشروع (إنشاء المرور السريع رقم 1) جزء ط6 الممر الايمن ومدخل السماوة الفرعي) بمعدل انجاز 100% والثاني: (ربط المرور السريع رقم 1) بمدينة (حلة/كيش) بطول 13 كم محافظة بابل) بمعدل انجاز 150% وبالتالي انعكس على انجاز الفقرة لتتجاوز سقف الـ (100%)

من الجدير بالذكر ان نسب المشاريع المتوقفة تمثل النسب التي توقفت فيها تلك المشاريع و لم يتم حساب الاندثار فيها وبالتالي ستقلل من النسب الحالية.

وزارة الشباب والرياضة

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها


فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (88) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و (71) حققت مستهدفها و (15) فيها حيود

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

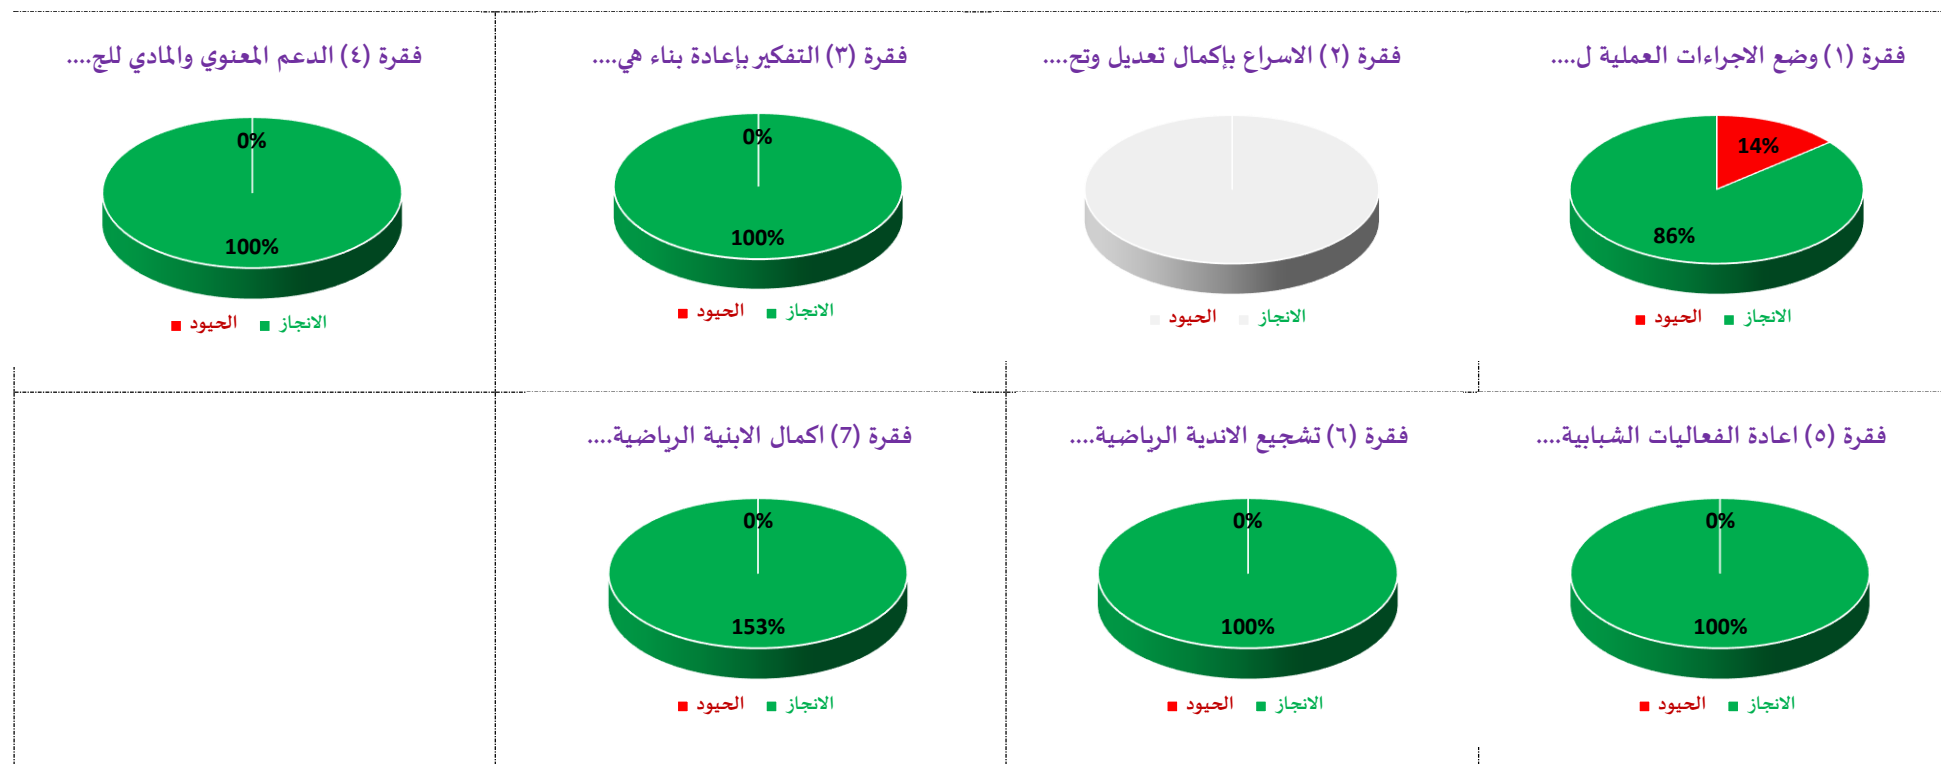

تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (9) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، وليس لديها اي حيود، ولكن هذا الانجاز قد ظهر نتيجة معدل الانجاز في الفقرات (3 و 4 و 5 و 6 و 7) أما الفقرة (2) فالوزارة ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفها لعام 2019 سوف يتحقق في الفصول القادمة حيث ان لدى الوزارة (29) مشروع ونشاط موزعة بين الفقرات، بدون مستهدفات لهذا الفصل، لكن هنالك حيود واضح في الفقرة (1) بسبب عدم وجود تخصيص مالي لعدد من المشاريع هي :

1. تنفيذ برامج وانشطة الخطة الخمسية لقطاعي الشباب والرياضة 2018-2023.
2. رصد مجموعة من الظواهر السلبية في شريحة الشباب ووضع الحلول الناجعة.
3. تنشيط منتديات الشباب والرياضة في المحافظات من خلال رسم خطط وبرامج لتلك المنتديات بالتعاون بين الوزارة والمحافظات وفق البرنامج الحكومي وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الانشطة.
4. صناعة القيادات الشبابية (تنفيذ برامج وانشطة وورش لصناعة القيادات الشبابية).
5. توفير المساحات الخضراء لممارسة الرياضة للجميع بالتعاون مع المحافظات.

وزارة الموارد المائية

المحور الثالث


(الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية)

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (75) مشروع، (17) منها حققت مستهدفها و(58) فيها حيود، حيث ان الاسباب متعددة لهذا الحيود، وكما يلي :

1. تأخر المصادقة على خطة الوزارة من قبل وزارة التخطيط.


2. عدم تمويل مشاريع الوزارة.

3. عدم موافقة وزارة التخطيط على اعادة ادراج بعض المشاريع.


4. الوضع الامني في مواقع العمل لبعض المشاريع.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) اعادة النظر بالسياسة المائية....




فقرة (٢) لبدء بمشروع تبطين القنوات الما....




فقرة (٣) وضع خطة بالأرقام لشمول الارا....




فقرة (٤) السعي لزيادة الخزين المائي....



فقرة (٥) كرى الانهر من قبل القطاع العام....



فقرة (٦) العمل الجاد والسريع بالتعاون مع....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الثالث من البرنامج الحكومي وضمن (6) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرات (2 و 1 و 6 و 3 و 5) على التوالي حيث كانت نسبة معدلات الحيود متفاوتة واغلبها عالي جداً لـ (60) مشروع وهذا العدد كبير بالنسبة لعدد مشاريع الوزارة البالغة (75) مشروع. علماً أن لدى الوزارة (7) مشاريع ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشروعي (زيادة حصة العراق السنوية من نهر الفرات) و(الاتفاق على الاطلاقات المائية لنهر دجلة عند الحدود العراقية - التركية) - ضمن الفقرة (1)، معدل انجازها عالي جداً ويثير الاستغراب حيث بلغ (118%) و(317%)، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان النسبة كانت نتيجة السيول الكبيرة التي تعرض لها العراق هذا العام والتي ادت الى زيادة الايرادات المائية.

وزارة الثقافة والسياحة والآثار

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها


فيها حيود



أسباب عامة للحيود

تعمل الوزارة على (41) مشروع، (2) منها انجزت بشكل كامل و (27) حققت مستهدفها و(12) فيها حيود، حيث ان سبب الحيود هذا لعدم توفير التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

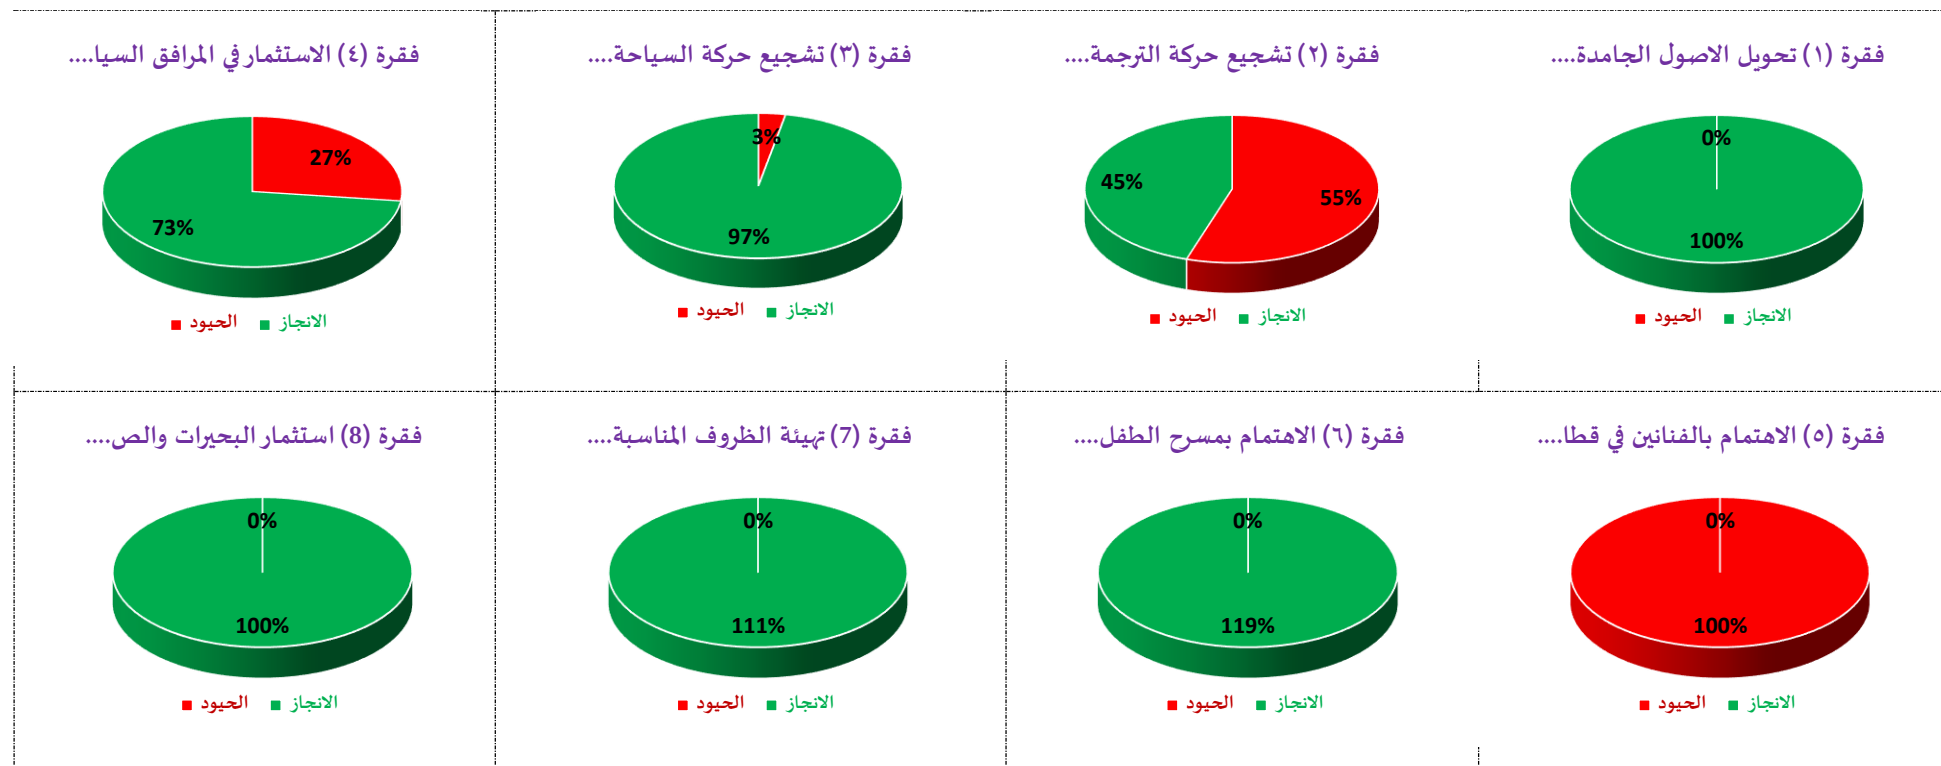

تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (8) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (5) - مشروع (تأهيل بنائية ورشة العود لصناعة الآلات الموسيقية)، وكذلك الفقرة (2) - مشروع (اقامة وتبادل للاسابيع ثقافية داخل وخارج العراق).

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان لدى الوزارة (11) مشروع متوزعة على فقرات الوزارة، وليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان سبب عدم وضع مستهدفات هو عدم اطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة.

وزارة الهجرة والمهجرين

المحور الخامس


(الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود



أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (21) مشروع، (5) منها انجزت بشكل كامل و (9) حققت مستهدفها و (7) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة فمنها اسباب تتعلق بالتخصيصات المالية واخرى تتعلق بالمناقلة المبالغ المالية:

1. التخصيصات المالية: عدم توفير تخصيصات مالية ضمن موازنة 2019، أو عدم اطلاق التخصيصات المالية لمشاريع الوزارة.


2. مناقلة المبالغ المالية: نقل تخصيصات مالية من موازنة الوزارة الى المحافظات تحت عنوان اعادة الاستقرار.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) دراسة إنجاز وتطبيق قاعدة بيانات....




فقرة (٢) العمل مع المنظمات الدولية والمح....




فقرة (٣) متابعة شؤون العراقيين المهاج....



فقرة (٤) اعتماد المهاجرين العراقيين المتميزين....



فقرة (٥) مساعدة هيئة الاستثمار الوطنية....



تحليل واستنتاج

تعمل الوزارة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن (5) فقرات وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (2)- كمشروع (توفير وحدات سكنية لفئات العناية (للعوائل الهشة) ومشروع (توزيع منح مالية لغرض ترميم الدور المتضررة في المناطق المحررة لتشجيع العودة الطوعية)، وسببه مناقلة المبالغ المالية حيث تم نقل التخصيصات المالية للمشروع من موازنة الوزارة الى المحافظات تحت عنوان اعادة الاستقرار، وكذلك مشروع (فتح مكاتب للوزارة في الدول التي تضم كثافة كبيرة للاجئين العراقيين في الخارج الدول (يونان - السويد - استراليا - امريكا - بريطانيا - بلجيكا - النمسا) ضمن الفقرة (3)، وسببه عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان عدد من مشاريع الفقرة (1) :

1. نشر الاستثمارات من خلال المواقع الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي وضمن تطبيقات الاجهزة الذكية.
2. توثيق وزارة الهجرة والمهجرين مع وزارات الدول ذات التجارب المماثلة لاحتضان اللاجئين (كندا واستراليا امريكا السويد والنرويج).

وكذلك الفقرة (2) :

1. تشييد مجمع البصرة السكني.
 2. مشروع حراسات مجمع البصرة.
- ليس لديها مستهدفات لهذا الفصل، ومستهدفاتها لعام 2019 سوف تتحقق في الفصول القادمة، وبعد التدقيق في هذه البيانات والاتصال بالوزارة تم الاستنتاج بان المشاريع المذكورة للفقرة (2) لم يتم وضع مستهدفات بسبب هو عدم توفير أو اطلاق التخصيصات المالية لهذه المشاريع والذي أدى الى تأجيل المستهدفات والعمل الى الفصول القادمة بالرغم من كونها مشاريع باللون الاخضر والتي تعني بأنها مشاريع مستمرة ولديها تخصيصات مالية.

بالرغم من نسبة معدل الحيود المذكورة في اعلاه، فقد انجزت الوزارة خلال هذا الفصل، وبشكل كامل، مشاريع وانشطة ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، وكما يلي :

1. اعداد استمارة لتسجيل العراقيين (ورقية وتطويرها الى الكترونية) - ضمن الفقرة (1).
2. إنشاء مجالس جاليات من المهاجرين العراقيين للتواصل- ضمن الفقرة (3).
3. تفعيل الجانب الالكتروني للتواصل مع العراقيين في دول الخارج- ضمن الفقرة (3).
4. تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاختيار السفراء بالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة وعقد مؤتمر في بغداد بحضور السفراء المرشحين- انجاز الفقرة (4) بالكامل.
5. إقرار السياسة الوطنية للاستفادة من العراقيين في دول المهجر- انجاز الفقرة (5) بالكامل.

أمانة بغداد


(وردت ضمن المحور الخامس وزارة الاعمار والإسكان والبلديات)

مشاريع الوزارة

المنجزة

حققت مستهدفها

فيها حيود




أسباب عامة للحيود


تعمل الأمانة على (4) مشاريع، (3) منها فيها حيود و(1) حقق مستهدفه ، حيث ان اسباب الحيود بسبب توقف المشاريع واجراءات متعلقة بالاعتمادات المستندية.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي

فقرة (١) اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات الع....

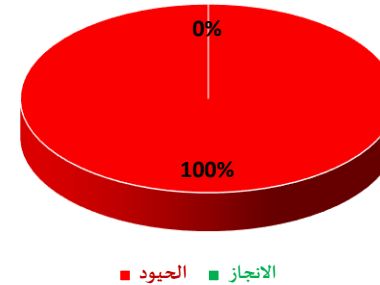

فقرة (٢) انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسائها....

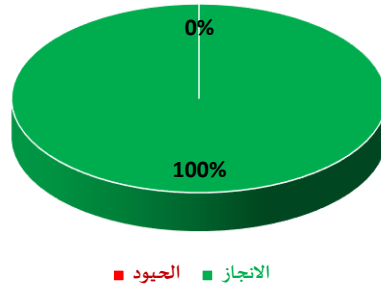

تحليل واستنتاج

تعمل الامانة على المحور الخامس من البرنامج الحكومي وضمن فقرتين وردت ضمن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (1)- مشروع

(تنفيذ الخط الرئيسي الناقل في جانب الكرخ / الخط الغربي الاضافي مع تنفيذ محطة ضخ دورة رقم 2 مع خطوط الدفع التابعة لها)، وسببه تأخر صدور الاعتماد الخاص باستيراد المواد الميكانيكية والكهربائية.

من خلال اجراء عملية التحليل لبيانات الوزارة، نجد ان مشاريع الفقرة (1) سيتم انجازها خلال عام 2019 نظراً لمستهدفاتها بالرغم من نسبة حيودها العالية، ما عدا مشروع واحد وهو متوقف (صيانة وادامة

وتشغيل مشاريع مياه المجاري). اما الفقرة (2) فلها مشروع واحد (تخطيط واكساء المحلات والشوارع الرئيسية في مدينة بغداد / الأفرارز الجديد) وهو ايضاً سينجز خلال عام 2019 حيث نسبة حيوده ضئيلة جداً لهذا

الفصل.

البنك المركزي العراقي


((وردت ضمن المحور الرابع / وزارة المالية))

مشاريع الوزارة

■ المنجزة

■ حققت مستهدفها

■ فيها حيود



أسباب عامة للحيود


تعمل الوزارة على (8) مشاريع، (1) منها انجز بشكل كامل و (3) حققت مستهدفها و (4) فيها حيود، حيث ان اسباب الحيود متعددة فمنها اسباب تتعلق بالاجراءات الادارية واخرى تتعلق بالسلطة التشريعية :

1. اجراءات ادارية كمشروع (زيادة السقف الأتتماني للاعتمادات الحكومية من المصارف الخاصة الى 50 مليون دولار) ضمن الفقرة (1) حيث تم ارسال كتاب الى لجنة الشؤون الاقتصادية بخصوص فتح الاعتمادات ولا يزال الموضوع متوقف لديها.


2. السلطة التشريعية كمشروع (قانون صكوك الاستثمار الاسلامية) ضمن الفقرة (1) حيث تم إحالة الى السلطة التشريعية لغرض المصادقة عليه.

1. معدل الإنجاز والحيود لفقرات البرنامج الحكومي


فقرة (١) تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز

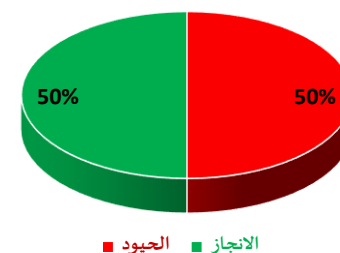

فقرة (٢) المصارف عتلة التنمية والواسطة....

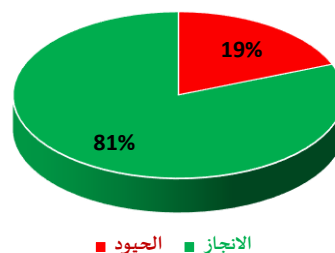

فقرة (٣) السعي للانتقال من اقتصاد الع....



تحليل واستنتاج

يعمل البنك على المحور الرابع من البرنامج الحكومي وضمن (3) فقرات وردت ضمن وزارة المالية وكما هو مبين في اعلاه، والحيود يظهر بشكل واضح في الفقرة (1) - كمشروع (زيادة السقف الائتماني للاعتمادات الحكومية من المصارف الخاصة الى 50 مليون دولار)، وسببه اجراءات ادارية حيث تم ارسال كتاب الى لجنة الشؤون الاقتصادية بخصوص فتح الاعتمادات ولا يزال الموضوع متوقف لديها، وكذلك مشروع (قانون صكوك الاستثمار الاسلامية)، وسببه السلطة التشريعية حيث تم إحالته اليها لغرض المصادقة عليه.

بالرغم من النسبة العالية لمعدل الحيود، لكن هنالك لدى البنك مشاريع وأنشطة حقق مستهدفاتها لهذا الفصل، قبل انتهاء الفترة المخصصة لها أو ضمن الفترة كمشروع (مراجعة وتطوير اجراءات الاقراض المعمول بها في المصارف والمؤسسات المشاركة في توفير خدمات التمويل الاصغر) ضمن الفقرة (2)، والذي انجز بشكل كامل خلال الفصل الحالي من عام 2019، علماً بأنه قد تم التخطيط لانجازه في عام 2020، وبالتالي قلل من ارتفاع نسبة معدل الحيود للفقرة.

ملحق تفصيلي

عن بيانات تنفيذ مشاريع الوزارات

تعريفات لانموذج مشاريع الوزارة

يحتوي انموذج مشاريع الوزارة على (17) خلية تفصيلية لكل مشروع تحتوي على بيانات تتعلق بتنفيذ المشروع حيث تعطي رؤية واضحة عن عملية سير المشروع وتاريخه، وكما يأتي:

1. فقرة البرنامج الحكومي: تمثل الفقرة التي يعمل تحت مظلتها المشروع.
2. الفترة الزمنية للتنفيذ: تمثل الفترة التي قد تم تحديدها في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.
3. المشروع: يذكر في هذا الحقل اسم المشروع والمحدد من الوزارة والمعتمد لدى وزارة التخطيط.
4. الفترة المحددة للتنفيذ: تمثل الفترة الزمنية لإنجاز المشروع.
5. تاريخ بداية التنفيذ: تمثل تاريخ أو نقطة الشروع الأولى بالمشروع.
6. تاريخ الانجاز: تمثل التاريخ المحدد والمفترض لإنجاز المشروع بشكل كامل.
7. المستهدف الكلي للمشروع: يمثل المنجز النهائي عند الانتهاء من المشروع أو إنجازه.
8. الواقع الحالي: يمثل مقدار الإنجاز الحالي للمشاريع المستمرة.
9. المستهدف: يمثل ما تطمح الوزارة من تنفيذه خلال هذا الفصل.
10. المتحقق: يمثل ما تم إنجازه من المشروع خلال هذا الفصل.
11. الإنجاز: مؤشر يعطي صورة واضحة عن عملية التنفيذ، فنسبة الإنجاز تمثل نسبة ما تم انجازه فعلياً من المشروع خلال هذا الفصل.
12. الانحراف: مؤشر يعطي صورة واضحة عن الانحراف في عملية التنفيذ ونسبة غير المنجز من المشروع لهذا الفصل أو بمعنى آخر نسبة التلكؤ في المشروع عن تحقيق مستهدفه لهذا الفصل. وهكذا للأعمدة الأخرى الخاصة بالفصول اللاحقة لعام 2019.
13. الملاحظات: تمثل كل ملاحظات الوزارة عن المشروع من ناحية الإنجاز أو الانحراف وأسبابه أو المعوقات والتحديات التي يتعرض لها المشروع.

وزارة الخارجية

المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز -ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
ما تزال الوزارة في طور المفاوضات بشأن إعادة الترشح لمناصب سبق أن حصلت عليها عضوية مجلس حقوق الانسان وتتفاوض بشأن الحصول على ذلك، حيث تم تقديم طلب الى سفارة استراليا يتضمن دعم ترشيح العراق لنيل عضوية مجلس حقوق الانسان. كذلك الطلب ذاته من سفارة نيوزيلندا، هناك دعم متبادل بين العراق و كازخستان للحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان للمدة ٢٠٢٢-٢٠٢٠ مقابل دعم كازخستان للحصول على المنصب ذاته للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٤، تم مفاتحة كافة البعثات العربية والاجنبية في بغداد لطلب دعم ترشيح العراق لعضوية مجلس حقوق الانسان.		1		0		0	صفر	6	2022	2019	4	الحصول على عضوية منظمات دولية	لم تحدد	تعزيز دور العراق كعنصر فاعل في مؤسسة الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والكثير من المنظمات الاقليمية والدولية وان تكون وزارة الخارجية الواجهة الحضارية التي تمثل العراق بأفضل ما يمكن للعالم وتدافع عن مصالحه ومواطنيه. والمساهمة في الحفاظ على امن العراق وتعزيز وحدته وحدوده وتكامل مجتمعه. مع التركيز على توسيع مساحة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والجماعية مع جميع
قيد الانجاز والتفاوض		0		0		0	-	3	2022	2019	4	إبرام اتفاقيات تعزز وحدة وتكامل الأمن المجتمعي		
تمت مفاتحة السفارة النيوزيلندية في بغداد بكتابتنا ٩٨٤٦ في ١٨ / ٤ / ٢٠١٩، عن رغبة العراق بفتح سفارة في نيوزيلندا.		0		0		0	-	-	2022	2019	4	تعزيز كوادر البعثات العراقية في الخارج		
حصلت موافقة السيد الوزير على فتح سفارة جمهورية العراق في اديس ابابا/ اثيوبيا. وعدد من السفارات الاخرى،، وهناك عدد من الدول تعد الوزارة دراسة لاعادة فتح سفارات فيها.		1		1		0	صفر	5	2022	2019	4	إعادة فتح بعثات جديدة والبعثات التي اغلقت في السنوات السابقة بسبب نتيجة لسياسة التقشف		

دول العالم بما يضمن مشاركة المجتمع الدولي في إعادة بناء العراق وتطوير بنيته التحتية		التثقيف والترويج للاقتصاد العراقي عبر المؤتمرات الدولية الاقتصادية والاستثمارية	1	2019	2020	-	صفر	0	0	1		أقدمت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية على تسهيل منح تأشيرات الدخول الاعتيادية للمستثمرين ورجال الأعمال خلال (٧٢) ساعة، وتسعى الوزارة لعقد منتدى اقتصادي لدول اسيان مع العراق.
		بدء مفاوضات مع مجموعة G7 لإعادة إعمار البنى التحتية في العراق	4	2019	2022	-	صفر	0	0	0		تم تسوية الديون المغربية المترتبة على العراق في نيسان/ ٢٠١٩، الموافقة على اطفاء المتبقي من رصيد القرض العراقي المتبقي بذمة الجمهورية التونسية نيسان/ ٢٠١٩، عقدت الجولة الثانية من اجتماعات المديونية العراقية - المصرية في تشرين الثاني / ٢٠١٨.
المساهمة الفعلية في بناء الاقتصاد العراقي وتقدمه ورفاهه الاجتماعي وتشجيع الصادرات السلعية العراقية واستجذاب الاستثمارات والمساعدة الاجنبية اليه وزيادة الاستثمارات العراقية في الخارج والسعي لتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعريف العالم بإمكانيات العراق الراهنه في شتى الحقول الاقتصادية والمعرفية والحضارية والدينية والتراثية واعتبار ذلك جزءاً من عمل السفارات يتم محاسبتها عليه سنوياً	متوسط	تكثيف تبادل الزيارات واللجان المشتركة.	2	2019	2021	5	صفر	0	1	2	3	
تحسين ظروف العراقيين في الحصول على تأشيرات الدخول لجميع انحاء العالم وزيادة عدد الدول التي تسمح للعراقي بالدخول دون تأشيرة لرفع مستوى تقييم الجواز العراقي	متوسط	توقيع مذكرات تفاهم	1	2019	2020	2	صفر	1	1	0		الغاء رسوم تأشيرة الدخول بين العراق وايران ١ / ٤ / ٢٠١٩. كذلك تمت مفاتحة سفارة جمهورية اذربيجان وافغانستان لرفع سمات الدخول للزوار الأذريين والأفغان إلى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

تسهيل منح تأشيرة الدخول للأجانب سواء كانوا سواحاً أو رجال اعمال او مواطنين عاملين ومقيمين في العراق وفق القوانين النافذة، بغرض دعم الاستثمار والسياحة والاعمار في البلاد، مع تقديم رؤية متكاملة لاستثمار طاقات العراقيين من مغتربين ومقيمين في الخارج واعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع العراقي ومساعدتهم في التكامل مع وطنهم وتكامل وطنهم معهم	سرّيع	توفير مناخ استثماري جاذب وتسهيل دخول رؤوس الأموال للمشاركة في عملية التنمية	1	2018 تشرين الأول	2019 تشرين الأول	الجهد الحكومي	صفر	1	0	1	يحضر للترويج للاقتصاد العراقي والاستثمار في العراق، وتم توقيع مذكرة التفاهم الاطارية بين صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة مع الجانب الكويتي، كذلك اتفاقيات ومذكرات لتشجيع الاستثمار مع الجانب السعودي والاردن كذلك في مجال تجهيز النفط والاتصالات والنقل وغيرها من الأمور الخدمية الاخرى، وما تزال الوزارة مستمرة بالترويج للاستثمار في العراق.
إعطاء الاولوية لعلاقتنا الاقليمية والصداقة مع جميع دول الجوار، والامتناع عن سياسات المحاور، فالعراق نقطة لقاء ومصالح مشتركة لجميع دول الجوار والدول الصديقة في العالم، وتعزيز الصداقة مع المجتمع الدولي، والتأكيد على عدم السماح لأي تدخل خارجي بشؤون العراق، وحل الخلافات عبر تفعيل المبادرات المشتركة لضمان حقوق العراق، بالإضافة مراعاة احترام كافة مواثيقنا الثنائية والجماعية إقليمياً ودولياً، وعدم السماح لأي طرف داخلي بالتجاوز عليها، بما يصب بعودة العراق لمصاف الدول المتقدمة واستثمار موقعه الديني واريته التاريخي	لم تحدد	الاستمرار بالمفاوضات وتبادل الزيارات مع دول الجوار من خلال مسؤولين رفيعي المستوى	4	2019	2022	6	صفر	0	1	0	زيارات متبادلة ومفاوضات مستمرة على مستوى فخامة رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية مع دول الجوار
تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول الجوار		4	2019	2022	2	صفر	0	1	0	مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية في ١٨ / ٤ / ٢٠١٩،	
إبرام اتفاقيات وعقد مذكرات تفاهم		4	2019	2022	3	صفر	0	1	0	تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول الجوار في مجالات متعددة على كافة الصعد السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية وما تزال الوزارة مستمرة في المفاوضات، تم وقّع مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة من قبل اتحاد الكرة العراقي والهندي، بغية الصداقة مع المجتمع الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الانبار وهانك يونك الكورية بشأن تبادل الخبرات والطلاب والبحوث العلمية.	
تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل اللجان المشتركة		4	2019	2022	15	صفر	2	5	1	عقد العديد من اللجان المشتركة مع الجانب الروسي ، وتفعيل اللجان المشتركة مع السوري والمجلس التنسيقي مع المملكة العربية السعودية والتنوسية كذلك مع الجانب القطري، كذلك الزيارات المتبادلة من قبل وفود دولية مختلفة للعراق والوزارة مستمرة بتطوير المفاوضات وتكثيفها.	

والحضاري وامكانياته البشرية والطبيعية لتحقيق التقدم والحياة المرفهة اللائقة به وبشعبه	تكثيف الزيارات للمسؤولين رفيعي المستوى والتفاوض بشأن الالتزامات المتبادلة	4	2019	2022	15	صفر	5	5	5	5	اجتماع رقم (٥٠) للجنة العراقية وتم الاتفاق على توجيه رسالة للدول المقترضة لمطالبها بالعمل على تحديد آلية تسديد ما بذمتها من قروض مستحقة إلى العراق، كذلك زيارة الحاكم العام الاسترالي ورئيس وزراء الاسترالي مع وزير الدفاع الاسترالي للعراق ولقائه مع السيد الوكيل الاقدم للوزارة السيد نزار الخيرالله بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨، وزيارات اخرى متعددة.
تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الارهاب ومنع عودته باي عنوان او شكل او اسم. ولهذا الغرض الاء اهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصديدة للإرهاب، والاصرار على منع اي تشكيل عسكري او سلاح خارج إطار الدولة، وتابعة الجميع للقائد العام للقوات المسلحة، والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية	لم تحدد	4	2019	2022	3	صفر	1	0	0	0	توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز مكافحة الارهاب العراقي والمجري بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠١٨، في مجال التعاون الامني العراق وهنغاريا ، عقد اجتماع مع وزارة الخارجية بشأن نقل خبرات في مجال مكافحة الارهاب مع الدول الشقيقة بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٩، كذلك من المزمع عقد مذكرتي تفاهم في المجال الأمني والاستخباري مع جمهورية كوريا والصين ، وتم مفاتحة سفارات الدول المذكورة وارسل مسودة مذكرات تفاهم لغرض الاتفاق عليها بصيغها النهائية. هناك مشروع توقيع مذكرتي تفاهم في المجال الأمني مع اوكرانيا وهولندا مع العراق ، كذلك في تعزيز الأمن تم عقد اجتماع في مقر الوزارة بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩، بغية تنشيط اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق.

وزارة الدفاع

المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز - ف ٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
بانتظار ورود المصادقة على الخطة من قبل وزارة المالية		0,1%		0,1%	0	0,1%	0	100%	2022	2019	4	صندوق بناء وتطوير قدرات الجيش العراقي		
بانتظار ورود المصادقة على الخطة من قبل وزارة المالية		0,4%		0,3%	0	0,3%	حالي ومستمر	100%	2022	2019	4	تأمين متطلبات الهندسة العسكرية		
تاخر تفعيل الاعتماد المستندي الخاص باستيراد الاجهزة الطبية والاثاث المكتبي والمطبخي والمعدات الاستيرادية الميكانيكية والكهربائية -توجيه السيد رئيس الوزراء المحترم على ضرورة إكمال المشروع - وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم (١٠١) لسنة ٢٠١٩ المتضمن التسهيلات الخاصة بفتح الاعتماد المستندي واعفاء الشركة من الغرامات التأخيرية وتخصيص ومناقلة مبلغ (١٥) مليار دينار) من قبل وزارتي المالية والتخطيط الى المشروع لاكماله..		12.8		10	0.534	10	67.2%	100%	2015	2010	4	إنشاء مستشفى عام للقوات المسلحة العراقية		
العقد تم شموله بقرار مجلس الوزراء ٢٠١٥/٣٤٧- التجميد نتيجة الازمة المالية- وتم توفير التخصيص المالي له عام ٢٠١٨ وحصلت موافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة الجلسة/١٩ لسنة ٢٠١٨ على ترويج ملحق عقد رقم (٢) باكمال المفاوضة ومنحه مدة تنفيذ (٤ اشهر) منذ ٢٠١٨/١٠/٢٢ الذي هو تاريخ نهاية التوقف... تاريخ الانجاز للمشروع اصبح (٢٠١٩/٢/١٨)،... لم يتم اقرار خطة مشاريع الاشغال الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط لغاية تاريخه.		16.3		10	10.3	10	63.7%	100%	2016	2015	1	انشاء بناية لجهاز مديرية الطيران الارضية اليورو وبترو/ تسليم مفتاح		

تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الارهاب ومنع عودته باي عنوان او شكل او اسم. ولهذا الغرض ايلاء اهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصدية للإرهاب، والاصرار على منع اي تشكيل عسكري او سلاح خارج إطار الدولة، وتابعة الجميع للقائد العام للقوات المسلحة. والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.	لم تحدد	إكمال متطلبات قيادة القوة البحرية من الأبنية والمنشآت الجديدة	1	2012	2015	100%	69.2%	10.8	0	10	10	المشروع يتضمن (٤ مكونات) (وهي /الاول:انشاء ٦ مقرات قيادة (سحب عمل)-الثاني: تأهيل ابنية ق ق البحرية في خور الزبير(منجز ١٠٠%) - الثالث: انشاء ابنية ق ق البحرية في خور الزبير (بنسبة ٩١%) تم تصفيته بموجب قرار ٢٠١٥/٣٤٧-تصفية رضائية لعدم توفر التخصيصات المالية بسبب الازمة المالية- الرابع: تصميم وتنفيذ رصيف بحري عائم شمال ام قصر بنسبة(٧٧%) تم ترويج ملحق عقد رقم (١) باكماله بعد توفير التخصيص المالي له لعام ٢٠١٨ وبعد توقفه نتيجة الازمة المالية ومنحه مدة تنفيذ (١٨٠ يوم) تبدأ من تاريخ استلام مستحقاته التي لم يتم استلامها بسبب عدم اطلاق السيولة المالية، تاريخ الانجاز للمشروع اصبح (٢٠١٧) لحصول موافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة بالجلسات (٢) و(٣٤) لسنة ٢٠١٧ على اضافة مدد اضافية لمشروع (انشاء ابنية قيادة القوة البحرية في خور الزبير).... لم يتم اقرار خطة مشاريع الاشغال الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط لغاية تاريخه وعدم إطلاق السيولة المالية.
		إكمال متطلبات قيادة القوة الجوية والقواعد الجوية التابعة لها.	1	2010	2014	100%	82.9%	0	0	0	0	المشروع يتضمن (٩ مكونات) خمسة منها منجزة (١٠٠%) و(٢ مكون) غير منجزة ولايوجد تخصيص مالي لاكمالها حيث تم تصفيته بموجب قرار مجلس الوزراء (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ تصفية رضائية نتيجة الازمة المالية ... حصول موافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة للسنوات (٢٠١٦، ٢٠١٧) على منح مدد اضافية لاحد مكونات المشروع ليصبح تاريخ انجاز المشروع ككل (٢٠١٧/٨/٣٠).
		اعادة تأهيل ابنية مجمع الكسرة العسكري (عدد/٨ بنائية).	1	2010	2011	100%	57.0%	10	0	7	10	تم فسخ العقد رضائياً مع الشركة المنفذة استناداً الى امر قضائي وتم مفاتحة مستشارية الامن الوطني من قبل امانة السر العام لوزارتنا لغرض استحصال الموافقة على التعاقد المباشر مع نفس الشركة المنفذة لاكمال الاعمال المتبقية استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ولم ترد الموافقة لغاية الان ، وتم وضع التخصيص المالي المناسب من قبل وزارتنا لهذا العام ٢٠١٩....، لم يتم اقرار خطة مشاريع الاشغال الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط لغاية تاريخه وعدم إطلاق السيولة المالية.
		إكمال متطلبات دائرة التدريب والمديريات والدوائر المرتبطة بها.	1	2012	2013	100%	83.3%	0	0	0	0	لا يوجد تخصيص مالي لاكمال المشروع الخاص ب(تأهيل الكلية العسكرية وكلية الأركان)الذي تم تصفيته بموجب قرار مجلس الوزراء (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ رضائياً نتيجة الازمة المالية، حصول موافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة للسنوات(منذ ٢٠١٣ ولغاية ٢٠١٦) على منح مدد اضافية للمشروع أنفاً ليصبح تاريخ انجاز المشروع ككل (٢٠١٦/٢/٤)

تأهيل وتطوير وتأثيث قاعدة الصورة الجوية بأسلوب (التصميم والتنفيذ).	1	2015	2018	100%	9.5%	15	11.7	15	15	15	لم يتم تخصيص مبالغ مالية لتعزيز رصيد الاعتماد المستندي المفتوح (TBI) - (الدفعه الثانية البالغة ٣٣% من مبلغ العقد) حسب صيغة العقد بسبب الازمة المالية وقلة المبالغ المخصصة لوزارتنا ... تاريخ انجاز المشروع (٢٠١٩/٦/١٥) بعد منح الشركة مدة اضافية (٢٥١ يوم) بموافقة اللجنة المركزية للمراجعة والصادقة على الاحالة بالجلسة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
إنشاء مراكز متخصصة لتصليح عجلات الهامفي	1	2012	2013	100%	23.9%	0	0	0	0	0	لا يوجد تخصيص مالي لاكمال المشروع الذي تم شموله بقرار مجلس الوزراء (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ (التجميد) نتيجة الازمة المالية، لحين توفير التخصيصات المالية. ، تاريخ الانجاز للمشروع اصبح (٢٠١٧/٣/١) بعد حصول موافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة الجلسة (١١) لسنة ٢٠١٥ على منح الشركة المنفذة فترة توقف كلي بسبب الازمة المالية وعدم توفر السيولة المالية.
انجاز مشروع قاعدة ام قصر البحرية.	1	2007	2010	100%	56.2%	0	0	0	0	0	تم سحب العمل من الشركة المنفذة للعقد التكميلي (المكون الثاني) حسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة بالجلسة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦ نتيجة لتلكوءه بالعمل ولا تتوفر التخصيصات المالية الكافية لاكماله بسبب الازمة المالية. تاريخ انجاز المشروع (٢٠١٢/٦/٩) حسب عقد المكون الثاني.
إكمال متطلبات مشروع خطة الاكتفاء الذاتي.	3	2008	2011	100%		0	0	0	0	0	المشروع يتضمن (١٤ مكون) - تم انجاز وتصفية (٩ مكونات) و(٤ مكونات) مشمولة بقرار مجلس الوزراء (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ - التصفية الرضائية خارج سيطرة الحكومة المركزية، والمكون الاخير تم سحب العمل. تاريخ انجاز المشروع (٢٠١٢/١٢/٣١) ونسبة الانجاز الكلية (٩٠,٣٢%). ولا تتوفر التخصيصات المالية لاكماله.
اكمل متطلبات القوات البرية	1	2019	2019	100%	61.0%	0	0	0	0	0	المشروع يتضمن (٦ مكونات) اربعة منها منجزة والاثنان تم شمولها بقرار مجلس الوزراء (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ - التصفية الرضائية بسبب الازمة المالية، ولا تتوفر التخصيصات المالية لاكمالها. تاريخ انجاز المشروع (٢٠١٧/٩/٦) ونسبة الانجاز الكلية (٧٣,٢٦%).
مشروع القرض الامريكي لوزارة الدفاع	2					10%	0	10%	5%		لعدم تمويل المبلغ من قبل وكالة الدفاع الامريكية

<p>لم يتم تحقيق اية نسبة من المستهدف لعدم وجود وزير للدفاع</p>		5%		10%	0	10%	حالي ومستمر	100%	2022	2019	3	<p>أ. دمج الدوائر والمديريات ذات المهام والوظائف المشتركة وفقا لدراسة وخطة عمل اعدت في دائرة العمليات ومديرية التنظيم وكمالي:</p> <p>دمج مديرية الاستخبارات العسكرية مع المديرية العامة للاستخبارات والامن</p> <p>دمج المديرية العامة للموازنة والبرامج مع مديرية الحسابات العسكرية</p> <p>دمج المديرية العامة لنهج الدفاع مع مديرية التخطيط</p> <p>ب. الغاء مديرية الشؤون العسكرية للاغراض المدنية والاستفادة من مواردها بتشكيل مديرية الاستثمار العسكري</p>	سريع	<p>تكليف القيادة العليا في وزارة الدفاع بإعداد خطة لتطوير عمل الوزارة ومن بينها دمج المديريات المتشابهة واحترام السياقات العسكرية واعادة تنظيم القوات المسلحة وبقية القوى الرديفة لمنع التقاطعات والواجبات والمسؤوليات</p>
<p>كتاب مديرتنا السري للغاية وعاجل العدد ٢٢٧ في ٢٤/١٢/٢٠١٨ الذي بموجبه تم ارسال قائمة بالاحتياج السنوي لعشرة سنوات القادمة الى معاونية الميرة لغرض ايداعها الى المراجع كتاب امانة السر العام العدد/١٤٧٧ في ٢٧/٢/٢٠١٩ تم تزويد وزارة الصناعة والمعادن باحتياج وزارتنا من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة ولم ترد الاجابة لحد الان</p>		9%		8%	0%	8%	0%	100%	2022	2019	سنوات 4	<p>توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتاد خفيف) اطلاقا</p>	سريع	<p>التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية لتوفير احتياجات الجيش العراقي من الاسلحة والانتهاء من وضع الخطط والتعليمات</p>

مع استمرار تسليح القوات المسلحة بأفضل أنواع الاسلحة الفعالة التي تناسب طبيعة المعركة في العراق وخصوصاً جهود مكافحة الارهاب	س	توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتادمتوسط) اطلاقه	4	2019	2022	100%	0%	8%	0%	8%	9%	كتاب مديرتنا السري للغاية وعاجل العدد ٢٢٧ في ٢٤/١٢/٢٠١٨ الذي بموجبه تم ارسال قائمة بالاحتياج السنوي لعشرة سنوات القادمة الى معاونة الميرة لغرض ايداعها الى المراجع كتاب امانة السر العام العدد/١٤٧٧ في ٢٧/٢/٢٠١٩ تم تزويد وزارة الصناعة والمعادن باحتياج وزارتنا من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة ولم ترد الاجابة لحد الان
دراسة امكانية البدء بتطبيق برنامج يشجع ويحفز التدريب الطوعي للعراقيين في سن ١٨-٢٢ في الدفاع عن البلاد في امنها الداخلي والوطني وتشمل اعمال دفاع وحماية وصيانة وبناء وتهيئة مستلزمات التعبئة عند تعرض البلاد لخطر داخلي او خارجي، وتنمية مهارات الشباب بشكل عام. ويمضي المتدرب فترة تدريب مناسبة تحدد لاحقاً مع الأخذ بنظر الاعتبار ديمومة الدراسة والعمل وتقليص الكلف، ويمنح المتدرب بعض الامتيازات غير المالية كالتخفيضات في أجور وسائل النقل العام، وحمل شارات مميزة، وإعطاء أولويات دون غبن الاخرين	لم تحدد	تنفيذ برنامج توعية* وتثقيف للمواطنين على امن العراق من مسؤولية جميع افراد المجتمع *وضع تخصيص مالي يكفي لتغطية نفقات تنفيذ المشروع *تامين البنى التحتية لتنفيذ المشروع وتزويدها بكافة المستلزمات الضرورية للتدريب *اجراء تدقيق امني واسع بالتنسيق مع الاجهزة الامنية كافة	4	2019	2022	100%	0%	10%	7%	8%	7%	

الاستفادة من الطاقات العظيمة الموجودة لدى القوات المسلحة للقيام بأعمال الاعمار واستخدام الطاقات الهندسية والعمرانية والصحية واللوجستية لإعمار المناطق المخربة ومساعدة الاهالي في تجاوز اوضاعهم الصعبة	لم تحدد	اعداد دراسة شاملة للاستفادة من طاقات وامكانات القوات المسلحة في اعمال الاعمار وخاصة في المناطق المخربة ومساعدة الاهالي في تجاوز أوضاعهم الصعبة تتمثل بإعادة البنى التحتية.			2019	2019	100%	10%	5%	10%	5%	<p>المتابعة الميدانية والتنسيق من قبل مدير الشؤون العسكرية للاغراض المدنية كونه عضو في اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني (٧٧) لسنة ٢٠١٦ المتضمن تشكيل الفريق الاستشاري الاعلى لتنسيق فعاليات أبواء النازحين من مناطق محافظة نينوى والمحافظات الاخرى مع وزير الهجرة والمهجرين (رئيس اللجنة العليا لاغاثة وأبواء النازحين) وأعضاء اللجنة انفاً ١. التنسيق بين جميع الجهات المعنية وذلك للاسراع في عمليات الاستجابة الانسانية للمناطق المتأثرة من الفيضانات والسيول واتخاذ الاجراءات الاحترازية للتقليل من اثر الكارثة في المحافظات (واسط - ذي قار - ميسان - البصرة) وكذلك في المحافظات (بغداد - ديالى - صلاح الدين - نينوى - الانبار - اربيل) .</p> <p>٢. التنسيق مع جمعية الهلال الاحمر لتهيئة فرق الاستجابة للكوارث في المحافظات كافة وتعزيزهم بفرق من المحافظات الغير مهددة بخطر الفيضانات والسيول لتقديم خدمات المأوى والخدمات الغذائية والاغاثية .</p> <p>٣. التنسيق مع دوائر وزارة الصحة التابعة للمحافظات لتهيئة الفرق الصحية في المحافظات كافة وتعزيزهم بفرق من المحافظات الغير مهددة بخطر الفيضانات والسيول لتقديم الخدمات الاسعافية وخدمات الدعم النفسي وخدمات الاخلاء بسيارات الاسعاف .</p> <p>٤. تعزيز الجانب اللوجستي للمحافظات المهدة بخطر الكارثة (الارصدة المخزنية / العجلات).</p> <p>٥. تم تعزيز الارصدة المخزنية من المواد الاغاثية والغذائية و الاسعافية في المحافظات المهدة بالسيول و الفيضانات للاستجابة الفورية لحالات الطوارئ .</p> <p>٦. استنفار الموارد البشرية و اللوجستية للتدخل السريع و الفوري عند حدوث الكارثة .</p> <p>٧. تم نصب بعض الخيم للعوائل المتضررة بشكل فردي في بعض الاحيان في اماكن اكثر امناً قريباً من مساكنهم الاصلية لرفضهم الانتقال الى الاماكن البديلة لأيوائهم حفاظاً على ممتلكاتهم (الاراضي الزراعية و الماشية). ٨. التنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة والمهجرين لغلق (٥٨) مخيم للنازحين.</p> <p>٩. التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية لبيان مناسيب المياه في جميع المحافظات .</p> <p>١٠. التنسيق والمتابعة مع جمعية الهلال الاحمر ووزارة الهجرة والمهجرين لتوزيع مواد غذائية واغاثية على العوائل المتضررة من الفيضانات والسيول . ١١. فتح مدارس داخل المخيمات لكافة المراحل ويحاضر فيها متطوعين من العوائل النازحة. ١٢. التنسيق مع وزارة النفط لتوزيع مادة النفط الابيض على العوائل النازحة المتضررة من جراء الفيضانات والسيول .</p>
---	---------	--	--	--	------	------	------	-----	----	-----	----	--

وزارة النفط

المحور الثالث : الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز - ف ٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
حاليا في طور دراسة ثلاث عروض هانويل/لوك اويل-توتال/اورك المستهدف للفصل الثالث : ٥٠ % المستهدف للفصل الرابع ١٤ %					1%	١ %	10%	100%	2022	2019	4	١- مشروع استثمار غاز (ارطاوي ،مجنون، وغرب القرنة ٢واللحيس والصبة والطوبه)		الاستمرار في تطوير الطاقات الانتاجية للنفط الخام وانتاج الغاز الطبيعي او المصاحب والعمل الدؤوب لتقليص حرق الغاز وتوفير الغاز للكهرباء المنشآت الصناعية لزيادة الدعم المالي للموازنة العامة للبلاد
تاخر تقديم عرض شركة اوريون الامريكية المستهدف للفصل الثالث ٨ % المستهدف للفصل الرابع ٢٠ %					0%	٢ %	10%	100%	2021	2019	3	٢- مشروع استثمار غاز بن عمر		
هنالك خلاف على اقرار بعض المواصفات الفيزيائية للغاز		10%		10%	5%	١٠ %	10%	100%	2022	2019	5	٣- مشروع استثمار الغاز في حقول ميسان(حقل حلفاية)		
وجود نقاط عالقة لازالت قيد المناقشة بين طرفي العقد بخصوص التصميم الاساسي ومنظومة التجميع ادى الى تاخر نسبة الانجاز		15%		10%	1%	٥ %	10%	100%	2021	2018	4	٤- مشروع استثمار غاز حقل الناصرية		
تم تشكيل فريق عمل وزاري لتطوير الحقل بالجهد الوطني مع شريك بنسبة ٥١ % لنفط الوسط و ٤٩ % للشريك الاجنبي الواقع الحالي صفر % لم تكن النسبة صفر بسبب تدمير ماتم انجازه قبل الاحداث اصبح الواقع الحالي صفر		6%		3%	1%	١ %		100%	2023	2019	5	٥- مشروع استثمار غاز حقل المنصورية		
كان العمل متوقف بسبب الوضع الامني حاليا الوضع الامني جيد سيتم مفاطحة الشركة المقاوله ko gas بقرارها النهائي بالاستمرار بالعمل او الانسحاب ليتسنى للوزارة الاحالة لشركة اخرى الفترة الزمنية للتنفيذ : ١٣ / تاريخ بداية التنفيذ ٢٠١٩ : ٢٠ / تاريخ الانجاز: ٢٠٣٢ / المستهدف الكلي ١٠٠ % / الواقع الحالي صفر % لم تكن النسبة صفر بسبب تدمير ماتم انجازه قبل الاحداث اصبح الواقع الحالي صفر		4%		2%	0%	١ %						٦- مشروع استثمار غاز حقل عكاظ		
تلكؤ المجهز (شركة ديبالي) في اكمال تجهيز مواد وحدة معالجة النفط الرطب		5%		3%	2%	٢ %	1%	100%	2021	2017	5	٧- تطوير حقل العمارة نفطي		
		67%		30%	3%	٣ %	75%	100%	2019	2006	13	٨- تطوير حقل الصبة نفطي		
الفترة الزمنية للمشروع : مستمر/ تاريخ بداية التنفيذ: ٢٠١٩/ تاريخ الانجاز: مستمر/ المستهدف الكلي: ١٠٠ % / الكلفة الكلية: ١٤٠٠٠٠٠٠ مليون دينار / الواقع الحالي: صفر المشروع مستمر حسب العقد الموقع مع شركات جولات التراخيص (المستهدف الكلي سنويا ١٠٠ % باعتباره مشروع سنوي)		30%		20%	50%	٥٠ %						٩- استخراج النفط الخام عن طريق مشاريع جولات التراخيص		
قيد الاحالة		4%		3%	3%	٣ %	5%	100%	2025	2017	8	١٠- تطوير حقل الناصرية نفطي		

سبب الحيود انهاء العقد مع المقاول (شركة لايتون) وتاخر المصادقة على اتفاقية التسوية الرضائية من قبل المجلس الوزاري للطاقة		70%		25.50%	1.50%	%٤,٥٠	86%	100%	2019	2014	5	مشروع الانبوب البحري	لم تحدد	التعجيل في تطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من أجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها. والتسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية
المشروع متوقف بسبب عدم توفر السيولة المالية		7%		3%	2%	%٥	40%	100%	2022	2013	9	٢- انشاء مستودع الناصرية		
		6%		4%	5%	%٥	70%	100%	2020	2011	9	٣- انشاء مستودع السماوة		
		4%		2%	4%	%٤	90%	100%	2019	2012	9	٤- انشاء مستودع العمارة		
تم تحقيق أكثر من النسبة المستهدفة والمطلوبة للعام ٢٠١٩		0		0	3	١	1	12 اجتماعات	2022	2019	مستمرة	القيام بدور فاعل في منظمة المصدر للنفط الخام (أوبك) بما يحقق مصلحة العراق وبراغي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة	لم تحدد	القيام بدور بناء وفاعل في منظمة الدول المصدرة للنفط الخام (أوبك) بما يحقق مصلحة العراق وبراغي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة
		4%		2%	4%	%٤	60%	١٤٠ الف ب/ي	2021	2013	8	١- مشروع مصفى كربلاء	طويل	اكمال مشاريع المصافي المتعاقد عليها مع شركات اجنبية من خلال ضمان حقوق العراق وحقوق الشركات بشكل عادل وسلس وحسب نسب الإنجاز.

تشكيل فريق هندسي استشاري من الوزارة مختص بتصاميم المشاريع المختلفة لتعظيم الجهد الوطني مهمته اعداد التصاميم الكاملة من خلال فريقهم العلمي او من خلال (الهندسة العكسية) باعتماد تصاميم سبق للعراق أن أنفق عليها مئات الملايين من الدولارات وذلك بالاختزال للساعات أو تكبيرها وحسب حاجة العراق وطلب المشورة من بيوتات الخبرة العراقية والاجنبية كلما اقتضت الحاجة	سريع	تشكيل فريق هندسي استشاري	1	2019	2019	70%	100%	100%	0	0	تم انجاز المشروع
دراسة تقليص مساحات المحرمات النفطية والغازية واصدار تعليمات واضحة بذلك لغرض زيادة المساحات الصالحة للاستخدامات الاخرى ومنع بور الاراضي دون الاضرار بالقطاع النفطي والغازي	سريع	تقليص المحرمات النفطية والغازية	7	2016	2022	70%	100%	100%	0	0	تم انجاز المشروع
التركيز على ايجاد فرص استثمارية ضمن قانون الاستثمار النفطي رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٧ لبناء مصافي جديدة وان تطلب الأمر تعديل القانون لجذب	لم تحدد	مصفي ميسان-1 الاستثماري	8	2014	2022	10%	150 الف ب/ي	10%	10%	٨٠%	ان المعايير الجديدة في تقييم نسب الانجاز لمشاريع المصافي الاستثمارية تعتبر مرحلة توقيع العقد للمشروع هي نسبة انجاز ١٠٠%
		مصفي كركوك-2 الاستثماري	4	2018	2022	10%	150 الف ب/ي	10%	15%	٧٠%	ان المعايير الجديدة في تقييم نسب الانجاز لمشاريع المصافي الاستثمارية تعتبر مرحلة توقيع العقد للمشروع هي نسبة انجاز ١٠٠%
		مصفي الفاو الاستثماري-3	5	2019	2024	10%	300 الف ب/ي	10%	4%	١٠%	ان المعايير الجديدة في تقييم نسب الانجاز لمشاريع المصافي الاستثمارية تعتبر مرحلة توقيع العقد للمشروع هي نسبة انجاز ١٠٠% حاليا قيد دعوة الشركات

استثمارات للبلاد		مصطفى الناصرية-4 الاستثماري	5	2019	2024	150 الف برميل / يوم	5%	٢٠% %	15%	30%	50%	ان المعايير الجديدة في تقييم نسب الانجاز لمشاريع المصافي الاستثمارية تعتبر مرحلة توقيع العقد للمشروع هي نسبة انجاز ١٠٠% المشروع قيد الاحالة
المساهمة بتطوير الصناعات المشتقة كالبتر وكيمياويات والاسمدة وبقيّة المشتقات النفطية والغازية او المنتجات العرضية كالكبريت وغیره لتنوع صادرات جديدة غير النفط الخام	لم تحدد	مشروع تاهيل مصفى البصرة (وحدة FCC)	4	2019	2022	34 الف ب/ي	10%	٣% %	3%	8%	14%	تم توجيه الدعوة الى الشركات اليابانية لتقديم عطاءها وتم عقد اجتماع تحضيرى (pre bid meeting) مع الشركات اليابانية يومي (٢٠١٩/٤/٢٦-٢٥)
مد منظومات الغاز الى الأحياء والمجمعات السكنية	لم تحدد	مد منظومات الغاز الى الاحياء والمجمعات السكنية	8	2015	2022	100%	26000 وحدة	٣٥٦٠	3559	6815	6816	
تنفيذ مشروع السيارات التي تعمل على احتراق الغاز	لم تحدد	تنفيذ السيارات التي تعمل على حرق الغاز	12	2017	2028	300الف سيارة	سيارة 2000	١٥١٢	1238	2088	18000	الانحراف المبين في تقدم العمل يعود الى الاسباب التالية ١- تم تطبيق القرار على مراحل بالتنسيق مع دوائر المرور حيث شمل القرار (التسجيل لأول مرة) كمرحلة اولى وكمرحلة ثانية تمت بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦ شملت جميع فئات السيارات في المحافظات ماعدا (بغداد والبصرة) خلال هذا الشهر ٢- تقدم العمل يعتمد على زخم السيارات الواردة من المرور ورغبة المواطن حيث ان الطاقة المتاحة لورشنا العاملة (١٨٠٠ سيارة/شهر) موزعة على ٢٣ ورشة في بغداد والمحافظات ٣- الاعلام المضاد ضد مشروع استخدام الغاز السائل كوقود للمركبات قلل من اقبال المواطنين على اضافة المنظومات
وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق	لم تحدد	وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق	2	2019	2020	100%	10%	١٠% %	2%	15%	20%	صدر قانون شركة النفط الوطنية رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ ونشر في الوقائع العراقية بتاريخ ٢٠١٨/٤/٩ الا انه لم يتم وضعه موضع التطبيق لصعود قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨ الذي حكم بعدم دستورية بعض المواد الواردة فيه ، تسعى الوزارة في الوقت الحالي الى اعادة تفعيل عمل الشركة وتعديل قانونها في ضوء كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ٥٦٢٨ في ٢٠١٩/٢/١٩ حيث تم عقد اجتماع مع السيد الوزير بخصوص بحث الخيارات المناسبة لتحقيق هذا الامر ولا يزال العمل جاري لحين بلورة الموقف النهائي ورفعته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة الداخلية

المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
حفر (٨) ابار من قبل الهيئة العامة للمياه الجوفية - 1 تم تحويل (٨) ابار الى نسبة مئوية - 2		40%		30%	30%	30%	بئر 40	بئر 48	2019	2008	مستمرة	حفر ابار ارتوازية بئر (الحدود)	لم تحدد	تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الارهاب ومنع عودته باي عنوان او شكل او اسم. ولهذا الغرض ايلاء اهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصديدة للإرهاب، والاصرار على منع اي تشكيل عسكري او سلاح خارج إطار الدولة، وتابعة الجميع للقائد العام للقوات المسلحة. والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.
		10%		15%	25%	25%	مقر 6	مقر فوج 8	2020	2010	مستمرة	بناء مقرات افواج عدد ٨ (الحدود)		
تم انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار (٤٣٢) وتم احواله المشروع من جديد ولم يتم التعاقد لعدم وجود تخصيصات مالية		30%		7%	0%	3%	29%	100%	2020	2008	مستمرة	انشاء بناية مقر العمليات في مركز الوزارة		
العقد في طور التوقيع وحاليا في التدقيق لدى الجهات الرقابية		2,5%		2,5%	0%	0%	90%	100%	2020	2006	مستمرة	انشاء مخافر حدودية		
ملاحق عدد (٢) مدمرة بنسبة (١٠٠%) من قبل عصابات - 1 داعش ملاحق عدد (٤) نسبة الانجاز فيها (٧٦%) ومتوقفة لعدم توفر - 2 تخصيصات مالية		1%		1%	0%	1%	97%	100%	2019	2008	مستمرة	انشاء ١٥٠ ملحق حدودي		
المشروع مجمد وفق قرار مجلس الوزراء ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ تم اجراء ذرعة واقع حال وبينت نسبة الانجاز ٤٠% وليست ٧٢% يرجى تصحيح النسبة الى ٤٠% ولم يتم استئناف العمل لعدم وجود تخصيصات مالية بالموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ وتوجد مستحقات مالية للشركة قدرها (٤٣٤,٩٣٧,٢٣٤) دينار		20%		10%	0%	10%	72%	100%	2020	2010	مستمرة	انشاء مركز تدريب شرطة كربلاء		
تم انهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة المنفذة وفق قرار (٣٤٧) ولم يتم التعاقد لعدم وجود تخصيصات مالية		14%		7%	0%	3%	46%	100%	2020	2006	مستمرة	انشاء ابنية فوج حماية مقر الوزارة وتجهيز ونصب منظومات المراقبة والسيطرة وتاهيل مداخل ومخارج الوزارة		
تم انهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة المنفذة وفق قرار (٤٣٢) ولم يتم التعاقد لعدم وجود تخصيصات مالية		10%		7%	0%	3%	40%	100%	2021	2009	مستمرة	تطوير ابنية كلية الشرطة / (المرحلة الاولى)		
تم تجميد المشروع وفق قرار (٣٤٧) وفي طور اكمال تدقيق ملحق قرار للمشروع للمباشرة به		15%		5%	0%	5%	25%	100%	2021	2013	مستمرة	انشاء المجمع الرياضي لنادي الشرطة		

انشاء بناية الشؤون الداخلية والامن في النجف الاشرف	مستمرة	2013	2020	100%	35%	10%	0%	10%	20%	المشروع متوقف سبب عدم ورود التمويل الى خزينة النجف من وزارة المالية
تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية (استثمارية)	مستمرة	2014	2022	تأمين اسلحة واعتدة متنوعة ومعدات واليات عسكرية		5%	5%	10%	10%	تم تخصيص الفصل الثاني لاعداد الدراسات واعتمادها حاليا في مرحلة اعادة النظر بتوزيع التخصيصات المالية بسبب تخفيض تخصيصات الموازنة الاستثمارية من (٢٧٠) مليار الى (١٢٢) مليار بموجب قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩
انشاء مستشفى قوى الامن الداخلي	4	2009	2016	100%	42%	2%	0%	2%	9%	تم انهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة المنفذة وفق قرار (٤٣٢) ولم يتم التعاقد ولعدم وجود تخصيصات مالية وهناك اجراءات ادارية لتنفيذ المشروع بأسلوب الاستثمار من قبل صندوق الضمان الصحي
انشاء بناية متعددة الطوابق في مركز الوزارة	3	2013	2017	100%	42%	2%	0%	3%	13%	تم انهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة وفق قرار (٣٤٧) وعدم الاحالة لعدم توفر تخصيصات مالية
اعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع مركز الوزارة	1	2010				2%	0%	3%	3%	متوقف لعدم وجود تخصيصات مالية و واقع الحال للمشروع (٩٢%)
شراء عجلات مدرعة عدد / ٣٥٠ نوع هامفي لوزارة الداخلية	1	2015	2015	100%	75%	100%	100%			المشروع منجز ١٠٠% وتطلب حذفه من البرنامج
تجهيز عجلات نوع نيسان اختصاصية لنقل الكلاب البوليسية 12(K9) عجلة (الحدود)	4	2019	2022	عجلة 12 لنقل الكلاب البوليسية (K9)	صفر %	0%	0%	4%	21%	تم مخاطبة وزارة الداخلية مديرية الشؤون المالية بموجب كتاب مديرية الرواتب والامور المالية قيادتنا ذي العدد ٢٠٣٤ في ١٠/٣/٢٠١٩ المتضمن تخصيص مبالغ مالية لشراء العجلات الاختصاصية لنقل الكلاب البوليسية مع العرض لم ترد اي مبالغ تخص شراء العجلات الاختصاصية في موازنه عام ٢٠١٩ الجاريه لقيادتنا
مفرزة K9 عدد ٨٠ (الحدود)	4	2019	2022	مفرزة K9 عدد ٨٠	صفر %	4%	2%	8%	13%	تم مخاطبة وزارة الداخلية مديرية الشؤون المالية بموجب كتاب مديرية الرواتب والامور المالية قيادتنا ذي العدد ٢٠٣٤ في ١٠/٣/٢٠١٩ لغرض تخصيص مبالغ مالية لشراء الكلاب البوليسية (K9) وتم اعداد دراسته لغرض شراء K9 اختصاص كشف مخدرات - كشف تفجرات وارساله الى مديرية العقود قسم دراسات الجدوى بموجب كتاب قسم العقود قيادتنا ١٣٠ في ٢٩/١/٢٠١٩ مع العرض لم ترد اي مبالغ تخص شراء الكلاب البوليسية ومستلزماتها في موازنه عام ٢٠١٩ الجاريه لقيادتنا (تم توزيع ٨٠ مفرزه على مدى اربعة سنوات بواقع ٢٠ مفرزه لكل سنة)
تبليط ٣٠ كم وصيانة الطرق وصيانة المعامل	1	2019	2019	100%	صفر %	30%	0%	30%	40%	المشروع لم يتم تخصيص مبالغ مالية له ضمن الموازنة التشغيلية ولا يمكن تنفيذ هذا المشروع لسنة واحدة وبهذه الطريقة ويتطلب تغير التسمية الى (تشغيل معامل الاسفلت والكونكرت والكسارات وصيانتها وتبليط الطرق الحدودية) وعلى مدى اربعة سنوات وتخصيص سنوي خمسة مليار دينار.

المشروع منجز (١٠٠%) و بانتظار تسديد المبلغ المتبقي للمشروع والبالغ (١,٥٠٦,٨٠٨,٥٠١) دينار عراقي لغرض التشغيل النهائي حيث تم مخاطبة مكتب السيد الأمين العام لمجلس الوزراء بموجب كتاب مكتب الوزير ذي العدد (٢١٨٨) في ١٥/١/٢٠١٨ (لغرض الاستثناء) وكذلك تم مفاتحة مجلس الوزراء – لجنة الشؤون الاقتصادية بموجب كتاب مديرية العقود ذي العدد (٤٣٠٠) في ٥/٧/٢٠١٨ (المرفق) وتم التأكيد على مجلس الوزراء بموجب كتاب مديرية العقود ذي العدد (٢٢٤٤) في ١٤/٤/٢٠١٩				100%	100%	100%	المشروع منجز ١٠٠ % باستثناء التشغيل النهائي	2015	2013	4 اشهر	العقد المرقم (خ/٢٠١٣/٦٦) (البدالة الصينية (٥٠٠) خط ZTE (مديرية الاتصالات)		
تم تخصيص الفصل الثاني لتحديث الدراسة وتوفير الاعتماد المالي والفصل الثالث للاجراءات التعاقدية والفصل الرابع لمباشره الشركة بالعقد		80%		10%	10%	0%	جهاز 16	2019	2019	1	جهاز (IMSI) الثابت والمخفي (استخبارات)		
تم تخصيص الفصل الثاني لتحديث الدراسة وتوفير الاعتماد المالي والفصل الثالث للاجراءات التعاقدية والفصل الرابع لمباشره الشركة بالعقد		80%		10%	10%	0%	جهاز 1	2019	2019	1	جهاز (TACTICAL) (SYSTEM SAI3) (استخبارات)		
تم تخصيص الفصل الثاني لتحديث الدراسة وتوفير الاعتماد المالي والفصل الثالث للاجراءات التعاقدية والفصل الرابع لمباشره الشركة بالعقد		80%		10%	10%	0%	منظومة 16	2019	2019	1	منظومة استكمال الاتصال اللاسلكي (RF) (استخبارات)		
تم تخصيص الفصل الثاني لتحديث الدراسة وتوفير الاعتماد المالي والفصل الثالث للاجراءات التعاقدية والفصل الرابع لمباشره الشركة بالعقد		80%		10%	10%	صفر	18 منظومة	2019	2019	1	١- منظومة استخلاص البيانات (XRY) (استخبارات)		
تم تخصيص الفصل الثاني لتحديث الدراسة وتوفير الاعتماد المالي والفصل الثالث للاجراءات التعاقدية والفصل الرابع لمباشره الشركة بالعقد		80%		10%	10%	0%	1 منظومة	2019	2019	1	منظومة (I2N) (استخبارات)		
		5000		5000	9241		80000 متدرب	2022	2019	مستمرة	اعداد وتأهيل وتدريب ضباط وزارة الداخلية (التدريب)		
المستهدف للفصل الاول (٦٢٥٠٠) والمتحقق منه (١٥٢٠٠) متدرب للفصل الاول		62500		62500	53596		1000000 متدرب	2022	2019	مستمرة	اعداد وتأهيل وتدريب المراتب (مفوضين ومنتسبين) وزارة الداخلية (التدريب)	لم تحدد	ستحرص الحكومة على بناء وتطوير القوات المسلحة العراقية بما يمكنها من الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه ، كما ستعمل على تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية من أجل بسط سلطة القانون ومحاربة العصابات المنظمة وكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والمال العام.
المستهدف للفصل الاول (١٥٦٢) والمتحقق منه (٦٥٠) متدرب للفصل الاول		1562		1562	1934		25000 متدرب	2022	2019	مستمرة	اعداد وتأهيل وتدريب الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الداخلية (التدريب)		
المستهدف للفصل الاول (٣١٢٥) والمتحقق منه (١٤٢٥) متدرب للفصل الاول		3125		3125	3046		50000 متدرب	2022	2019	مستمرة	تدريب وتطوير الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين في وزارة الداخلية من خلال الخبراء الاجانب (داخل وخارج العراق) (التدريب)		

رفع كفاءة اداء العاملين في الوزارة من خلال زجهم في الدراسات العليا (التدريب)	مستمرة	2019	2022	1000 متدرب		0%	0%	0%		250	يتم تحديد الموقف لحين اكمال التقديم وحسم ملفات المتقدمين وتظهر النتائج بشكل سنوي نهاية الفصل الرابع
رفع كفاءة اداء العاملين في الوزارة من خلال زجهم في الدراسات الاولى (التدريب)	مستمرة	2019	2022	4000 متدرب		0%	0%	0%		1000	يتم تحديد الموقف لحين اكمال التقديم وحسم ملفات المتقدمين وتظهر النتائج بشكل سنوي نهاية الفصل الرابع
إنشاء بنائة تضم قاعات دروس نموذجية ومختبرات وقاعات منام الطلاب (معهد اعدادا المفوضين)	2	2019	2020	100%	صفر	2%	2%	5%		10%	تخصيص الفصل الثاني لاعداد الوصف الوظيفي وخصص الفصل الثالث لاعداد التصاميم وقحوصات التربة والفصل الرابع لتامين التخصيصات المالية والاجراءات التعاقدية ويتطلب تغير المستهدف لعام ٢٠١٩ ليصبح (١٧%)
تغير المناهج التعليمية (معهد اعدادا المفوضين)	1	2019	2019	100%	صفر	20%	20%	40%		40%	خصص الفصل الثاني لاكمال الدراسة المتعلقة بتغير المناهج والفصل الثالث والرابع لاكمال الاجراءات التعاقدية مع وزارة التربية
إنشاء قاعة للتدريب البدني (معهد اعدادا المفوضين)	1	2019	2019	100%	صفر	20%	20%	40%		40%	يتطلب تغير اسم المشروع من انشاء الى تجهيز معدات رياضية وخصص الفصل الاول لاعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمصادقة عليها وتم تخصيص الفصل الثالث والرابع للتعاقد والتجهيز
أنشاء مختبر انكليزي (معهد اعدادا المفوضين)	1	2019	2019	100%	صفر	20%	20%	40%		40%	يتطلب تغير اسم المشروع من انشاء الى تجهيز معدات مختبر انكليزي وخصص الفصل الاول لاعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمصادقة عليها وتم تخصيص الفصل الثالث والرابع للتعاقد والتجهيز
انشاء ميدان رمي الكتروني (معهد اعدادا المفوضين)	1	2019	2019	100%	صفر	20%	20%	40%		40%	يتطلب تغير اسم المشروع من انشاء الى تجهيز معدات ميدان الرمي وخصص الفصل الاول لاعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمصادقة عليها وتم تخصيص الفصل الثالث والرابع للتعاقد والتجهيز
ب- مختبر تمييز الصوت (IKAR) (استخبارات)	1	2019	2019	جهاز 1	0%	10%	5%	10%		80%	تم تخصيص الفصل الثاني لتحديث الدراسة وتوفير الاعتماد المالي والفصل الثالث للاجراءات التعاقدية والفصل الرابع لمباشرة الشركة بالعقد
وضع وتنفيذ خطة لحل مشكلة الاختناقات المرورية داخل المدن وخارجها (جهد حكومي)	مستمرة	2019	2020	100%	0%	100%	100%				فيما يتعلق بعمل هذه الوزارة سيق وان اعدت مديرية المرور دراسة بذلك وافرت في مجلس الوزراء وتعميمها على الوزارات المعنية علما ان توصيات الدارسة لاندخل ضمن اختصاص عمل مديرية المرور وبذلك انجزت وزارة الداخلية مهمتها
تأمين مستلزمات تسجيل المركبات واجازات السياقة في بغداد والمحافظات (استثمارية)	مستمرة	2010	2022	100%	85%	1%	1%	1%		1%	
اكمال تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية (استثمارية)	مستمرة	2014	2019	موقع 356	216	46	17	47		47	حاليا توجد (٢٩) دائرة جاهزة للعمل وبنظارتعزيز الملاكات البشرية ونقترح عرض نتائج لجنة الامر الديواني (٩٢) لسنة ٢٠١٨ على مجلس الوزراء لغرض حسم الموضوع

المرور ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومديرية الدفاع المدني ووضع الآليات المناسبة لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الأساسية إلكترونياً	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الدور / صلاح الدين (استثمارية)	1	2012	2014	100%	58%	15%	15%		17%	المشروع متوقف من عام (٢٠١٤) ومتعرض لاضرار جراء العمليات العسكرية-2 تم تخصيص الفصل الثاني لمفاتيح المكتب الاستشاري لفحص البناية من-3 الناحية الانشائية وتأمين التخصيصات المالية
	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الشرفا / صلاح الدين (استثمارية)	2	2012	2014	100%	15%	10%	0%	20%	25%	المشروع متوقف من عام ٢٠١٤ بسبب العمليات العسكرية-1 تم المباشرة بالعمل بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨ حيث بلغت نسبة الانجاز-2 العمل متوقف من شهر شباط ٢٠١٩ لعدم ورود التخصيصات المالية-3
	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء السلماني / المثنى (استثمارية)	2	2012	2013	100%	5%	0%	0%	0%	0%	تم سحب العمل من الشركة المنفذة-1 (٢٠١٥) حاليا في احراءات تنفيذ القرار (٤٣٢) لسنة وحسمه امام القضاء-2
	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الحويجة / كركوك (استثمارية)	2	2013	2014	100%	40%	2%	0%	5%	13%	لم يتم المباشرة بالعمل لوجود اضرار نتيجة العمليات العسكرية-2 تم تخصيص الفصل الثاني لتشكيل لجنة لتقييم الاضرار بالموقع-3 تم تخصيص الفصل الثالث لتأمين التخصيصات المالية وتنظيم ملحق عقد-4 بالاطرار تم تخصيص الفصل الرابع المباشرة من قبل الشركة-5
	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الهاشمية / بابل (استثمارية)	2	2013	2017	100%	25%	0%	0%	0%	0%	الشركة متكلته في الوقت الحاضر-1 السير بالاجراءات القانونية بحق الشركة وحسمها امام القضاء-2
	تجهيز معدات هندسية (١٠) شغل (حدود)	2	2019	2020	شغل 10	صفر %	0%	0%	2%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة
	تجهيز معدات هندسية (٢٠) حفار بوكلاين (الحدود)	2	2019	2020	حفار 20 بوكلاين	صفر %	0%	0%	2%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة
	تجهيز معدات هندسية (٥) كريدنر (الحدود)	1	2019	2019	كريدنر 5	صفر %	0%	0%	2%	7%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة
	تجهيز معدات هندسية عجلة فاوون ٦٥ طن لنقل المعدات فولفو (١٠) (الحدود)	1	2019	2019	فاوون نوع 10 فولفو	صفر %	0%	0%	5%	7%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة
	تجهيز معدات هندسية عجلة قلاب ١٦ طن نوع فولفو عدد (٢٥) (الحدود)	2	2019	2020	قلاب ١٦ طن نوع فولفو عدد (٢٥)	صفر %	0%	0%	2%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة
	تجهيز معدات هندسية (١٦) عجلة اسقاء فولفو ١٠٠٠ لتر (الحدود)	2	2019	2020	عجلة 16 اسقاء نوع فولفو	صفر %	0%	0%	2%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة

تأمين عجلة اطفاء (ماء+رغوة ٧٠٠٠ لتر) (دفاع مدني)	2	2019	2020	140	620	5%	4%	5%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة حيث خصص الفصل الثاني لاعداد دراسة الجدوى والمصادقة والفصل الثالث والرابع خصص لتأمين التخصيصات المالية والاجراءات التعاقدية
تأمين عجلة نقل مياه سائدة سعة ٣٦,٠٠٠ الف لتر (دفاع مدني)	2	2019	2020	20	2	5%	4%	5%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة حيث خصص الفصل الثاني لاعداد دراسة الجدوى والمصادقة والفصل الثالث والرابع خصص لتأمين التخصيصات المالية والاجراءات التعاقدية
عجلة انقاذ خفيف (دفاع مدني)	2	2019	2020	193	0	5%	4%	5%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة حيث خصص الفصل الثاني لاعداد دراسة الجدوى والمصادقة والفصل الثالث والرابع خصص لتأمين التخصيصات المالية والاجراءات التعاقدية
تأمين عجالات انشائية(شغل + حفارة) (دفاع مدني)	2	2019	2020	32	12	5%	4%	5%	5%	حاليا في مرحلة اعادة النظر في توزيع التخصيصات المالية لمبلغ القرض والبالغة (١٧٢٥٧٢) مليار بعد تخصيص مبلغ وقدره (١٣٤) مليار لشراء الائتدة بسبب التخفيض الذي حصل للموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ استنادا لقانون الموازنة حيث خصص الفصل الثاني لاعداد دراسة الجدوى والمصادقة والفصل الثالث والرابع خصص لتأمين التخصيصات المالية والاجراءات التعاقدية
انشاء اكااديمية الدفاع المدني في الديوانية	1	2011	2013	100%	50%	5%	0%	5%	5%	تم تخصيص الفصل الثاني لتأمين التخصيصات المالية 1- والفصل الثالث والرابع لاكمال الاجراءات التعاقدية يرجى تعديل الفترة الزمنية الانتهاء المشروع من (١) سنة الى ٤ - 2 سنوات
انشاء مركز الدفاع المدني ناحية الخيرات / كربلاء المقدسة	2	2012	2013	100%	49%	0%	0%	0%	0%	المشروع في طور انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٤٣٢) لسنة ٢٠١٥ للمشاريع المسحوب منها العمل وحاليا الموظف منظر امام القضاء
انشاء مركز الدفاع المدني ناحية ابي غرق / بابل	2	2012	2013	100%	52%	0%	0%	0%	0%	المشروع في طور انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٤٣٢) لسنة ٢٠١٥ للمشاريع المسحوب منها العمل وحاليا الموظف منظر امام القضاء
انشاء مركز الدفاع المدني ناحية المناذرة / النجف الاشرف	1	2012	2015	100%	92%	2%	0%	3%	3%	المشروع في طور انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ للمشاريع الخاضعة لاجراءات التسوية الرضائية وسيتم اكمال المشروع في حال توفر التخصيصات المالية
انشاء مركز الدفاع المدني ناحية السنية / الديوانية	2	2012	2013	100%	2%	0%	0%	0%	0%	المشروع في طور انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٤٣٢) لسنة ٢٠١٥ للمشاريع المسحوب منها العمل وحاليا الموظف منظر امام القضاء
انشاء مركز الدفاع المدني ناحية السدة/ بابل	2	2012	2013	100%	45%	0%	0%	0%	0%	المشروع في طور انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٤٣٢) لسنة ٢٠١٥ للمشاريع المسحوب منها العمل وحاليا الموظف منظر امام القضاء
انشاء مركز الدفاع المدني قضاء الطف / كربلاء المقدسة	2	2012	2013	100%	49%	0%	0%	0%	0%	المشروع في طور انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٤٣٢) لسنة ٢٠١٥ للمشاريع المسحوب منها العمل وحاليا الموظف منظر امام القضاء

المشروع في طور انهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ للمشاريع الخاضعة لاجراءات التسوية الرضائية وسيتم اكمال المشروع في حال توفر التخصيصات المالية		12%		8%	0%	8%	72%	100%	2013	2012	1	انشاء مركز الدفاع المدني قضاء المدائن / بغداد		
تم سحب العمل من الشركة المنفذة 1- تم تخصيص الفصل الثاني لاجراءات تطبيق القرار (٤٣٢) لسنة 2- (2015) تم تخصيص فصل الثالث والرابع لانهاء العلاقة التعاقدية لعدم وجود 3- تخصيصات مالية وحسمة امام القضاء		0%		0%	0%	0%	3%	100%	2013	2013	2	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء المحاول / بابل		
في طور انهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة المنفذة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٢) لسنة ٢٠١٥ وبانتظار حسمه قضائيا							65%	100%	2014	2011	2	انشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة		
خصص الفصل الثاني لاعداد دراسة الجدوى والمصادقة عليها والفصل الثالث تهيئة موقع والفصل الرابع تهيئة متدربين على ان تستكمل مراحل التعاقد والتجهيز خلال السنوات القادمة عند توفر التخصيصات المالية ضمن الموانة الخاصة بمديريتهم		10%		10%	4%	5%	صفر	كلاب بوليسية لليبحث عن الجثث عدد (٤) و لليبحث عن الاحياء عدد (٦) و لليبحث عن المتفجرات عدد (٢)	2022	2019	4	شراء كلاب واستحداث شعبة الكلاب البوليسية (دفاع مدني)		
منجز					100%	100%	100%	100%	2022	2018	4	تطبيق فوهات حريق (دفاع مدني)		
خصص الفصل الثاني لاعداد دراسة الجدوى والمصادقة عليها والفصل الثالث مرحلة الاجراءات التعاقدية والفصل الرابع مباشرة الشركة بالعمل		70%		25%	4%	5%	16عجلة اطفاء	450 عجلة	2022	2018	4	تأمين خدمة GPS والانترنت سنويا لعجلات الاطفاء		
المشروع مخطط وفق قرار مجلس الوزراء (١٤٦) وتمكن تنفيذ ٥٠٠,١٠٠,٠٠٠ ف عام ٢٠١٨ متمم قديم كائنات خلال عام ٢٠١٩ ممتدنا		3%		3%	0%	2%	72%	100%	2020	2010	مستمرة	انشاء مقر مديرية شرطة بابل	متوسط	إعادة تنظيم قوات الشرطة الاتحادية لتمكين الوزارة من استلام الملف الأمني، وبناء قدرات الشرطة المحلية في المحافظات
متوقف لعدم تأمين التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩		10%		10%	0%	6%	54%	100%	2020	2013	مستمرة	انشاء بناية مديرية حماية المنشآت الحيوية في كركوك		
المشروع مخطط وفق قرار مجلس الوزراء ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ ولم يتم استئناف العمل لعدم وجود تخصيصات مالية بالموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ وتوجد مستحقات مالية للشركة قدرها (٣٦٦,٠٧٨,١٢٦) دينار		14%		10%	0%	5%	21%	100%	2020	2009	مستمرة	بناء مجموعة مقرات مديرية الشرطة في كربلاء		

المشروع منجز ١٠٠% ونطلب حذفه من البرنامج					100%	100%	89%	100%	2016	2014	1	شراء الاجهزة اللاسلكية ذات المواصفات العسكرية نوع هارس
تم سحب العمل من الشركة المنفذة بموجب كتابهم (٢٥١٧٠) في ٢٠١٥/٦/٢ وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٤٣٢ لسنة ٢٠١٥ وحاليا منظر امام القضاء		0%	0%	0%	0%	0%	52%	100%	2016	2011	3	بناء مقر مديرية الشرطة في واسط
(٤) مدمر ١٠٠% (٣) منها منجز ١٠٠% و (١) منجز ٤٥% ... (الخامس) منجز ١٠٠% مع اضرار بسيطة ... (السادس) انجاز ٩٠% فيه اضرار جسيمة في الهيكل وداخل البناية وتدمير السياج الخارجي وملحقاتها ... (السابع) كان في مرحلة تسوية الموقع فقط ... هناك مستحقات مالية لبعض الشركات المنفذة علما انه لا يوجد تخصيصات مالية لعام ٢٠١٩		0%	0%	0%	0%	0%	90%	100%	2011	2010	2	انشاء مراكز شرطة عدد (٧) في نينوى
يتوقف نسب الانجاز على توفر الاعتماد المالي . علما ان البناية فيها اضرار جزئية يمكن اصلاحها		4%	4%	0%	2%	0%	90%	100%	2013	2013	1	انشاء بناية الادلة الجنائية في نينوى
البناية مدمرة بالكامل وهناك مستحقات مالية للشركة المنفذة		0%	0%	0%	0%	0%	59%	100%	2014	2012	2	انشاء موقف امربة انضباط مديرية شرطة نينوى / نينوى
نود اعلانكم بانتفاء الحاجة من المشروع كونه تعرض للتفجير واعتبر من المشاريع المدمرة وخاضع لقرار مجلس الوزراء ٣٤٧ وهو قيد اجراءات التسوية حيث لم يتم احتساب مستحقات الشركة المنفذة ومن المستحيل انجازه في العام الحالي وحاليا هناك مشروع انشاء مركز شرطة جديد بجانب المركز السابق طور الاعلان ممول من قبل صندوق اعمار المناطق المتضررة وعليه لا حاجة في الوقت الحالي لاكماله		0%	0%	0%	0%	0%	43%	100%	2011	2010	2	انشاء مركز شرطة الرشاد في كركوك
المشروع مسحوب منه العمل وفق قرار مجلس الوزراء ٤٣٢ لسنة ٢٠١٥ ولم يعلن عن المشروع لاكمال الاعمال المتبقية لعدم وجود تخصيصات مالية ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ وتوجد مستحقات مالية للشركة قدرها (٢٨,١٩٨,٩٨٧) دينار		14%	10%	0%	5%	0%	46%	100%	2013	2012	2	انشاء مركز شرطة البيداء ومكتب مكافحة الاجرام / كربلاء المقدسة
المشروع مسحوب منه العمل وفق قرار مجلس الوزراء ٤٣٢ لسنة ٢٠١٥ ولم يعلن عن المشروع لاكمال الاعمال المتبقية لعدم وجود تخصيصات مالية ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩ تم اجراء ذرعة واقع حال وبينت نسبة الانجاز ٧٤% وليس ٨٠% يرجى تصحيح النسبة الى ٧٤% وتوجد مستحقات مالية للشركة قدرها (١٤٤,٢٢٢,٨١٩) دينار		6%	6%	0%	4%	0%	80%	100%	2013	2012	2	انشاء مركز شرطة الوفاء ومكتب مكافحة الاجرام / كربلاء المقدسة

المشروع من ضمن المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين 1. وقد تعرض الى تفجير اراهابي وان المشروع مدمر بنسبة ١٠٠% ٢. مشمول بقرار مجلس الوزراء المرقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥. ٣. يطلب مستحقات مالية تبلغ ٣٤٨,٠٥٤,٨٧٣ مليون للاعمال المنجزة قبل التفجير. ٤. يطلب امانات ١٢٠,٨٠٥,٧٠٠ مليون عن سلف %سابقة. ٥. نسبة الانجاز المادي قبل التفجير كانت ٨٤ والآن بعد التدمير		0%		0%	0%	0%	86%	100%	2014	2012	3	انشاء مقر مديرية شرطة النجدة في صلاح الدين
المشروع من ضمن المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين 1. وقد تعرض الى تفجير اراهابي والآن المشروع مدمر بنسبة ١٠٠%. مشمول بقرار مجلس الوزراء المرقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥. ٢. ٣. يطلب مستحقات مالية تبلغ ٤٤٦,١٣٨,٧٥٥ مليون للاعمال المنجزة قبل التفجير. ٤. يطلب امانات ١٣,١٤٣,٥٠٠ مليون عن سلف سابقة. ٥. نسبة الانجاز المادي قبل التفجير كانت %والآن بعد التدمير 88%		0%		0%	0%	0%	88%	100%	2013	2012	2	انشاء مركز شرطة البو عجيل/ صلاح الدين
المشروع متوقف بسبب قرار (٣٧٤) لعدم وجود تخصيص مالي		7%		8%	0%	3%	52%	100%	2014	2011	3	انشاء معمل شامل لشرطة بابل
المشروع متوقف بسبب قرار (٣٧٤) لعدم وجود تخصيص مالي		4%		5%	0%	2%	84%	100%	2014	2012	2	انشاء حظائر الكلاب البوليسية لشرطة بابل / بابل
تم انتهاء العلاقة التعاقدية وفق قرار (٣٤٧) ولم يتم تخصيص اي مبالغ مالية لهذا العام		5%		5%	0%	3%	67%	100%	2015	2012	2	انشاء مجمع لدوائر شرطة النجف / النجف
متوقف بسبب تعرض المشروع الى اضرار نتيجة اعمال اراهابية		0%		0%	0%	0%	90%	100%	2012	2012	2	انشاء مركز شرطة الحصي/ الانبار
النسب جانبا تخص التدريب اما فيما يخص التجهيز بالاسلحة والاليات فهما ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية		10%		8%	7%	7%	60%	100%	2020	2019	سنة 2	ادخال وحدات وتشكيلات الشرطة الاتحادية دورات تطويرية لتعزيز قدراتهم على مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة داخل المدن وفي كافة المجالات والفنون القتالية وتجهيزهم بالاسلحة والاليات الحديثة ليكونوا اكثر جاهزية واستعداد لتسلم الملف الامني (الشرطة الاتحادية)

حصر السلاح بيد الدولة وإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع	متوسط	وضع وتنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة وإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع (جهد حكومي)	مستمرة	2019	2020	100%	0%							إشارة الى ماوردت في المحور الثاني البند (ج) الفقرة (١) من البرنامج الحكومي نود ان نبين اخر المستجدات بصدد الموضوع أ - تم مفاتحة مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بموجب كتاب وكالة الوزارة لشؤون الشرطة قسم الخطة الامنية ذي العدد ٥٤٢٤ في ١٩/٤/٢٠١٩ لغرض تحديد الاحتياجات والمعاضل والتوصيات من اجل وضع استراتيجية عمل تنسجم مع السياسة الوطنية لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة
تقليص السيطرة من شوارع المدن وتقويتها في مداخلها مع تفعيل أجهزة المراقبة الرقمية	متوسط	وضع وتنفيذ خطة لتقليص السيطرة من شوارع المدن وتقويتها في مداخلها مع تفعيل أجهزة المراقبة الرقمية. (جهد حكومي)	مستمرة	2019	2020	100%	0%							الموضوع من اختصاص قيادة العمليات في بغداد والمحافظات ويقتصر دور الوزارة في تنفيذ الخطة الموضوعية من تلك القيادات
تأمين مراكز المراقبة الفيديوية بكل محافظة وربط كاميرات المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة (جهد حكومي)	متوسط- طويل	وضع و تنفيذ خطة لتأمين مراكز المراقبة الفيديوية بكل محافظة وربط كاميرات المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة (جهد حكومي)	مستمرة	2019	2020	100%	0%	25%	20%	35%	40%			
تفعيل أنظمة المرور وإعادة فرضها	سريع	مشروع قانون المرور الجديد	1	2018	2019	100%	40%	100%	100%					تم قراءة القانون قراءه ثانية في مجلس النواب
فتح المنطقة الخضراء وإدماجها في حركة المرور تدريجيا	متوسط	وضع و تنفيذ خطة لفتح المنطقة الخضراء وإدماجها في حركة المرور تدريجيا (جهد حكومي)	مستمرة	2019	2020	100%	0%	50%	50%	30%	20%			تم فتح خمس طرق من اصل عشرة طرق 50%
التوسع في فتح المناطق المغلقة في المحافظات تدريجيا وعودة الحياة الطبيعية لها	متوسط	وضع و تنفيذ خطة للتوسع في فتح المناطق المغلقة في المحافظات تدريجيا وعودة الحياة الطبيعية لها. (جهد حكومي)	مستمرة	2019	2020	100%	0%							الموضوع من اختصاص قيادة العمليات في بغداد والمحافظات ويقتصر دور الوزارة في تنفيذ الخطة الموضوعية من تلك القيادات

وزارة الكهرباء

المحور الثالث : الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

الملاحظات	تشرين الأول - فء (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
		250	0	250	750	1000	2500	7417	2022	2019	4 سنوات	مشروع الاستثمار الخاص في قطاع الانتاج (IPP)	لم تحدد	العمل فوراً لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء خلال صيف ٢٠١٩ والدمج بين حلول كلية طويلة الأجل وحلول محلية قصيرة الأجل خصوصاً في المناطق الفقيرة والمحرومة
		30%		35%	35%	35%	0	1571	2021	2019	3	مشروع تاهيل محطات الانتاج المتوقفة والعامة التي تحتاج الى تاهيل	لم تحدد	البداية فوراً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق الأكثر محرومة وفقراً والاكثر نقصاً بالكهرباء، وذلك خارج الخطة الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة
		2		2	6	6	0	10	2019	2018	٦ اشهر	مشروع تنفيذ ارتباطات محطات التحويل في شبكات النقل قيد الانجاز والتي ستدخل العمل قبل صيف ٢٠١٩	لم تحدد	تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لزيادة طاقة الانتاج والنقل والتوزيع وفق أولويات وسباق متدرج ومتصاعد لتحقيق الاكتفاء خلال سنوات الخطة

											4	مشروع اكمال مشاريع انتاج الوزارة المتوقفة والمقترحة حسب خطة الوزارة (تتضمن وحدات بخارية وغازية)	سريع	متابعة العقود المعدة للتوقيع مع شركات عالمية لزيادة كفاءة وسعة الانتاج في الطاقة الكهربائية والاسراع بذلك ومراعاة الجانب التعاقدي لصالح العراق
تم اكمال وثائق المناقصة وتخصيص الاراضي وحصلت الموافقة النهائية على الوثائق وتم اعلان الفرصة الاستثمارية											3	مشروع الطاقات المتجددة		الاهتمام بالطاقة البديلة والتنظيفة لامتلاك العراق طاقات كبيرة في هذا المجال. وان يكون هذا الاهتمام من اولويات الجامعات والاكاديميات العلمية العراقية ووزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط وغيرها. وتشجيع اللجوء الى الغاز والطاقة البديلة والتنظيفة تماماً ايضا أمكن ذلك والسعي لإضافة (١٠٠) ميكا واط من الطاقة النظيفة (الشمسية وغيرها) في نهاية السنة الثانية من عمر الحكومة وبمعدل (٥٠٠) ميكا واط لكل سنة وتعتبر هذا مشروعاً ريادياً (pilot plant) ثم يصبح سياقاً متبعاً للسنين القادمة لوقف التلوث وللحاق بركب العالم ولتنفيذ اتفاقات المناخ
لم تحصل الموافقة على التنفيذ وذلك لعدم وجود تخصيص مالي وحسب كتاب وزارة التخطيط ٢٢٦٥٣ في ٣٠/٩/٢٠١٥											1	مشروع تصليب وحدات الطاقة الشمسية في ابنية الوزارة	سريع	
											4	مشروع تصليب وحدات الطاقة الشمسية في ابنية الوزارة		
وقعت شركة ABB مع وزارتنا عقود عدد (٦) لم تبشر الشركة بالتنفيذ لعدم امكانية تأمين تسديد الدفعة المقدمة ضمن موازنة عام ٢٠١٨ وتم تأمينها ضمن تخصيصات موازنة عام ٢٠١٩ وقيد اجراءات تسديدها من وزارة المالية											6 اشهر	مشروع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الطواريء لفك اختناقات قطاع النقل-تنفيذ مشاريع قرض شركة ABB السويدية		اكمال نواقص نقل القدرة الكهربائية بالتواكب مع

التطور الذي يحصل في منظومة الانتاج وذلك بإضافة خطوط نقل وخطوط احتياط لمنع انهيار الشبكة المفاجئ في المحافظات المختلفة	متوسط - طويل	مشروع تطوير وتوسيع شبكات النقل على المدين المتوسط والبعيد من خلال القروض المتمثلة بالاماني والياباني المرحلة الثانية والثالثة وقروض البنك الدولي وقرض (GE) لقطاع النقل + قرض (1 SIMENS + ٢)	4	2019	2022	محطة 39	5%	5%	5%	5%	قرض GE لقطاع النقل (قيد تنفيذ مشاريع المرحلة الاولى والتي تتضمن محطات عدد ٤ (١٣٢ ك.ف) وستباشر الشركة بمشاريع المرحلة الثانية) اما بالنسبة لقرض SIEMENS الاول (حصلت موافقة لجنة الطاقة على الاحالة وقيد اكمال اجراءات توقيع العقد) و قرض SIEMENS الثاني (قيد اجراءات الاحالة والتعاقد وتحليل العروض ولم يتم توقيع عقد تنفيذ المحطات لغايته) اما قرض JICA الثالث (قيد اجراءات الاحالة للشركة الاستشارية والتي بدورها ستقوم باعداد جداول الكميات لتنفيذ المحطات الثابتة اما المحطات المتنقلة فحصلت الموافقة على الاحالة وقيد اجراءات توقيع العقد) وتم انجاز كافة مشاريع المرحلة الاولى للبنك الدولي اما مشاريع المرحلة الثانية (قيد اعداد العطاءات واجراءات الاعلان والاحالة والتعاقد)
اعداد نظام عملي لتقليل الهدر الحاصل في نقل الطاقة الكهربائية على ان يبدأ التخفيض منذ السنة الاولى وهكذا لبقية السنين الأربع	سريع	مشروع وضع آلية لإدارة الطلب	4	2019	2022	30%	0%	4%	4%	2%	
على ان يبدأ التخفيض منذ السنة الاولى وهكذا لبقية السنين الأربع	سريع	مشروع وضع آلية للحد من التجاوز على الشبكة وتخفيض نسبة المتجاوزين بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية	4	2019	2022	5%	20%	19%	19%	18%	16%
تقليل مسافات محرمات نقل الطاقة لمسافات معقولة وذلك لزيادة المساحات الزراعية ولتنع حرمان المواطنين من استغلال اراضيهم بالشكل الامثل ويشمل المنشآت الزراعية والصناعية ومواقع الخزين التجاري وتعرض المحددات للدراسة	لم تحدد	تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارة مع وزارات الصحة والبيئة والزراعة وادارات المحافظات لدراسة امكانية تحديث المسافات المحددة للمحرمات بما يسمح تسهيل المرور الى الخطوط وصيانتها بالحد الادنى من المحرمات	1	2019	2019	100%	0%	20%	10%	40%	40%

اكمال نواقص شبكات التوزيع المنتشرة في المحافظات كافة.	لم تحدد	مشروع تنفيذ المشاريع المطلوبة لفك الاختناقات واستيعاب الطاقة التي سيتم تصريفها من خلال شبكات التوزيع وجزء من قرض + (Siemens 2) المرحلة الثانية - توزيع	4	2019	2022	20	16	46%	46%	24%	30%	نسبة الانجاز تمثل النسبة الكلية للمشاريع التي تم تنفيذها لغاية ٢٠١٩-٤- والتي يتم تنفيذها من قبل كل من شركة توزيع (بغداد -الجنوب والوسط) وضمن مبالغ خطة عام ٢٠١٨ كونه تم استلام تخصيصات العملة المحلية عام ٢٠١٩ خلال شهر نيسان ولم يتم تحديد اغلب التواريخ كون خارطة الطريق لم يتم توقيعها لغاية الان
اعتماد العدادات الذكية وغير البطاقات الالكترونية بما يسمح بالسيطرة على الجبايات وعدم التلاعب بالتوقيتات او مدد الفواتير، مما يضاعف احياناً من الاسعار. وكذلك تحميل المقتدريين والمغالين باستخدام الكهرباء بدفع كلف اعلى. وتقليلها عن ذوي الدخل المحدود او حتى منحها بشكل مجاني لمن هم تحت خط الفقر بحسب البيانات	سريع	مشروع اعتماد العدادات الذكية من خلال خارطة طريق (Simenes) على الامد الطويل	4	2019	2022	5250200	1380	١٠٢٠٠	١٠٠٠٦	10000	١٠٠٠٠	لم يتم تحديد اغلب التواريخ كون خارطة الطريق لم يتم توقيعها لغاية الان
		مشروع عقود الخدمة والجباية	5	2018	2022							ان العدادات المدرجة التي من المفترض نصبها ضمن عقود الخدمة والجباية تبلغ ٩٩٠٢٧٧ عداد. يتم نصب العدادات في محافظتي البصرة والمنتى وان المستهدف الحالي لكل فصل لا يمكن تحديده كون عقود الخدمة والجباية تم توقيعها بتاريخ مختلفة
		مشروع تجهيز عدادات ذكية من شركة (LSIS)	2	2018	2019							توجد توقفات وتمديدات بالمشروع
تخفيض اجور الكهرباء للاستخدام الصناعي والزراعي وربط هذا التخفيض بالزيادة الحقيقية للإنتاج، وذلك لدعم قطاعات الانتاج الحقيقية ولرفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية	سريع	تقديم مقترح لتعرفة جديدة بعد دراسة التعرفة الحالية وان تغطي التعرفة الجديدة نسبة ٧٠% من التكلفة الحقيقية.	سنة اشهر	2019	2019	70%		10%	10%	5%	5%	استناداً" للامر الوزاري المرقم ١٨٢١٥ في ٤/٤/٢٠١٩ تم طلب تشكيل لجنة فنية مختصة برئاسة السيد وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع تقوم بوضع خطط مفصلة لاحتساب كلف انتاج الطاقة وتقديم توصية بمقدار الدعم

وزارة المالية

المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤(٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
		0%		54%	16%	16%	30%	100%	2019	2018	1	التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك أولاً:خدمات استشارية لدراسة متطلبات واعداد وثيقة عطاء نظام IFMIS والتحليل الفني والمالي وصولاً الى الإحالة وتوقيع العقد مع مورد نظام IFMIS	سريع	اعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلاد وتحويلها من متوالية عددية الى ارقام تقابلها اهداف تنموية واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية والعمل ان تكون موازنة ٢٠٢٠ موازنة مشاريع واداء والسعي لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءاً من سنة ٢٠١٩
		20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	3	التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك ثانياً:تصميم وتجهيز وتنصيب وتشغيل نظام IFMIS		
		20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	3	التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك ثالثاً:خدمات استشارية للاشراف على تنفيذ نظام IFMIS		
قدم البنك الدولي لوزارة المالية مقترح لاعادة هيكلة مكونات المشروع ومناقشة امكانية تمديد فترة القرض خلال الاجتماع الربع سنوي في تشرين الثاني القادم .		20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	2	تطوير القدرات في مجال الإدارة المالية العامة		
		30%	0	0	0	0	0%	100%	2020	2019	2	تحديث التدقيق الداخلي لوزارة المالية		
قدم البنك الدولي لوزارة المالية مقترح لاعادة هيكلة مكونات المشروع ومناقشة امكانية حذف هذا المكون والموضوع مازال قيد المداولة والنقاش		20%	0	0	0	0	0%	100%	2021	2019	3	تحديث الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي (اللامركزي) في محافظتين بغداد وبابل		

إدارة المشروع وتنسيق الاصلاحات	5	2017	2021	100%	11%	5%	1.40%	15%		10%	اوصى البنك الدولي بالاعتماد على كوادر الوزارة المكلفة ضمن فريق المشروع واوصى بضرورة بناء قدراتهم بدلا من التعاقد مع استشاريين
النظام المصرفي الشامل - استخدام شركات استشارية لاعداد وثيقة العمل (RFP) واختيار افضل منها وحسب المعايير الفنية المعتمدة من قبل البنك المركزي	1	2019	2019	100%	0%	30%	20%	30%	0	40%	
اكمال وثيقة العمل (RFP) واعداد دراسة شاملة لعمل المصرف من قبل الشركة الاستشارية	1	2020	2020	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	يتم اعداد وثيقة طلب العطاء مع الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها
البدء بإنشاء البنية التحتية لكافة فروع المصرف مع الادارة العامة	2	2021	2022	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	يتم تنفيذ خطة لبناء البنية التحتية للمصرف العقاري بالتعاون مع الإدارة العامة عند المباشرة بالتعاقد مع الشركة الاستشارية
ربط كافة الفروع بخدمة القابلو الضوئي المجهزة من قبل وزارة الاتصالات بما يوفر وسط سري وامن في تناقل البيانات	2	2021	2022	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	يتم ربط فروع المصرف وفقا للخطة التي ستضعها الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها
النظام المصرفي الشامل	4	2017	2020	100%	40%	0	0	15%	0	15%	استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١٦ تم تنفيذ مشروع توطين رواتب موظفي المصرف والدوائر الحكومية ونسبة انجاز ١٠٠% - تنفيذ معايير الشمول المالي حيث باشر المصرف الصناعي بتنقيح معلومات الزبائن وادخالها ضمن نظام يمتلك جميع المعلومات اللازمة وفقا لمبدأ اعرف زبونك واعتماد استمارة (KYC) تطبيقا لنظام الامثال الضريبي - تم اعداد دليل الارشادات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المتضمن السياسات والاجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الاموال في المصرف الصناعي - تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للمصرف واستحداث DOMAIN خاص ضمن النطاق IQ وانشاء بريد الكتروني رسمي للادارة العامة والفروع تحت هذا النطاق - المباشرة بنصب منظومات كاميرات المراقبة في الادارة العامة والفروع بنسبة انجاز ٥٠% - نصب منظومة الحريق الالكترونية في مبنى الادارة العامة بنسبة انجاز ١٠٠%
اقتناء النظام الشامل ١- يتضمن العقد الاستشاري ، عقد الاقتناء للنظام	4	2018	2021	100%	25% من المشروع	40%	30%	10%		45%	النظام المصرفي الشامل عبارة عن مشروع والنسبة المتحققة هي نسبة وصول البرنامج حيث تم توقيع عقد مع شركة مدار الكون للاستشارات والتدريب اردنية الجنسية الشريك التقني لشركة تيمينوس سويسرية الجنسية

طويل

الانتقال الى
الحكومة
الالكترونية بشكل
كامل

				20%	17%	20%	3% من المشروع	100%	2022	2019	4	اقتناء النظام الشامل ٢- مركز البيانات ومركز التعافي من الكوارث		
		0	50%	0	20%	0	0%	100%	2020	2019	2	اقتناء النظام المصرفي الشامل اضافة الى العقد الاستشاري		
		0	15%	0	0%	3%	5%	0%	2025	2019	6	تحديث واتمة الكمارك قدر تعلق الامر بالهيئة العامة للكمارك كونها الجهة التنفيذية للقوانين والقرارات من الجهات التشريعية ومجلس الوزراء المؤقر فان المشروع اعلاه (تحديث واتمة الكمارك) يشمل في مراحله عدة اهداف تسهم في تعظيم الموارد الوطنية من ضمنها ١- تاهيل البنى التحتية اللازمة للمراكز الكمركية المختارة لزيادة كفاءتها وطاقاتها الاستيعابية . ٢- توفير اجهزة ومعدات الكشف الكمركي ٣- تحديث الاطار التنظيمي لتنسيب وتنسيق الاجراءات الكمركية والاجراءات الشكلية بما في ذلك تفعيل الحوسبة الكمركية . ٤- رفع المقدرة للموظفين وشريحة من المستوردين عن طريق انشاء اكااديمية الابداع الكمركي لتزويدهم بمعارف ومهارات جديدة	لم تحدد	الانتقال من فلسفة ان الاقتصاد هو مجرد تعظيم موارد الخزينة والحصول على القطع الاجنبي الى ان الاقتصاد هو اولاً تعظيم الموارد الوطنية والناتج الوطني الاجمالي وتعزيز دور العملة الوطنية ومخاربة البطالة والغلاء وانتشال الشعب من الفقر والجهل والمرض والخوف. فكم من ضريبة او مورد للخزينة هو ضرر على الاقتصاد الوطني. والعكس ليس صحيحاً اطلاقاً. فالأولوية للاقتصاد الوطني وتحسين شروط عيش المواطنين وعدم الاكتفاء بزيادة موارد الخزينة على حساب تراجع الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحقيقية
			15%		0%	3%	5%	0%	2023	2019	5	النظام الضريبي الالكتروني الشامل	متوسط -	اعتماد الجبائية الالكترونية للضرائب من خلال فرض نوافذ البيع الالكتروني لجميع المكلفين بدفع الضرائب واعتماد توصيف الضريبة العادلة "لا ضريبة

بلا خدمات". ودراسة امكانية تعاون شركات النقل في استيفاء الرسوم الجمركية تسهيلات للمعاملة في نقاط الحدود وتطويماً للفساد وتسريعاً للوّقت	لم تحدد	النظام الخاص بتشغيل المركبات مع دائرة المرور	4 اشهر	2019	2019	100%	0%	0	0	0	100%	
تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به، وتحويل المصارف الى وظائفها الاساسية وهي الاقراض من اجل التنمية بفوائد أو أرباح معقولة عن الفائدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي وحسب طبيعة المخاطر المتعلقة بكل عملية اقراض، واعتماد ان المصرف الذي لا يساهم في الاقراض بنسبة محددة من رأس ماله الاسمي او لا يقدم تسهيلات مصرفية تساعد في التنمية البشرية والاقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفاً محدداً ازاءه من البنك المركزي	متوسط	التسليفات الشخصية	4	2019	2025	100%	100%	15%	12%	15%	15%	تم منح السلف لموظفي دوائر الدولة للموطنة رواتبها لدى المصرف حيث تم منح سلف (١٠٠٠) مليون حسب راتب الموظف وبدون كفيل تم تحقيق ١٠٠% من السلف الشخصية حيث تم انجاز (٤٢١) معاملة
		التسهيلات المصرفية القطاع الخاص	4	2019		100%	100%	15%	15%	15%	4%	تسهيلات تمنح لزيائن المصرف المعروفين لمنح لهم تسهيلات مصرفية وحسب الموافقات الاصولية والصلاحيات
		اسكان منتسي المصرف ٢٥ سنة	4	2019		300	100%	26%	26%	0%	0%	تم منح قروض لكافة موظفي المصرف بواقع (١٠٠) مليون حسب راتب الموظف وتم توحيد الالتزامات لموظفي المصرف واعادة جدولتها بمدة جديدة (٢٥) سنة وفائدة ٣% وتم منح الفرق لكافة موظفي المصرف خلال المدة بالكامل)
		قروض اسكان دوائر الدولة (١٠٠) راتب	15	2019								
		قروض الدرجات الخاصة	5	2019		1000	100%					
		قروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة	10	2019		3000						
		اسكان مواطنين (٥٠) مليون	10	2019		1000	100%	10%	7%	5%	2%	تم منح القرض للمواطنين على ان يقدم رهن ارض بمساحة ٢٠٠م٢ ويتم المنح على ثلاثة مراحل حسب انجاز البناء حيث تم انجاز ٢٩ معاملة
		قروض مشروع بسماية	15	2019		5000	38%	20%	20%	20%	3%	يتم منح القرض بعد دفع مقدمة للشقة في مشروع بسماية وتوقيع عقد بين المصرف والمواطن وبذلك يتم تسديد المبلغ من قبل المصرف الى الهيئة العامة للاستثمار وتقسيمه على المواطن وفق فائدة ٤% حيث تم انجاز ٥١٤ معاملة
		سيارات الشركات	5	2019	2024	2000	63%	15%	12%	5%	5%	يتم منح قروض السيارات للمواطنين بعد تعاقد المصرف مع الشركات المستوردة للسيارات حيث منح قروض للمواطنين وفق فوائد ٦% ثابت حيث تم انجاز ٢٩ معاملة

قروض المشاريع الصغيرة بالدينار	3	2019	2022	5000	65%	0	0	14%	0	20%	0	يقوم المصرف بدفع قروض قصيرة الاجل للمواطنين للمشاريع الصغيرة بضمانات محددة وبصلاحيه مدراء الفروع من اجل زيادة فرص الاستثمار في العراق وتحقيق التنمية المستدامة وسيتم استحصال المتحقق منها لاحقا حيث تم انجاز ١٩ معاملة
قروض المشاريع الصغيرة بالدولار	3	2019	2022	500	17%							
قروض تجارية صلاحية الادارة العامة (١٥/٢٠٠) (٢٠٠ فما فوق)	4	2019	2023	100%	16%	20%	10%	20%	0	5%	0	قروض تجارية يتم منحها للمواطنين حسب المشروع المقدم من (٢٠١٥-٢٠٢٠) مليون بعد اعداد دراسة جدوى من قبل الاقسام المعنية (الائتمان - المخاطر) وتحديد الضمانات المقدمة في فتح الاسواق العراقية امام حركة التجارة والاستثمار حيث تم انجاز ٢ معاملة
قروض الاطباء والصيادلة	4	2019	2024	100%	33%	15%	0	15%	0	8%	0	يتم منح وفق التوطين الالكتروني قروض توازي الضمانات المقدمة من اجل مواكبة عجلة التطور التكنولوجي في تقديم خدماته المالية (لمدة ١٥ سنة بفائدة ٨%)
قروض تفجير حريق الكرازة والشورجة	4	2019	2024	100%	8%	25%	0	20%	0	4%	0	قروض تمنح للتجار المتضررين من حريق الشورجة وتفجير الكرازة لمدة من (٥-١٥) سنة بفائدة (٦-٨)% حيث تم انجاز ٣ معاملة
تمويل البحوث العلمية	4	2019	2021	100%	100%	5%	1	15%	0	10%	0	قروض تمنح لتمويل للباحثين (٥-١٠) مليون دينار لدعم شريحة الباحثين والدارسين (لمدة ٥ سنة بفائدة ٨%) حيث تم انجاز ١٠٩ معاملة
القروض التشغيلية (مدارس ورياض الاطفال والجامعات الاهلية)	4	2019	2024	100%	49%	8%	0	15%	0	15%	0	قروض تمنح لتمويل (مدارس - رياض اطفال - الجامعات) الاهلية من اجل دعم المشاريع الاستثمارية (لمدة ٥ سنة بفائدة ٨%)
القروض التشغيلية لاصحاب الفنادق	4	2019	2020	100%	7%	5%	0	20%	0	20%	0	قروض تمنح لتمويل تشغيل الفنادق من اجل دعم البنى التحتية في العراق (لمدة ٥ سنة بفائدة ٨%)
١-قروض اسكان (بناء وحدة سكنية + اضافة بناء + شراء وحدة سكنية	3	2019	2021	21000	0%	20%	0%	35%	0%	45%	0	
٢-قروض استثمارية تمويل مشاريع المجمعات السكنية	4	2019	2022	10 مستثمرين	0%	10%	5%	40%	0	50%	0	
٣-قروض سيارات	5	2019	2023	5000 مقرض	0%	20%	5%	40%	0	40%	0	
٤-قروض اسكانية بفائدة بفائدة ٦%	5	2019	2023	2500	0%	20%	5%	30%	0	50%	0	
منح القروض للمشاريع الصناعية والتجارية	4	2019	2022	5000 قرض	0%	9%	12%	8%	0%	8%	0	
اولا منح قروض ٥٠% من القطاع الحكومي	4	2019	2022	100%	37%	10%	0	20%		20%		

		20%		20%	19.30%	20%	18%	100%	2022	2019	4	ثانيا قروض المواطنين		
		25%		10%	8.80%	15%	16%	100%	2022	2019	4	ثالثا القروض الاستثمارية (التسهيلات)		
		20%		20%	0	10%	0%	100%	2022	2019	4	رابعا قروض المحافظات المتضررة		
		25%		20%	17.40%	15%	45%	100%	2022	2019	4	خامسا منح سلف ٥٠% لكافة فئات المجتمع		
		5%		10%	7.20%	10%	0%	100%	2022	2019	4	قرض المبادرة الزراعية		
		5%		10%	17.30%	10%	0%	100%	2022	2019	4	قرض البنك المركزي		
		5%		10%	2.10%	10%	0%	100%	2022	2019	4	قروض الموارد الذاتية - زراعية		
		5%		10%	1.40%	10%	0%	100%	2022	2019	4	قروض الموارد الذاتية _ تجارية		
		15%		10%	0	0	0%	100%	2022	2019	4	قروض الموارد الذاتية _سيارات زراعية		
		5%		10%	14.80%	10%	0%	100%	2022	2019	4	قروض الموارد الذاتية _ قروض سلف موظفين		
قام المصرف الصناعي باعداد الخطة الاستراتيجية حسب متطلبات البنك المركزي العراقي لمدة ٥ سنوات وتمت مصادقتها من قبل مجلس ادارة المصرف في ايار ٢٠١٨	0	0	0	0	100%	100%	97%	100%	2018 تشرين الثاني	2018 اب	3 اشهر	اعداد السياسات والخطة الاستراتيجية للمصرف لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات حسب متطلبات البنك المركزي العراقي بموجب العقد المبرم مع شركة القواسمي وشركاه (KPMG)	لم تحدد	المصارف عتلة التنمية والواسطة الاساسية لحشد رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية ليتسنى تمويل المشاريع في شتى المجالات. وان عملاً اساسياً يبقى مطلوباً للنهوض بالقطاع المصرفي بجناحيه العام والخاص. واهمية وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في دعم المصارف والرقي بمستوياتها لتستطيع القيام بدورها في التنمية والمساهمة
	0	30%	0	30%	0	0	40%	الحصول على الشهادة	2019	2017	3	التعاقد مع شركة مخصصة لتطبيق المعايير الدولية لادارة الجودة والحصول على شهادة (ISO) العالمية		
	0	33%	0	33%	34%	34%	فرعين	10 فروع	2021	2016	6	توسيع شبكة المصرف من خلال فتح فروع ومكاتب في بغداد والمحافظات		
		15%		15%	5%	10%	175 مليار	500 مليار	2019	2017	1	زيارة راسمال المصرف الصناعي		

وخدم اعتماد تي وجودها على عمليات مزاد العملة وصرفها. وما لم تنجز هذه المهمة فان الاختناق سيستمر كسمة اساسية للاقتصاد الوطني.		تعديل النظام الداخلي واستحداث اقسام وشعب جديدة في المصرف الصناعي	1	2016	2019	100%	95%	0	0	0	0	5%	0	
		هيكلية المصرف ويتضمن اولاً- الهيكلية المالية	4	2019	2022	100%	50% من المشروع	60%	51.20%	10%		15%		
		ثانياً - هيكلية الرقابة والمخاطر	4	2019	2022	100%	60% من المشروع	60%	61%	2%		8%		
		ثالثاً- هيكلية النظام الداخلي وبناء القدرات	4	2019	2022	100%	50 من المشروع %	55%	54.30%	5%		10%		
		رابعاً الهيكلية التشغيلية تطوير البنى التحتية	4	2019	2021	100%	50% من المشروع	15%	4.20%	10%		25%		
		هيكلية المصرف الزراعي التعاوني	3	2019	2021	100%	0%	0	0	0	0	40%		
السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية الى اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية. والسعي لسحب الاموال المجمدة حالياً خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة بتقديم الحوافز والضمانات لتحقيق هذا الغرض. والسعي لتحريك الاموال المجمدة في المصارف الحكومية والاهلية لغرض تنشيط شتى النشاطات الاقتصادية والاجتماعية	لم تحدد	نظام البطاقة الالكترونية (master card)	4	2017	2022	3003500	0%	34%	34%	33%	0	33%	0	اصدار بطاقات ماستر كارد لموظفي الدولة لصرف الرواتب والتسوق الالكتروني ((لغاية ٢٠١٩/٤/٣٠ كان (٥٢٢,٨٢٠) بطاقة)) عدد الدوائر المتعاقدة مع المصرف ٦٠٧ عقد ، استبدال الكي كارد بالماستر كارد وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي (١٧٥,٩٠٩) بطاقة
		اصدار بطاقة الماستر (النخيل)	4	2019	2022	100%	10% من المشروع	15%	5.40%	10%		25%		تم التعاقد مع شركة بوابة العراق (نخيل) لغرض اصدار بطاقة الماستر للموظفين والمتقاعدين ، علما ان عملية التوطين لموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين جارية الى انه تتخللها بعض الاجراءات التي تحتاج الى وقت . بخصوص عملية التوطين واصدار بطاقة الماستر كارد لازال العمل مستمر على اجراء العقود مع دوائر الدولة وقد بلغت الدوائر التي تم توطين رواتبها ٢٦٦ دائرة كما بلغ عدد البطاقات المصدرة (١١٧٥٠٤) بطاقة كما بلغ عدد الدوائر التي تم رفع رواتبها (١٧٥) دائرة . كما يعمل المصرف على توزيع الصرافات الالية في مختلف فروعنا علما انه تم فتح (١٦) مركز لاصدار بطاقة الماستر كارد للمتقاعدين كما بلغت عدد البطاقات المصدرة للمتقاعدين (٥٨٠٤٠) بطاقة كما بلغت عدد المنافذ (٧٠١) منفذ ، كما تم منح عدد من الدوائر سلف على بطاقة الماستر كارد بلغ عددها (١٦٨) من ضمنهم ٧ متقاعدين
تقييم كيفية تسديد مستحقات المقاولين خلال مدة ٣ أشهر للإيفاء بحقوق المواطنين، ولتنشيط	لم تحدد	مستحقات المقاولين الحصر الاول	3	2017	2019	100%	70%	8%	8%	10%	0%	12%	0%	تم تسديد مستحقات المقاولين لثمانية محافظات (الديوانية ،الانبار ، بغداد ، ميسان ، كربلاء ، بابل ، ذي قار ، صلاح الدين)، وشبكة الاعلام العراقي ووزارة الكهرباء بمبلغ قدره ٣٢٥,٧٠١ في شهر نيسان من عام ٢٠١٩ .

			0%	0%	0%	0%	40%	100%	2020	2018	2	مستحقات المقاولين الحصر الثاني قرار مجلس الوزراء ٢٦١ لسنة ٢٠١٨	م	القطاع الخاص وتشجيعه على انجاز الكثير من المشاريع المعجلة
	0%	10.80%	0%	10%	7.20%	8%	0%	100%	2020	2015	5	مشروع ممرات النقل	لم تحدد	مراقبة الدين الداخلي والخارجي والجبلولة دون تجاوزه مستويات معينة، وربط الديون الداخلية والخارجية بالمشاريع الاستثمارية والمولدة للقيم والثروات وعدم استخدامها للأغراض الاستهلاكية او للأغراض التشغيلية للموازنة اساساً
	0%	8.60%	0%	7%	7.40%	8%	0%	100%	2020	2015	5	مشروع عمليات التنمية الطاريء		
	0%	8%	0%	7%	0%	5%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع تجهيز المياه والصرف الصحي / بغداد		
	0%	10%	0%	8%	2%	5%	0%	100%	2023	2018	5	قرض صندوق التنمية الاجتماعي		
	0%	6%	0%	4%	0%	3%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع دعم الاستقرار والصمود		
	0%	6%	0%	4%	0.50%	2%	0%	100%	2023	2018	5	مشروع عمليات التنمية الاضافي /٢		
	0%	4%	0%	3%	3%	2%	0%	100%	2018	2008	10	مشروع تاهيل محطة المسيب الكهربائية		
	0%	1%	0%	1%	6%	4%	0%	100%	2021	2008	10	مشروع اعادة تاهيل معمل الاسمدة / خور الزبير		
	0%	2.80%	0%	2%	0.20%	1%	0%	100%	2021	2008	10	مشروع تسهيلات تصدير النفط الخام		
	0%	4%	0%	3%	9%	7%	0%	100%	2021	2008	10	مشروع تطوير ماء البصرة		
	0%	10%	0%	8.60%	8.40%	8%	0%	100%	2022	2012	10	مشروع محطة درلوك الكهربائية		
	0%	10%	0%	7.50%	2.50%	4%	0%	100%	2022	2012	10	مشروع اعادة اعمار قطاع الصحة		
	0%	70%	0%	3.80%	0.20%	10%	0%	100%	2022	2012	10	مشروع تحديث مصفى البصرة		
	0%	0%	0%	0%	10.50%	5%	0%	100%	2024	2014	10	مشروع تاهيل الموانئ / ٢		
	0%	0.60%	0%	0.50%	0.90%	0.50%	0%	100%	2020	2015	5	مشروع كهرباء الهارثة /١		
	0%	3%	0%	2.30%	0.70%	1%	0%	100%	2021	2015	6	مشروع اعمار الكهرباء /٢		
	0%	4%	0%	3%	0%	1%	0%	100%	2022	2017	5	مشروع اعمار الكهرباء /٣		
	0%	8%	0%	6.50%	4.50%	5%	0%	100%	2022	2017	5	مشروع كهرباء الهارثة /٢		
	0%	2%	0%	1%	3%	2%	0%	100%	2024	2018	6	مشروع ماء البصرة /٢		
	0%	3%	0%	2%	0%	1%	0%	100%	2025	2018	7	مشروع قطاع الري /٢		

وزارة التخطيط

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ٢٠١٩		تموز - ف٣ ٢٠١٩		نيسان - الفصل الثاني ٢٠١٩		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكل (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
تم اعداد دليل بأسس دراسة الجدوى وسيتم عرضه على خبراء استشاريين لتطوير		10%		20%	20%	20%	50%	100%	2020	2019	1	تحديث دليل أسس اعداد دراسات الجدوى	سريع	إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية التي تقدم من قبل الدوائر المختلفة للمشاريع المعدة ضمن الموازنة العامة للبلاد وجعلها دراسة حقيقية لا تخضع للمجاملة للأطراف السياسية والاجتماعية او لأهداف ليس لها علاقة بالتنمية الشاملة

اعداد استراتيجية شاملة التنمية الريفية للمحافظات التي تم انجاز المسح فيها	4	2019	2022	100%	0%	9%	2%	8%	8%	تم تشكيل فرق عمل لمتابعة اعداد استراتيجيات
بناء قاعدة بيانات مكانية لمواقع المباني لجميع القطاعات في المحافظات كافة واعداد الاطالس المكانية لها على مستوى الاقضية والنواحي	4	2018	2021	100%	25%	9%	5%	8%	8%	تم انجاز العمل في المحافظات وإصدار اطلس لبعضها ويتم حاليا رفع البيانات على منصة إعادة الاعمار في الوزارة
تحديث قاعدة بيانات مؤشرات التنمية المكانية في المحافظات على مستوى الاقضية والنواحي	مستمر	2014	2022	100%	0%	35%	35%	35%	30%	تم استلام مصفوفات مؤشرات التنمية المكانية للمحافظات ويعتمد عليها في بيان الرأي
بناء رؤية العراق (٢٠٣٠) للتنمية المستدامة وموائمتها مع الخطط الاستراتيجية الوطنية.	مستمر	2018	2022	100%	0%	35%	35%	35%	30%	رؤية العراق ٢٠٣٠ تمت المصادقة عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩
مشروع دعم تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية في العراق المنفذ بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة التنسيق بين المحافظات ووزارة التخطيط	2	2018	2019	100%	5%	17%	5%	17%	16%	تم عقد عدد من الورش والاجتماعات في المحافظات والعمل مستمر بالبرنامج
متابعة تشريع قانون التخطيط العمراني وتحديث قانون البلديات والاشغال العامة	5	2014	2019	100%	99%	35%	35%	35%	30%	تم اعداد المشروع وفي صدد مناقشته في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة
مشروع تحديد أراضي خارج التصميم الأساس لمراكز المحافظات لتكون مدن جديدة مع وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة لغرض توزيعها كأراضي سكنية للمواطنين	1	2018	2019	100%	2%	35%	35%	35%	30%	تم عقد عدة اجتماعات بعد تحديد موقع المدن الجديدة وتم المصادقة على الموقع المرشح في محافظة البصرة

متابعة واشراف وتمويل الأنشطة والمشاريع المنصوص عليها في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ٢٠١٨- ٢٠٢٢ (المتكونة من ٦ محصلات) المتكونة من ٣٢ نشاط	4	2018	2022	100%	20%	5%	3%	5%	5%	المتحقق ٣ هوه لغاية ٢٠١٩-٤-٣٠ مازالت الاحتساب لشهري أيار وحزيران ٢٠١٩ لم تدخل ضمن المتحقق..فترة التنفيذ ٥ سنوات (٢٠١٨-٢٠٢٢)
متابعة واشراف وتمويل وتنفيذ الأنشطة والمشاريع ضمن الموازنة الجارية في المحافظات المحررة والمحافظات التي تواجه أزمات طارئة	4	2018	2022	100%	20%	5%	2%	5%	5%	المتحقق ٢ هوه لغاية ٢٠١٩-٤-٣٠ مازالت الاحتساب لشهري أيار وحزيران ٢٠١٩ لم تدخل ضمن المتحقق..فترة التنفيذ ٥ سنوات (٢٠١٨-٢٠٢٢)
انشاء صندوق اجتماعي للتنمية	4	2018	2022	100%	0%	2%	2%	3%	3%	المستهدف ٧,٥ لعام ٢٠١٩ ونسبة ١٠% لعام ٢٠١٨ ... صادقت الحكومة العراقية وبناءاً على طلب من وزارة التخطيط وبالتعاون مع البنك الدولي على تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب القرار المرقم (٣٧٩) لسنة ٢٠١٧. ويهدف الصندوق الى الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجتمعات المحلية دعمها وتمكينها من تحسين الحالة المعيشية والوصول الى الخدمات
مشروع المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمراه في العراق	3	2018	2021	100%	30%	10%	10%	10%	5%	تحديد اهداف المسح واختيار العينة وتحديد عدد الباحثين الميدانيين وتسميتهم وتحديد اطار العمل الميداني تحديد المؤشرات الخاصة بالمسح ادراج جداول الإخراج
مشروع مسح الفتوة والشباب	2	2019	2020	100%	25%	15%	15%	5%	5%	تحديد اهداف المسح واختيار العينة اعداد استمارة المسح واعداد برنامج الادخال وتدريب الباحثين وتنفيذ المسح التجريبي
السعي الى ان تكون الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠ موازنة مشاريع واداء						10%	10%	10%	10%	تم التوصل الى التقرير النهائي لاعداد وثيقة المشروع للبرامج والأداء ..وتم التوصل الى الية العمل المقترحة وتتكون من ثلاث مراحل (المرحلة ١) تمتد الى عام ٢٠٢٢ ويتم اعتماد مشاريع وزارة النفط لتحويل الى برامج وأداء + تشكيل واحد من عدد الوزارات /كهرباء . صناعة ، بلديات ، صحة . المرحلة (٢) تمتد من ٢٠٢٣-٢٠٢٥ والمرحلة (٣) تمتد من ٢٠٢٦-٢٠٢٩ وزارة التخطيط تقوم باستحداث وحدة للموازنة البرامج والاداء واعادة تبويب المشاريع وفق البرامج والاداء
فحص وتقييم المشاريع التي تزيد كلفتها عن ١٢ مليار تريليونات الدنانير	4	2018	2022	5200 مشروع	800	0				تم انجاز التقرير عن الوضع وعرضه على هيئة المستشارين وبصدد طراسة ملاحظات الهيئة

حسم موضوع آلاف
المشاريع الاستثمارية
المعطلة والمنفذة جزئياً
والتي تتجاوز قيمتها
تريليونات الدنانير

<p>ان التعليمات الحالية مستوفية والوزارة بصدد دراستها مجدداً بما يتناسب مع جهود مكافحة الفساد</p>	500	500	313	313	1200	5600	2022	2019	4	<p>ان التعليمات التي تحكم سير عملية التجديد وتصنيف الشركات قد صدرت عام ٢٠١٥ وبالتحديد في ١٣/٧/٢٠١٥ وان جميع الاجراءات سلسلة وغير معقدة ولا توجد حاجة ملحة لغرض تعديلها سوى موضوع توفر شرط الاليات وعليه ترى وزارتنا بان التعليمات النافذة لا تحتاج الى تعديل في الوقت الحاضر</p>	سريع	<p>اعادة النظر بشروط احالة المفاولات واعتماد عوامل محددة غير قابلة للتأويل لغرض منع الفساد والاتفاق المسبق مع الفاسدين، وكذلك بتصنيف الشركات واعتماد معايير محددة تشمل كفاءة الشركة وملاءمتها المالية وخبراتها وتاريخها ومجالس ادارتها. وغير ذلك</p>	
<p>المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي</p> <p>ت- مكافحة الفساد والهدر العام</p>													
<p>الوزارة بصدد دراسة الأثر التشريعي للقوانين والتعليمات بما يساعد على تحسين كفاءة العمل الوظيفي وتم عقد ورش مع الوزارات والجهات المعنية</p>				8%	8%	0%	100%	2022	2018	4	<p>إصدار التشريعات الجديدة ومراجعة التشريعات النافذة وفق نظرية تحليل الأثر التشريعي والتي تترتب على إصدار التشريع</p>	متوسط	<p>وضع معايير، و/او تفعيل قوانين وانظمة عمل نافذة ، للوصول الى مواصفات ومقاييس واضحة لوصف جميع الوظائف والعقود والاعمال والخرائط والمخططات والانظمة والاجازات والاعمال والمنشآت والسياقات والمخالفات والتطبيقات وغيرها ، بما يتناسب مع المعايير المعمول بها في اغلب دول العالم. وعدم ترك الامور للاجتهادات او للفوضى والابتزاز والفساد ولتطبيقات بالية ومتخلفة لتنظيم الحياة العامة في كافة الشؤون والمصالح. وليتسنى للمواطنين والمصالح الخاصة والعامة حماية حقوقهم بعيداً عن التلاعب وعن المزاجية والرشاوى وتعسف المسؤول او المتحكم والمتسلط بعناوينه المختلفة</p>

وزارة التجارة

المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحدد ة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
					90%	90%	10%	100%	أذار ٢٠١٩	كانون الأول ٢٠١٨	أربعة أشهر	دراسة وضع البطاقة التمويلية ومفرداتها والشرائح الأساسية المستفيدة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع أي فساد أو هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مفرداتها	سريع	دراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح الأساسية المستفيدة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع أي فساد أو هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مفرداتها
عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية ولغاية تاريخ هذا التقرير		17%		5%	0	0		53%		2008	5	الاعمال الانشائية لمجرشتي الكوفة والشامية		
		5%		5%	0	0		90%		2012	1	انشاء بناية الرقابة التجارية والمالية في المثنى		
		10%		12%	0	0		34%		2012	3	انشاء مجمع مخزني في ديالى		
تم اثناء العقد بصورة رضائية حسب قرار ٣٤٧		0		0	0	0		62%		2009	3	انشاء مجمع مخزني في الديوانية		
عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية ولغاية تاريخ هذا التقرير		1%		1%	0	0		98%		2009	3	انشاء مجمع مخزني في ذي قار		
تم سحب العمل واحالة الموضوع للقضاء		0		0	0	0		25%		2007	3	انشاء بناية جديدة لمقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ساحة مظفر		
عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية		0		5%	0	0				2007	6	اعادة تاهيل سايلو الدورة		
		15%		5%	0	0				2013	2	انشاء سايلو معدني في محافظة كربلاء		

ولغاية تاريخ هذا التقرير		15%		5%	0	0				2013	2	انشاء سايلو معدني في محافظة ذي قار		
		5%		0	0	0				2011	6	استيراد ونصب معدات كهروميناكية في خان ضاري		
	تم فسخ العقد حسب قرار مجلس الوزراء ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥	0%		0	0	0				1998	7	الطاقة الخزنية الاضافية		
	عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية ولغاية تاريخ هذا التقرير	10%		5%	0	0				2010	6	اعادة تأهيل السايلاوات ذات الطاقات الخزنية العالية		
	تم ادراجه ضمن موازنة ٢٠١٩ من القرض الايطالي ولم تتم المباشرة به لحد الان وبانتظار موافقة الجهة المانحة لغرض التمويل				0	0					4	انشاء سايلو كونكريتي في محافظة واسط		
	عدم اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية ولغاية تاريخ هذا التقرير	15%		5%	0	0					مستمر	توسيع طاقات للمطاحن الحديثة		
								هيئة مجلس الوزراء + الأمانة العامة لمجلس الوزراء	تيسان ٢٠١٩	تشريع الأول ٢٠١٨	اشهر 6	تسهيل اجراءات منح إجازات تأسيس الشركات بأشكالها المختلفة، مع استثناء ما يستوجب موافقات خاصة، وعرض الشروط المطلوبة لتأسيس المشاريع ليقوم صاحب المشروع بتوفيرها ولتصحيح الاجازة مُقرة من حيث الاساس ان توفرت هذه الشروط، وتكون منح اجازات الاستيراد والتصدير لتصنيف واحد من السلع والغاء التكرار والاكثر من التعقيد في تعريف الاجازات لتقليل الهدر في الزمن وحماية التجار العراقيين من الفساد والبيروقراطية. مع مراعاة منع ازدواج الرسوم على التجار لغرض الابتزاز. والحرص على التكامل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفحص وتدقيق الرسوم التي تفرض على التجار واصحاب المهن الكبار والصغار من قبل الغرف التجارية.	لم تحدد - سارع	
	لعدم توفير تخصيص مالي وبجهود ذاتية تم استلام اجهزة ارشفة من الدائرة الادارية والمالية وهي غير كافية للكم الهائل من الاضايير والتي تتطلب اجهزة ارشفة حديثة وسريعة مع كادر مؤهل وكافي لغرض المباشرة بالعمل	25%		25%	20%	25%	0%	100%	2019	من تاريخ منح التخصص	1	اعتماد الارشفة الالكترونية		

					10%	10%	90%	100%	2019	2016	ستة اشهر	منظومة الكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط بكل الاقسام (الرقابة ، التدقيق المالي ، الحاسبة)	سريع	فتح نافذة الكترونية تخاطب الشركات المنتجة التي يتم الاستيراد منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ ومواصفات البضاعة وتقرير فحصها في بلد المنشأ ويمكن لوزارة التجارة ان تأخذ عينة من اي بضاعة مشكوك بها وفحصها من قبل شركة فاحصة داخل العراق على ان لا يتم حجز البضاعة وتلفها في المخازن عند المنافذ الحدودية
يتم المباشرة به اعتبارا من شهر ايلول ٢٠١٩		10%		0%		0%	0%	100%	2020	2019	1	منظومة الكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد تربط بكل الاقسام (الرقابة ، التدقيق المالي ، الحاسبة) وكذلك المنافذ الحدودية ، الوزارات ذات العلاقة بالمواد المصدرة اضافة الى الجهات الامنية لغرض الحصول على الموافقات الكترونياً		
عدم توفير التخصيص المالي تم ايجاد حل بديل بالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية مع دائرة تطوير القطاع الخاص لاعداد تصميم الموقع الالكتروني وتم توقيع العقد مع الشركة المصممة للموقع للمباشرة بالعمل .				25%	75%	75%	0%	100%	2022	2019	4	تفعيل عمل نقطة تجارة الدولية في دائرة تطوير القطاع الخاص		

وزارة التربية

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات التالية : - اعادة طبع (١٩٢) عنوان. - تأليف جديد (٤) عناوين . - تأليف جديد (٣) دليل. - تأليف جديد (١) نشاط .					8%	50%	0%	١٠٠% ج	2022	2019	4	الاستمرار في مشروع تطوير وطبع المناهج العراقية لمواكبة التطور المعرفي وفي مجال طرائق التدريس وعلم النفس التربوي وتضمينها بما يتوافق متطلبات التنمية المستدامة	لم تحدد	الاستمرار بتطوير المناهج بما يسهم في بناء جيل متعلم، رفيع المستوى خلقياً واجتماعياً وعلمياً ومعرفياً، محباً للآخرين ونايذاً للعنف والتطرف والعنصرية. وادخال الحاسوب والبرامج المتطورة للرفي بمستوى التربية والتعليم
تم تحديد المداس الاعدادية والصفوف المستهدفة وتحديد الكلفة المطلوبة ل (٥٠٠) مدرسة سنوياً					10%	250 مدرسة	3000	5000	2022	2012	4	ادخال الحوسبة في الصفوف الدراسية لعدد (٥٠٠٠) مدرسة		

القيام بدورات التطوير ضمن مفهوم التعليم المستمر للهيئات التعليمية اثناء فترة العطلة الصيفية لكي يتم رفدهم وتطويرهم ضمن مفاهيم حديثة لنواكب حركة التقدم العالمي	متوسط	تأهيل وتدريب	4	2019	2022	6000 على البنك الدولي	-	متدرب (1500)	0%					في طور التنفيذ وهو يستهدف تدريب (٦٠٠٠) معلم ومشرف تربوي و (٩٠) قائد مرجعي
تستمر وزارة التربية بإنجاز المدارس بمعدلات يشترك فيها القطاع العام والخاص للانتهاء من ازمة المدارس خصوصاً فيما يخص تراحم أكثر من مدرسة في بناية واحدة او الاعداد الكبيرة في الصف الواحد او توفير كافة المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في كافة مراحلها خلال فترة السنوات الاربع القادمة	لم تحدد	بناء (٣٠٠٠) مدرسة جديدة لمختلف المراحل الدراسية لتقليل الازدواج والكثافة الطلابية في الصف الواحد	4	2019	2022	بنائة مدرسية 3000	0	مدرسة 375	0%					تم اتخاذ كافة الاجراءات الاصولية من مخططات ومعايير ومواصفات وهيئة (١٦١٥) قطعة ارض وسيتم تزويدنا لاحقاً بالمتطلبات الاخرى علماً ان الفقرة غير مغطاة مالياً والاجراء يتخذ من قبل مكتب رئيس الوزراء
		تاهيل وترميم ٢٠٠٠ بناية مدرسية بمختلف المراحل	4	2019	2022	بنائة مدرسية ٢٠٠٠	0	مدرسة 250	0%					تم تحديد المدارس التي بحاجة الى مجاميع صحية والفقرات التي تشكل خطورة على حياة التلاميذ والطلاب علماً ان الفقرة غير مغطاة مالياً
		مشروع الوزارة رقم (١) المشروع بأكمال ١٦٢٦ بناية	2	2019	2020	بنائة 600	0	بنائة 175	0%					يوجد (١٦٢٦) مشوع متلكي وقد صدر الامر الديواني (٤) لسنة ٢٠١٩ الذي يؤيد استكمال (٣١٨) مدرسة من قبل اربع شركات علماً ان التخصيصات ٥٠% من المبلغ المطلوب وبانتظار المصادقة من قبل رئيس الوزراء لغرض استئناف العمل
		بناء مدارس ابتدائية بأسلوب سريع (بناء جاهز) عدد (١٠٠) مدرسة في بغداد	2	2019	2020	بنائة 100	0	100%	74%					
		بناء مدارس ابتدائية بأسلوب سريع (بناء جاهز) عدد (١٠٠) مدرسة في المحافظات عدا بغداد	2	2019	2020	بنائة 100	0	100%	74%					
		القرض الكويتي	4	2019	2022	مدرسة 73	-	مدرسة 11	0%					تم اكمال كافة المتطلبات اللازمة لبناء (٧٣) مدرسة
		قرض البنك الدولي	1	2019	2020	مدرسة 26		مدرسة 26	0%					في طور تهيئة المتطلبات لبناء (٢٦) مدرسة

وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
		8		6	6	6	10	جامعة حكومية واهلية ١٠٠	2022	2018	5	التصنيف والاعتماد الأكاديمي	لم تحدد	اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف وكمؤشر لجودة التعليم العالي في العراق ويجب ان يقدم كل رئيس جامعة جدولاً زمنياً محدداً لدخول جامعته في أحد التصنيفات المهمة العالمية
		10		5	5	5	24	جامعة حكومية ٣٥	2022	2017	6	مشروع التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية		
		5		5	15	15	0	100%	2022	2019	4	دعم الابداع والابتكار		
عدم ورود التمويل		7		5	0	4	0	38	2022	2019	4	استكمال البنى التحتية والمباني		
		10		10	5	5	0	٤٠ طالب	2022	2019	4	مذكرة تفاهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي السعودي	لم تحدد	اعتماد توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية المهمة من خلال الدراسة والتدريب المشتركين وتبادل وسائل الاختبار ومخرجات البحث العلمي المشترك وغير ذلك من الأمور الجوهرية
		15		10	5	5	0	٣٠ طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم الرومانية		
		10		10	5	5	0	١٤٠٠ طالب	2022	2019	4	مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني وزارة العلوم والأبحاث التقنية		
		10		10	5	5	0	٨٠ طالب	2022	2019	4	مذكرة تفاهم مع بولندا		
		15		10	5	5	0	١٥ طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي السوداني		
		15		10	5	5	0	٣٠ طالب	2021	2019	3	اتفاقية تعاون مع الجانب القطري		
		0		0	0	0	0	٧٥ طالب	2022	2020	3	تفعيل الاتفاقية مع منظمة الدااد DAAD		
		15		10	5	5	0	٢١٠ طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع هنكاري		
		0		0	0	0	0	٧٥ طالب	2022	2020	3	اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمريكي		

		15		10	5	5	0	١٣ طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع جامعة سوينبيرن الأسترالية	متوسط	تقدم الوزارة خططها لخفض الترهل واشاعة الاجواء الاكاديمية والابحاث والحياة الجامعية ورفع المستويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدولة او الشركات لإنجاز اعمال
		15		10	5	5	0	٣٠ طالب	2021	2019	3	مذكرة تفاهم مع جنوب افريقيا		
عدم ورود التمويل		30		15	0	15	0	٣ مشاريع	2020	2019	2	اتفاقية البنك الاسلامي للتنمية		
		0		0	0	0	0	٣٠ طالب	2022	2020	3	مشروع اتفاقية تعاون بين العراق والبرازيل		
		15		10	5	5	0	٦٣ طالب	2021	2019	3	اتفاقية كامبوس فرانس بين وزارتنا والسفارة الفرنسية في بغداد		
		10		10	5	5	0	٤٠ طالب	2022	2019	4	البرنامج التنفيذي مع ارمينيا		
		15		10	5	5	0	٣٠ طالب	2021	2019	3	البرنامج التنفيذي مع وزارة التعليم العالي المصري		
		15		10	5	5	0	٣٤٥ طالب	2021	2019	3	برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم الروسي		
		10		10	5	5	0	٤٨٠ طالب	2022	2019	4	برنامج تنفيذي مع الاردن		
		15		10	5	5	0	٣٠ طالب	2021	2019	3	برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم العالي اللبنانية		
		15		10	5	5	0	٤٨ طالب	2021	2019	3	برنامج الزمالات الروسية والصينية		
		15		10	5	5	0	٣٠ طالب	2021	2019	3	برنامج التنفيذي بين وزارتنا ونظيرتها السورية		
		2		2	1	1	70%	١٠٠%	2022	2016	8	استراتيجية التدريب والتعليم الفني والتقني		
		0		0	0	0	0%	١٠٠%	2022	2019	3	توأمة الدراسات العليا		
		10		10	3.4	5	0%	١٠٠%	2022	2019	4	تفعيل كرسي اليونيسكو في جامعة الكوفة		
		10		10	4.1	5	30	١٧٠	2022	2019	4	اعتماد وتسويق البحوث التطبيقية		
		4		3	0.1	3	0%	١٠٠%	2022	2019	4	مشروع تفعيل البحوث العلمية التطبيقية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.		
		4		3	3	3	0%	١٠٠%	2022	2019	4	دراسات وبحوث للنهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية		
		4		3	3	3	0%	١٠٠%	2022	2019	4	تبني بحوث تطبيقية توفر البنى التحتية الضرورية		
		10		10	3	5	0%	١٠٠%	2022	2019	4	بحوث تطبيقية لتوفير بيئة صحية نظيفة		

		5		5	3	3	1%	%١٠٠	2022	2017	6	تطوير وتحديث المناهج في الدراسات الاولية والعليا وتوأمتهما مع نظيراتها في دول الجوار والعالم
		10		10	5	5	0%	%١٠٠	2020	2019	2	استحداث مركز بحثي للدراسات السكانية
		10		5	5	5	0	٣٥	2022	2019	4	إعتماد نظام المقررات
		10		10	10	10	0	١٣	2021	2019	4	القبول المركزي وقنواته
		7		5	3	5	100%	%١٠٠	2022	2018	5	المكتبة الافتراضية.
		50		40	7.1	10	0%	%٣٨٠٠	2019	2019	1	اختزال دورة العمل باعتماد النظام الالكتروني تدريجياً بدلاً من العمل الورقي
		10		10	3	5	0%	%١٠٠	2022	2019	4	ربط المكتبة الافتراضية العربية بالعراقية
		4		3	3	3	0%	%١٠٠	2022	2019	4	بناء قاعدة بيانات للكتب المؤلفة والمترجمة والمعدة من قبل الجامعات.
		10		5	5	5	0%	%١٠٠	2022	2019	4	النشر الالكتروني
		6		6	3	3	0%	%١٠٠	2022	2017	6	نظام المستودع الرقمي
		10		5	5	5	100	١٠٠ جامعة حكومية واهلية/سنوي أ	2022	2017	6	تصميم وتنفيذ وادارة البوابة الالكترونية لجهاز الاشراف والتقويم العلمي ونشرها على الشبكة العنكبوتية الدولية (الانترنت).
عدم ورود التمويل		5		3	0	2	0%	%٣٨٠٠	2022	2019	4	الحكومة الالكترونية
		20		15	5	15	15%	%١٠٠	2021	2018	3	النظام الاحصائي لمعلومات التعليم العالي
		5		5	8.4	15	0	١٢٣٦٢	2022	2019	4	تطوير منتسبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
		40		30	30	30	38	٣٨	2019	2019	1	الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي
		6		6	3	3	2	٣٥	2022	2017	4	استقلالية الجامعات
		10		5	4	5	0	٢٠٠٠	2022	2019	4	مركز تطوير القدرات الجامعية
		25		20	15	15	5	٣٥	2020	2017	6	شعب التوظيف والتأهيل والمتابعة في الجامعات
		5		5	5	5	0	١٤٠٠	2022	2019	5	برامج الإبتعاث للتخصصات النادرة والمهمة

		10		10	5	5	200	٤٠٠٠	2022	2018	5	مشروع المعلم المتميز والكوادر الوسطية المتميزة
		10		10	5	5	0%	%١٠٠	2022	2019	3	متابعة اصدار التعليمات الخاصة بالحاضنات التكنولوجية
		10		10	5	5	0%	%١٠٠	2022	2019	3	تعليمات استخدام البرامج الالكترونية
		20		15	15	15	5%	%١٠٠	2020	2019	1	متابعة تشريع مشروع قانون وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع مجلس الدولة
		20		15	5	15	0%	%١٠٠	2020	2019	1	تعديل تعليمات التأليف وترجمة الكتب المنهجية
		40		35	25	25	0%	%١٠٠	2019	2019	1	تعديل ضوابط اصدار المجلات
		10		10	5	5	0%	%١٠٠	2022	2019	4	تعديل تشريعات المكتبات الجامعية
		20		15	5	15	5%	%١٠٠	2020	2019	2	اسس معادلة الشهادات
		20		15	15	15	15%	%١٠٠	2020	2019	2	تعليمات تعيين الأوائل
		40		35	25	25	80%	%١٠٠	2019	2019	1	تعليمات الدراسات العليا
		30		25	20	20	40%	%١٠٠	2020	2019	2	مشروع تعديل قانون المكاتب الاستشارية
		20		15	15	15	17%	%١٠٠	2020	2019	2	مشروع قانون اتحاد الطلبة
		20		15	12.5	15	10%	%١٠٠	2020	2019	2	تعديل قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية
		40		35	15	25	80%	%١٠٠	2019	2019	1	تعليمات اسكان الطلبة
		20		15	15	15	5%	%١٠٠	2020	2019	2	مشروع امتيازات الطلبة المتعثرين
		40		35	25	25	80%	%١٠٠	2019	2019	1	قانون المعهد الحضري والإقليمي
		40		35	25	25	10%	%١٠٠	2019	2019	1	نظام صندوق تقاعد التدريسين العاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية
		40		35	25	25	40%	%١٠٠	2019	2018	2	مشروع التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العالي
تم تشكيل اللجنة		10		5	0	5	20%	%٨٠	2022	2018	5	تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة

		10		5	5	5	0%	%١٠٠	2022	2019	4	تقييم مسارات الجامعات الأهلية	متوسط	التشجيع على تأسيس الجامعات الأهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات الحالية تحت الاختبار سواء لرفع المستوى او لإلغاء اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية
		0		0	0	0	0%	%١٠٠	2022	2020	3	نظام الابتعاث في الجامعات والكليات الأهلية		
		10		5	5	5	29%	%٣٥	2022	2018	5	برنامج القبول المركزي لطلبة الجامعات الأهلية		
		10		5	5	5	0%	%١٠٠	2022	2019	4	التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية		
		10		5	5	5	0%	%١٠٠	2022	2019	4	نظام تسجيل حضور الطلبة الالكتروني في الجامعات الأهلية		
		20		20	10	10	5%	%١٠٠	2020	2019	2	وضع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التعليم العالي الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦		
		20		20	10	10	5%	%١٠٠	2020	2019	2	مشروع تعديل قانون التعليم العالي الاهلي		
		20		20	10	10	5%	%١٠٠	2020	2019	2	مشروع قانون التعليم الموازي		
		10		5	5	5	0	٣٨	2022	2019	4	الاستثمار والشراكة في التعليم العالي	سريع	تشجيع الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والاكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي والاجنبي او الجامعات الاجنبية بحيث تصبح للكلية او الجامعة الحكومية نظيراً مساعداً لتحسين الوضع التعليمي وتوفير النفقات من خارج موازنة الدولة.
		10		5	5	5	0	١٤	2022	2019	4	تعزيز الشراكة من خلال برامج المكاتب الاستشارية		
		/		/	100	100	40%	%١٠٠	2019	2018	2	تعظيم الموارد المالية في التعليم العالي		

وزارة العدل

المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلّي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
<p>انشاء (٤) مجمعات للدوائر العدلية وكما يلي</p> <p>* مشروع الديوانية / (البوصالح) ٨٣%</p> <p>* مشروع واسط / (النعمانية) ٩٢%</p> <p>* مشروع النجف / (الكوفة) ٨٥%</p> <p>* مشروع الديوانية / (الحمزة) ٨٧%</p>		2 مستمر		1 مستمر	صفر	1	6 مستمر	6	3		3	انشاء مجمعات عدلية ذات مواصفات عالية يمكن من خلالها تطبيق مكننة دوائر التسجيل العقاري	متوسط	ربط جميع دوائر التسجيل العقاري بشبكة الانترنت والوزارة ومكتب الوزير شخصياً والمفتش العام لتسهيل إجراءات تسجيل عقارات المواطنين واعتبار التعطيل المقصود فساداً يعرض مرتكبه الى المحاسبة القانونية
<p>المستهدف الكلّي لعام ٢٠١٩ هو انجاز سجن عدد (٢)</p>					2	2	3 سجن مستمر	3 سجون	2022 مستمر	2012	4	بناء وتطوير التسفيرات والسجون وفق المعايير الدولية	متوسط	اصلاح نظام السجون العراقية وفق اعلى المعايير في مجال الاصلاح الحقيقي وتدريب السجناء وتأهيلهم للعودة للمجتمع واندماجهم الصالح فيه
<p>ان المستهدف الكلّي لعام ٢٠١٩ هو (٥)</p>		1		1	3	3	بنسبة أنجاز ٢٠%	20	2022	2018	5	تحسين الواقع الصحي والدعم النفسي للنزلاء من خلال انشاء عيادات نموذجية للاقسام الاصلاحية (السجون)		
<p>ان المستهدف الكلّي لعام ٢٠١٩ هو بنسبة انجاز ٢٠%</p>		5%		5%	10%	10%	بنسبة أنجاز ١٠%	النزلاء المدانين بالمواد القانونية الخاصة بالمخدرات والقوى الاجرائية	2022	2018	5	تشكيل وحدة للدعم النفسي تعمل على أعداد دورات وبرامج تأهيلية ونفسية للنزلاء والقوى الإجرائية		

أعداد وتنفيذ مشاريع وورش عمل لتشغيل النزلاء	5	2018	2022 مستمر	اقسام إصلاحية ٩	0	1	1	1	1	ان المستهدف الكلي لعام ٢٠١٩ هو (٣)
برامج تربوية (محاضرات ثقافية ودينية) للاحداث	5	2018	2022 مستمر	784	1118 حدث	98	98	49	49	ان المستهدف الكلي لعام ٢٠١٩ هو (١٩٦)
تدريب العاملين في البحث الاجتماعي على كيفية التعامل مع الحدث وفق مبادئ حقوق الانسان وحقوق الطفل	5	2018	2022 مستمر	59 باحث اجتماعي	59 باحث	7	7	4	3	ان المستهدف الكلي لعام ٢٠١٩ هو (١٤)
تدريب الاحداث من خلال أشرلاكهم بدورات مهنية في (النجارة، الحدادة ، الحاسبات، الاعمال اليديوية، خياطة)	4	2019	2022	1118 حدث	1118 حدث	138	138	69	69	ان المستهدف الكلي لعام ٢٠١٩ هو (٢٧٦)
القاء محاضرات نفسية وأجتماعية على الاحداث	4	2019	2022	1118 حدث	1118 حدث	138	138	69	69	ان المستهدف الكلي لعام ٢٠١٩ هو (٢٧٦)
تدريب المأمورين وضباط الخفر والحراس على مبادئ حقوق الانسان وحقوق الطفل	4	2019	2022	200	200 حارس	24	24	12	12	ان المستهدف الكلي لعام ٢٠١٩ هو (٤٨)

وزارة الصحة والبيئة

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
تم تنفيذ زيارة الى محافظة النجف الاشراف لتقييم المؤسسات الصحية وبفريق وزاري ضمن خطة التقييم المركزي للمؤسسات الصحية وللفترة من ٢١/٣/٢٠١٩-١٦ حيث تم تقييم اربع مستشفيات وهي (م. الحكيم العام ، م. مدينة الصدر الطبية ، م. الفرات الأوسط ، م. المناذرة العام) وتقييم خمسة مراكز صحية وهي (م.ص. العباسية / قطاع العباسية ، م.ص. الاطباء / قطاع الشمالي ، م.ص. المعلمين / قطاع الجنوبي ، م.ص. الحيرة / قطاع المناذرة ، م.ص. ميسان الجديد / قطاع الكوفة سيتم رفع تقرير بنتائج التقييم الى السيد الوكيل الاداري ومعالى وزير الصحة تم تنفيذ زيارة الى دائرة صحة ذي قار لتقييم المؤسسات الصحية للفترة من ٢٧/٤ الى ٢/٥/٢٠١٩ حيث تم تقييم ثلاثة مستشفيات (مستشفى الحيوي التعليمي ، مستشفى الامام الحسين (ع) التعليمي ، مستشفى الشرطة العام) وتقييم خمسة مراكز صحية (مركز صحي الغدير ، الامام المهدي ، الرسول ، القدس ، الغراف) سيتم رفع تقرير بنتائج التقييم للمؤسسات الى معالي الوزير والسيد الوكيل الاداري (علما ان هذه عينة من الزيارات)					100%	100%		100%	2019	2019	ستة أشهر	التقييم الشامل لكل المؤسسات الصحية وفق المعايير الخاصة بالجودة والمعتمدة في وزارة الصحة		المباشرة فوراً بتقييم الوضع الصحي والامن الصحي في العراق ودراسة الفجوات الراهنة والتحديات التي تواجه النظام الصحي بالاستناد الى أفضل البيانات المتاحة ووضع صيغة متقدمة
وضع خطة تنفيذ لتدريب الملاكات العاملة في الجودة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ودوائر مركز الوزارة حصلت موافقة السيد الوكيل الاداري على جدول الكلفة التخمينية لكافة نشاطات قسم ادارة الجودة ضمن البرنامج الحكومي تم تنفيذ الدورة التدريبية عن مفاهيم الجودة للملاكات العاملة في شعب ادارة الجودة في دوائر الصحة ودوائر مركز الوزارة					100%	100%		100%	2019	2019	ستة أشهر	تطوير المهارات الادارية والفنية للملاكات العاملة في الجودة وبعده (٥٠) متدرب		
تم اقرار التسعيرة الجديدة من قبل اللجنة الخاصة لدراسة واقع التمويل الصحي وتم الاعمام الى دوائرها الصحية للعمل بموجب الاجور الجديدة					100%	100%		100%	2019	2019	ستة أشهر	اعادة النظر بنظام التمويل الصحي بما يلائم حاجة المؤسسات الصحية ومراعاة تخفيف العبء على المواطن		
					100%	100%	دوائر 9 محدثة	100%	2019	مستمر	ستة أشهر	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لدوائر مركز الوزارة بواقع ٣ دوائر لعام ٢٠١٩		

<p>للسياسة الصحية واعتماد سياسات تمويل صحي منصفة وخطة عمل متكاملة للوصول الى تغطية صحية شاملة وخدمات عادلة لكل المواطنين بغض النظر عن امكاناتهم المادية</p>	<p>سرعة</p>	مراجعة فتح فيث الهيكل التنظيمي لمستشفيات (الاطفال) و(النسائية والتوليد) و (النسائية والاطفال) ضمن الفئات A,B,C,D بواقع (٢) مستشفى لعام ٢٠١٩ نسائية اطفال ونسائية وتوليد	ستة أشهر	مستمر	2019	100%	تم تحديث الهيكل التنظيمي لمستشفيات الاطفال وبواقع (٤) مستشفيات	100%				تم تحديث الهيكل التنظيمي لمستشفيات (الاطفال ، النسائية وتوليد، اطفال ونسائية وتوليد)
		مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لمراكز الرعاية الصحية الاولى وفق نهج صحة الاسرة بما يضمن التغطية الصحية الشاملة	ستة اشهر	مستمر	2019	100%	80%	100%				تم عقد سلسلة اجتماعات بخصوص الموضوع مع الجهات المعنية والمتبقي مناقشة مسودة التعديل النهائية واقرارها جاري متابعة المشروع ونم عقد اجتماع مع الجهات المعنية التنظيمي وتم الاتفاق على عمل الهيكل التنظيمي المطلوب تم اعتماد الهيكل التنظيمي المطلوب
		مراجعة وتحديث السياسة الصحية الوطنية	ستة أشهر	2019	2019	100%		100%				تم عقد سلسلة اجتماعات بخصوص السياسة الصحية الوطنية مع كافة الجهات المعنية وبحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وتم جمع البيانات المطلوبة من الدوائر وحاليا في طور تحليل تلك البيانات والمتبقي لتنجاز التحديث هو عقد ورشة عمل لمناقشة التحديث واطلاق الوثيقة المحدثة التحضير لعقد اجتماع لتحليل البيانات ومناقشة نتائج التحليل تم عقد اجتماع مع دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد لمناقشة مقترحات تحديث السياسة الصحية الوطنية تم البدء بعملية التحديث وفقا للبيانات الواردة الى دائرتنا جاري اعداد مسودة تحديث السياسة الصحية الوطنية وهي قيد الانتاج تم عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة في دوائر مركز الوزارة وبحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية بخصوص مناقشة مقترحات المسودة الاولى لتحديث السياسة الصحية الوطنية يوم الاربعاء ١٧/٤/٢٠١٩ تمت مراجعة وتحديث السياسة الصحية الوطنية
		برنامج اعتماد المختبرات الطبية في المستشفيات التعليمية	2	2015	2020	المختبرات الطبية عدد (٧)	3	16%	16%	10%	24%	ان النسب المدرجة تمثل ما هو مطلوب بتنفيذه لعام ٢٠١٩ وهو ٥٠% من النسبة الكلية لتنفيذ المشروع علما ان الواقع الحالي هو ٣ مختبرات من مجموع ٧ المستهدف الكلي الذي ينجز خلال سنتين
		مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية	2	2019	2020	100%		25%	25%	25%		نسبة الانجاز المطلوبة لعام ٢٠١٩ هي ٥٠% من المخطط وسيتم انجاز المتبقي من المشروع في العام ٢٠٢٠
		زيادة نسب التغطية باللقاحات الروتينية (الجرعة الثالثة سداسي +	مستمر	2019	2020	الجرعة الثالثة سداسي + opv3 بنسبة ٩٠%	81%	34%	34%	36%	30%	ان نسبة الانجاز لعام ٢٠١٩ والبالغة ١٠٠% (من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) كما موضحة في الجدول تنعكس على ما مطلوب تحقيقه لعام ٢٠١٩ لهذا النشاط والبالغة (٨٥) % الجرعة الثالثة + OPV3) و (٨٠% الحصة)

		30%		36%	34%	34%	82%	لقاح الحصبة بنسبة ٩٢%				OPV3، (الحصبة)	متوسط	تعزيز النظام الصحي العراقي عن طريق التصدي لمواطن الضعف في مقوماته الاساسية وخاصة التمويل والقوى الصحية العامة وتوفير الادوية واللحاقات والمستلزمات والتكنولوجيات الاساسية وجودة الخدمات الصحية
المستهدف الكلي هو ٤٠% خلال السنتين الاولى اما اتمام بقية المشروع الى نهاية الاربع سنوات فسيكون المستهدف الكلي ٦٠% والمستهدف لعام ٢٠١٩ هو ٥% وكما مبين في الجدول		2%		2%	1%	1%	0%	60%	2020	2019	2	خطة لتحديد أعداد و مواصفات وتوزيع أجهزة معالجة وتشخيص السرطان في العراق Linear ، accelerator, PET scan gamma camera mamogram		
المستهدف الكلي لعام ٢٠١٩ هو ٥٠% من توفير الاحتياج وتوجد عقود تمثل توفير ٦٨ مادة دوائية ذات الاولوية مرفوعة لغرض التمويل والعمل مستمر في اللجان والاقسام الاستيرادية		20%		20%	10%	10%	من الاحتياج ٣٣%	الوصول الى ٦٥% من الاحتياج السني	2022	2019	4	توفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والخدمات في المؤسسات الصحية ومن مناشئ رصينة		
ان النسبة المطلوبة لهذا المشروع لعام ٢٠١٩ هي ٥٠% وكما مبين في الجدول والتي سيتم انجازها في الفصلين الثالث والرابع		15%		35%			25%	100%	2020	2019	2	تحسين جودة الاداء للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مؤسساتنا الصحية و حسب معايير الجودة		
مايمثل ١٢% المخطط له لسنة ٢٠١٩ وسيتم انجاز المتبقي في السنة القادمة		4%		4%	4%	4%		20%	2020	2019	2	تحديث نظام المعلومات الصحية والتسجيل المدني والاحصاءات الحياتية (الولادات والوفيات)		
		40%		40%	30%	30%		تغطية الخدمات الصحية لمخيمات النازحين في اقليم كردستان وكركوك وصلاح الدين والانبار وبغداد	2020	2019	1	خطة الاستجابة الانسانية لعام ٢٠١٩ بدعم منظمة الصحة العالمية		الاسراع بتقييم الوضع الصحي للمنازحين وتحسين الخدمات الصحية لهم والالتزام بالولوية

اعادة بناء المراكز الصحية للمحافظات التي تضررت خلال الاحداث والعمليات العسكرية	متوسط	خطة استجابة وزارة الصحة مابعد انسحاب المنظمات الداعمة لمخيمات النازحين في اقليم كردستان	2	2019	مستمر	تغطية الخدمات الصحية لمخيمات النازحين في اقليم كردستان	50%	50%	25%	25%		
		تجهيز عيادات طبية متنقلة وسيارات اسعاف في محافظتي (ديالى ، صلاح الدين)/قرض البنك الدولي (اعادة اعمار المناطق المحررة)	1	2017	2019	100%	60%	100%			تم الإنجاز في الفصل الأول من عام ٢٠١٩	
تعزيز قدرات وزارة الصحة والقطاع الصحى على صياغة وتقييم السياسات والخطط المسندة بالبيانات ووضع التشريعات والضوابط وتقوية الموارد البشرية اللازمة لذلك وخاصة في مجال الصحة العامة واختصاصها ومكافحة الامراض والرعاية الصحية الاولى والادارة وتقوية نظم المعلومات الصحية ورصد وتقييم اداء النظام الصحى والمؤسسات الصحية	طويل					35.7/1000 ولادة ٢١,٣/١٠٠٠ حية	20%	20%	23%		ان نسبة الانجاز لعام ٢٠١٩ والبالغة ١٠٠%(من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) كما موضحة في الجدول تنعكس على ما مطلوب تحقيقه لعام ٢٠١٩ لهذا النشاط (٣١,٢٣ وفاة لكل ١٠٠٠٠٠ ولادة حية)	
						خفض وفيات الامهات						
						خفض وفيات الاطفال دون سن الخامسة ١١,٢/١٠٠٠ ولادة حية	52%	52%	13%		ان نسبة الانجاز لعام ٢٠١٩ والبالغة ١٠٠%(من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) كما موضحة في الجدول تنعكس على ما مطلوب تحقيقه لعام ٢٠١٩ لهذا النشاط (٢٤,٨ وفاة لكل ١٠٠٠ ولادة حية)	
						خفض وفيات الاطفال حديثي الولادة ١٣/١٠٠٠ ولادة حية	26%	26%	15%		ان نسبة الانجاز لعام ٢٠١٩ والبالغة ١٠٠%(من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) كما موضحة في الجدول تنعكس على ما مطلوب تحقيقه لعام ٢٠١٩ لهذا النشاط (١٣,٣ وفاة لكل ١٠٠٠ ولادة حية)	
											ان نسبة الانجاز لعام ٢٠١٩ والبالغة ١٠٠%(من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) كما موضحة في الجدول تنعكس على ما مطلوب تحقيقه لعام ٢٠١٩ لهذا النشاط (١٥%) من عدد المراكز الكلي يعمل بنهج صحة الاسرة)	
											دور وزارة الصحة يتطلب تحقيق ١٠٠% من النشاطات (من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) للوصول الى الغاية في خفض الوفيات المبكرة بالامراض غير الانتقالية (٢٨٥ وفاة لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان)	

إن تنفيذ نسبة ١٠٠% (من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) وكما موضح في الجدول ينعكس على خفض النسبة المطلوبة فيما يخص الأمراض الإنتقالية لعام ٢٠١٩ (٥%)		30%		30%	40%	40%	٣٠٠ الف إصابة سنوية	خفض نسبة المراضة والوفيات من الأمراض الانتقالية بنسبة ٢٠%	2022	2019	4	(خفض نسبة المراضة والوفيات من الأمراض الانتقالية)
إن المطلوب تنفيذه لعام ٢٠١٩ هو اضافة ٥٥ مستخدم وكم مبين في الجدول		10		30	15	15	جبهة 186 (مستخدم)	جبهة 241 (مستخدم)	2019	2019	4	تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية الشامل لجميع الانظمة الادارة الالكترونية في دوائر مقر الوزارة والمحافظات.
النسبة المطلوب تنفيذهها لعام ٢٠١٩ هي ١٢% وكما مبين في الجدول		3%		3%	6%	6%	2%	50%	2022	2019	4	تنفيذ برنامج وطني للتسجيل والتوثيق الإلكتروني بالمؤسسات التخصصية من خلال (١) البدء في المشروع الوطني للتسجيل والتوثيق الإلكتروني لمرضى زرع الكلى. (٢) دمج المشروع المذكور اعلاه مع مشروع التسجيل والتوثيق للألكتروني لمرضى الديلزة. (٣) البدء بالمشروع الوطني للتسجيل والتوثيق الألكتروني لمرضى التلاسيما والهيموفيليا. (٤) البدء بالمشروع الوطني للتسجيل والتوثيق الالكتروني لمرضى الجهاز الهضغي.
إن المطلوب تجسرة من الاطباء خلال العام ٢٠١٩ هو ١٠٠ وان تنفيذ نسب الانجاز المذكورة تمثل الكتب والمفاتيح ل يتم قبولهم في وزارة التعليم العالي والبحث العالي		80%		10%	10%	10%	10%	100%	2022	2019	مستمر	برنامج تجسير طب الاسرة

<p>اعتماد انظمة واساليب وضوابط عالمية رصينة في توفير الادوية واستيرادها على اسس الفعالية والسلامة والجودة لحماية ارواح المواطنين وصحتهم من عبث الفساد والغش في هذا</p>	لم تحدد	برنامج تجسير الملاكات الصحية والتمريضية	مستمر	2019	2022	تجسير حوالي ٩٠٠ من ذوي المهن الصحية والتمريضية سنويا	تم تجسير ٨٩٠ من ذوي المهن الصحية والتمريضية في عام ٢٠١٨	100%	100%				تم انجاز ١٠٠% من تجسير الملاكات الحصية والتمريضية خلال الفصل الاول
		تنفيذ المرحلة الأولى من نظام المدقق الطبي (Clinical Auditing) بعنوان مشروع المعايير الأساسية للمؤسسات التخصصية (Standards -Operations Procedures (SOP	4	2019	2022	50%	0%	1%	1%	2%		ان النسبة المطلوبة لهذا المشروع لعام ٢٠١٩ هي ٥% وكما مبين في الجدول	
		تطوير القيادات الطبية في المؤسسات الصحية التخصصية	4	2019	2022	50%	0%			1	3	ان المطلوب تنفيذ ٤دورات في عام ٢٠١٩ والتي سيتم البدء بتنفيذها من شهر حزيران	
		اعداد خطة للضمان الصحي	2	2019	2020	100%		5%	5%	15%	10%	أن المطلوب أنجازه لعام ٢٠١٩ هو ٣٠% وكما موضح في الجدول وسيتم أنجاز المتبقي (٧٠%) في عام ٢٠٢٠	
		تحديث برنامج التسجيل السرطاني	4	2019	2022	100%	0%	3%	3%	6%	6%	ان المطلوب تنفيذه لعام ٢٠١٩ لهذا المشروع هو ١٥% وكما مبين في الجدول	
		أصدار ضوابط واليات جديدة أستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية خاصة بتوفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والخدمات تراعي خصوصية تلك المواد واعتبار التسجيل كأساس في الاحالات وتسهيل الاجراءات لأدخال المواد	1	2019	2019			100%	100%			صدر قرار مجلس الوزراء ذي العدد (٧) لسنة ٢٠١٩ المتضمن استثناء عقود تجهيز الادوية والمستلزمات الطبية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية ووفق الضوابط والاليات التي تم اعدادها والمصادقة عليها	

المصاح الحيوي												تغيير أليات توفير الادوية السرطانية		المجموع لسنة ٢٠١٩ = ٢٠%
المباشرة فوراً لاكمال بناء وتجهيز المستشفيات المتوقفة في المحافظات لينتهي العمل ببعضها في اقرب وقت ممكن (سريع) ، والباقي سينجز مباشرة بعد ذلك (متوسط - طويل)	سريع - متوسط - طويل	٢. مشروع انشاء مستشفى عام سعة (٤٠٠) سرير في محافظة كربلاء	مستمر	٢٠٠٩	٢٠١٩	١٠٠%	٩٣%	١%	٠.٥٩%	١%	٧%	نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ٧ % وتم وضع نسبة الانجاز ٢,٥ % لغاية شهر تشرين الاول		
		٣. مشروع انشاء مستشفى عام سعة (٤٠٠) سرير في محافظة ميسان	مستمر	٢٠٠٩	٢٠١٩	١٠٠%	٩٠%	١%	٠.٦٠%	٢%	٢%	نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ١٠ % وتم وضع نسبة الانجاز ٤,٥% لغاية شهر تشرين الاول		
		٤. مشروع انشاء مستشفى عام سعة (٤٠٠) سرير في محافظة ذي قار	مستمر	٢٠٠٩	٢٠١٩	١٠٠%	٩٢%	١%	٠.٨٠%	١%	٢%	نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ٨ % وتم وضع نسبة الانجاز ٣,٥% لغاية شهر تشرين الاول		
		٥. مشروع انشاء مستشفى عام سعة (٤٠٠) سرير في محافظة البصرة	مستمر	٢٠٠٩	٢٠١٩	١٠٠%	٩٣,٠٩%	١%	٠.٨٣%	١%	٢%	نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ٦,٩١ % وتم وضع نسبة الانجاز ٣,٥ % لغاية شهر تشرين الاول		
		٦. مشروع انشاء مستشفى عام سعة (٤٠٠) سرير في محافظة بابل مع مركز لمعالجة الاورام السرطانية	مستمر			منجز	١٠٠%					منجز		
		٧. مشروع انشاء مستشفى عام سعة (٤٠٠) سرير في محافظة النجف	مستمر	٢٠٠٩	٢٠١٩	١٠٠%	٩١%	٢%	٢.٣٠%	١%	٢%	نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ٩ % وتم وضع نسبة الانجاز ٥ % لغاية شهر تشرين الاول		
		٨. انشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير في محافظة الانبار / قضاء هيت	مستمر	٢٠١١	٢٠٢٠	١٠٠%	٥٧%	٠%	٠%	٢%	٢%	لم يتم تمويل التخصيصات المالية للمشروع من قبل وزارتي التخطيط والمالية ولم يتم اكمال مسح الالغام للموقع من قبل الجهات المعنية نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ١٣ % وتم وضع نسبة الانجاز ٤ % لغاية شهر تشرين الاول		
		٩. انشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير في محافظة الانبار / قضاء حديثة	مستمر	٢٠١١	٢٠٢٠	١٠٠%	٥٦%	٠%	٠%	٢%	١٢%	لم يتم تمويل التخصيصات المالية للمشروع من قبل وزارتي التخطيط والمالية نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ٢٤ % وتم وضع نسبة الانجاز ١٤ % لغاية شهر تشرين الاول		
		١٠. انشاء مستشفى سعة (٢٠٠) سرير في محافظة الانبار / قضاء القائم	مستمر	٢٠١١	٢٠٢٠	١٠٠%	٥٧%	٠%	٠%	٢%	٢%	لم يتم تمويل التخصيصات المالية للمشروع من قبل وزارتي التخطيط والمالية ولم يتم اكمال مسح الالغام للموقع من قبل الجهات المعنية نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ٢٣ % وتم وضع نسبة الانجاز ٤ % لغاية شهر تشرين الاول		
		١١. انشاء مستشفى سعة (١٠٠) سرير في محافظات صلاح الدين / قضاء سامراء	مستمر	٢٠١١	٢٠٢٢	١٠٠%	٣٨%	٠%	٠%	٢%	٢%	لم يتم تمويل التخصيصات المالية للمشروع من قبل وزارتي التخطيط والمالية نسبة انجاز تقدم العمل المخطط لها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ هي ١٢ % وتم وضع نسبة الانجاز ٤ % لغاية شهر تشرين الاول		

العمل بتنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية المختلفة على دراسة الاحتياجات الانية والمستقبلية للموارد البشرية في المجال الطبي والصحي واعداد وتنفيذ خطة شاملة تستجيب للاستراتيجية الصحية الوطنية واهدافها	لم تحدد	تعزيز الملاكات الطبية والصحية والتمريضية لسد الاحتياجات الموجودة	اربع سنوات	2019	2022	طبيب 0.88 لكل ١٠٠٠	0.8 طبيب لكل ١٠٠٠	91%	91%	9%	ان المطلوب تحقيقه خلال العام ٢٠١٩ هو ٠,٨٢ طبيب لكل ١٠٠٠ نسمة وان نسبة تنفيذ الانجاز المذكورة (من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) تحقق العدد المطلوب انفاً
						0.38صيدلا ني لكل 1000	0.34صيلا ن ي لكل 1000	75%	75%	25%	ان المطلوب تحقيقه خلال العام ٢٠١٩ هو ٠.٣٤ صيدلاني لكل ١٠٠٠ نسمة وان نسبة تنفيذ الانجاز المذكورة (من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) تحقق العدد المطلوب انفاً
						3.3ممرض لكل طبيب	2.3ممرض لكل طبيب	75%	75%	25%	ان المطلوب تحقيقه خلال العام ٢٠١٩ هو ٢,٣ ممرض لكل طبيب نسبة تنفيذ الانجاز المذكورة(من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) تحقق العدد المطلوب انفاً
						21ذوي مهم صحية لكل ١٠٠٠	19ذوي مهم صحية لكل ١٠٠٠	80%	80%	20%	ان المطلوب تحقيقه خلال العام ٢٠١٩ هو ١٩مهن المهن الصحية نسبة تنفيذ الانجاز المذكورة (من الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩) تحقق العدد المطلوب انفاً
		مشروع توفير الكوادر البشرية العاملة في مجال تشخيص وعلاج الامراض السرطانية	اربع سنوات	2019	2022	80%	0%	5%	5%	2%	المطلوب تنفيذه لعام ٢٠١٩ هو ١٠% وكما مبين في الجدول
استخدام وحدات المعالجة البيولوجية للمياه الثقيلة وجعل هذا الأمر شرطاً لبناء أو استمراري مستشفى او مصنع وذلك للتخلص من النفايات والمحافظة على جودة مياه النهر	لم تحدد	تقييم نوعية التصريف السائلة للأنشطة الملوثة للمصادر المائية وأعداد قاعدة بيانات بذلك	مستمر	2019	2022			0	0	32	لا يوجد حيود والانشطة المستهدفة سيتم تنفيذها خلال النصف الثاني

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز - ف ٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلّي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
عدم وجود ربط شبكي بين نظام الحماية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة والاعتماد في ذلك على نسخ من الاقراص المدمجة والتي تعد في الغالب غير دقيقة ورصينة فضلا عن عدم تعاون بعض الجهات مثل دائرة المرور العامة في مسالة مشاركة البيانات		101399		101400	838321	1397201	69.23% من المستهدف الكلّي	مليون وستمائة الف اسرة	2019	2019	1	اولاً: تحديث البيانات للمسجلين من خلال الربط مع الجهاز المركزي للاحصاء ، البطاقة التموينية ، ومديريات الاحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لخلق قاعدة بيانات رصينة ودقيقة	سريع	تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن العراقيين او العوائل التي تعيش تحت خط الفقر بغرض شمولهم بالرعاية الاجتماعية والقروض وتأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير دعم الدولة المستحق لهم في الاسكان والعمل والكهرباء الرخيصة
تطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال فتح عدة نوافذ لتسهيل عمل الباحثين الاجتماعيين عن بعد باستخدام الاجهزة اللوحية فضلا عن فتح نافذة تحديث العناوين للمواطنين من خلال موقع الوزارة الالكتروني		30%		30%	40%	40%	69.23% من المستهدف الكلّي	مليون وستمائة الف اسرة	2019	2019	1	ثانياً: تطوير اليات عمل البحث الاجتماعي لخلق استهداف اكثر فاعلية للوصول الى الاسرة المهمشة الحقيقية ولخلق قاعدة رصينة ودقيقة		
		250000		250000	500000	500000	0%	مليون 1	2019	2019	1	ثالثاً: تأسيس قاعدة بيانات لتسجيل وتغطية الاسر الفقيرة من خلال المسح الديموغرافي باعتماد خارطة الفقر (وزارة التخطيط) من خلال تهيئة ادارة لوضع اليات تنفيذ المشروع		

ترويج معاملات قروض لجميع المستحقين من العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات حيث تكون القروض يعدد الراغبين فيها.		3884		3884	7232	7232	الف مقرر (45) تم تسليم خمسة واربعون الف مقرر للعاطلين الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	الف (100) مقرر من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	2022	2019	4	دعم المشاريع الصغيرة (صندوق الاقراض) وفق قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢		
		5%		5%	15%	15%	عدد العمالة الوطنية (١٣٦٣٨)	نسبة العمالة الاجنبية الى العمالة الوطنية	2022	2019	4	تشغيل الباحثين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني في الشركات المتعاقدة مع الوزارات وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص		
تم تحديد الارض المخصصة للمشروع وبانتظار التخصيصات المالية لعمل التصاميم الخاصة بالمشروع والمباشرة بالعمل		10%		5%	10%	10%		100%	2022	2019	4	انشاء دار لايواء النزلاء والمودعين من قبل دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة		
تم اعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين والهيئة بانتظار التخصيصات المالية المطلوبة لانجاز النشاط الخاص بقاعدة البيانات		20%		10%	20%	20%	0%	من 100% المعاقين	2022	2019	2	انشاء قاعدة بيانات رصينة يتوفر فيها جميع بيانات المعاقين في العراق		
		10000		2193	17218	15000	29411	59411	2022	2019	4	تطبيق المادة (١٩/ثانيا ١٠) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٨ والذي ينص على شمول المستفيدين من راتب المعين المتفرغ		
تحديث بيانات جميع العاطلين المحدثين لبياناتهم مع تسجيل الجدد من العاطلين في قاعدة البيانات ، حيث العدد هو العدد التراكمي لاعداد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات					1200242	1200242	1063630	نسبة العاطلين الباحثين عن العمل المحدثه بياناتهم	مستمر		مستمر	تحديث بيانات العاطلين الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	سريع	التأسيس لمشروع تشغيل الشباب وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وتقديم تسهيلات مصرفية ميسرة بهدف الحد من البطالة والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد

<p>تأهيل وبناء ودعم مراكز التدريب المهني التي تعلم المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل والمجتمع.</p>	لم تحدد	بناء قدرات المدربين (تدريب مدربين) (TOT) للحصول على الترخيص بالتدريب من الجهات الدولية المرجعية على ضوء المعايير الدولية	مستمر	2019	مستمر	400 مدرب	0	0%	0%	0%	100%	المشروع في طور استكمال ا لموافقات الأصولية على توقيع اتفاقية مع الشركة الكندية CLIC والوكالة الألمانية GIZ حيث تم رفعها الى الدائرة القانونية وبانتظار مصادقة السيد الوزير من المؤمل تنفيذها خلال السنوات القادمة .
		تطوير قدرات الملاكات العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب المهني في مجال الحصول على الشهادات الدولية من الجهات المرجعية في تطوير المناهج والتقييم	مستمر	2019	مستمر	مختص 100	.	0%	0%	0%	25%	المشروع في طور استكمال الموافقات الأصولية على توقيع اتفاقية مع الشركة الكندية CLIC والوكالة الألمانية GIZ حيث تم رفعها الى الدائرة القانونية وبانتظار مصادقة السيد الوزير من المؤمل تنفيذها خلال السنوات القادمة .
		تطوير المناهج على وفق المنهجيات الحديثة cbt	مستمر	2019	مستمر	حسب حاجة سوق العمل	منهج 81	100%	100%	100%	100%	يتم تطوير المناهج حسب حاجة سوق العمل والتطور الحاصل فيه حيث تم تحديث ثلاث مناهج لهذا الغرض
		تطوير خارطة الطريق استراتيجية الحماية الاجتماعية	4	2019	2022			50%	15%	25%	25%	عدم توقيع الاتفاقية من الجانب العراقي المتمثل بوزارة المالية والبنك الدولي الجهة المقرضة
		النقد مقابل العمل والدعم الاجتماعي وفرص كسب الرزق	3	2019	2021	شمول النازحين العائدين الى مناطقهم المحررة والسكان المحليين		10%	0%	10%	10%	عدم ادراج المشروع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط علماً انه تم اعداد وتصميم انظمة المشروع وتدريب فرق ادارة المشروع على مكونات المشروع من قبل وزارتنا.
		شبكات امان اجتماعي صامدة	حسب شروط العقد					10%	0%	10%	10%	عدم ادراج المشروع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط علماً انه تم اعداد وتصميم انظمة المشروع وتدريب فرق ادارة المشروع على مكونات المشروع من قبل وزارتنا.
		ادارة المشروع الطارئ	حسب شروط العقد					10%	0%	10%	10%	عدم ادراج المشروع في الخطة الاستثمارية من قبل وزارة التخطيط علماً انه تم اعداد وتصميم انظمة المشروع وتدريب فرق ادارة المشروع على مكونات المشروع من قبل وزارتنا.

تم تشكيل لجنة من اقسام الهيئة لمتابعة الموضوع وبانتظار التخصيصات المالية للبدء بالمشروع	10%	5%	10%	10%	0	ورشة 20	2022	2019	4	استحداث ورش تدريبية لذوي الاعاقة بغية تدريبهم على بعض المهن التي تتناسب مع نوع الاعاقة وانسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص		
تم التوقيع على المحضر النهائي بين لجنتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بنقل مراكز التأهيل وعددها (١٠) مراكز من وزارة الصحة الى وزارة العمل والامر قيد المصادقة من قبل السادة الوزراء	10%	30%	30%	35%					جهد حكومي	نقل مراكز التأهيل لمقاتلي القادسية وام المعارك وعددها عشرة حسب قانون هيئة الاعاقة والحاقها مع موجوداتها وموظفيها الى هيئة الاعاقة ونقل مراكز التأهيل التابعة الى وزارة الصحة وعددها ٨ تؤدي نفس الغرض اعلاه		
تم اعداد دراسة مفصلة لانه لم تنقل المراكز المذكورة لغاية اعداد هذا التقرير	45%	20%	25%	35%					جهد حكومي	تاهيل المراكز واعادة اعمارها وتجهيزها بالمعدات اللازمة والمبالغ المطلوبة		
بانتظار صدور ضوابط وتعليمات بشأن توزيع قطع الاراضي على المستفيدين	100 الف عامل	0%	0%	0%		250 الف عامل ومتقاعد		بعد صدور القرار		تخصيص قطع اراضي لشريحة المتقاعدين والعمال في القطاع الخاص والذي يتطلب (صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر لتخصيص قطع اراضي في بغداد والمحافظات)		
تم استحداث شعبة خاصة بالعقود الحكومية مرتبطة بقسم الاشتراكات تولى مهام شمول العقود والاجراء اليوميين وحسب قرار مجلس الوزراء رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩	150 الف عامل	0%	0%	0%					جهد حكومي	معالجة المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذي يتطلب قرار من مجلس الوزراء يلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشمول العقود او الاجور اليومية بالضمان الاجتماعي وفق الحد الادنى للاجر (٣٥٠) الف دينار	لم تحدد	شمول جميع المواطنين العاملين في القطاع العام أو الخاص بنفس الحقوق والامتيازات من حيث التقاعد والضمان وتوزيع الاراضي شريطة مساهمة المواطن بالاستقطاعات المناسبة وفق القواعد المشرفة.

وزارة الصناعة والمعادن

المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
		0		0	2	2	98%	٤٥ الف طن / سنة	2019	2017	٦ اشهر	تاهيل خطوط انتاج الزيوت السائلة ومساحيق التنظيف وصابون التواليت/خطوط انتاج الزيوت السائلة (مشاركة)	متوسط	تحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشآت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها وتحقيق سعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة اولى والتصدير كمرحلة ثانية
		6		5	9	9	0%	38 الف طن/ سنويا	2020	2018	2	معمل ورق ميسان / (استثمار)		
		12.5		5	2.5	2.5	0%	20.000 عمود / سنة	2020	2019	2	معمل الاعمدة الكهربائية /معدات الاتصالات (مشاركة)		
		10		5	5	5	0%	مولدة 384 مع ٥٠ كاتم صوت /سنة	2020	2018	2	مشروع تجميع مولدات القدرة والكواتم/ ابن الوليد (مشاركة)		
		20		10	30	30	0%	7375 طن / سنة	2020	2019	2	مشروع الاسيجة الواقية للطرق السريعة / الفولاذية (مشاركة)		
		10		10	40	40	0%	800 طن/سنة	2020	2019	2	مشروع السلاسل /الفولاذية (مشاركة)		
		50		40	10	10	0%	٥,٥ مليون صندوق سعة ٢٤ بطل سنويا	2019	2019	1	انتاج وتعبئة مياه الشرب / المنصور الزوراء(استثمار)		
		10		10	80	80	0%	230000 فلتر سنويا	2019	2014	1	مصنع الفلاتر/ الزوراء (استثمار)		
		30		20	10	10	0%	محرك 24 سنويا	2020	2017	2	معمل تصليح محركات الجهد المتوسط/ الزوراء (توسيع طاقات) (استثمار)		
		37		20	43	43	0%	٥00 الف اطار سنويا	2019	2019	1	مصنع اطارات الديوانية /مطاطية (استثمار)		

		30		20	10	10	0%	طن 10250 سنة/	2020	2019	2	البان الموصل/الغذائية (استثمار)
		15		5	0	0	0%		2020	2019	2	مراكز جمع الحليب عدد (5) مرحلة اولي/ الغذائية (تأجير للقطاع الخاص)
		10		10	40	40	0%	طن8815/ سنة	2020	2016	2	البان ابو غربب /الغذائية (رفع الطاقة الانتاجية) (استثمار)
		43		15	2	2	0%	ذي ٢٠٠ الف) سنة/ مقياس(الالكتروني (١٠٠ الف/سنة).	2020	2016	2	مصنع تطوير المقياس الالكتروني ونتاج المقياس الذي/ ديالى (استثمار)
		10		3	87	87	0%	مليون 33 لتر /سنويا	2019	2017	1	الغازات الطبية/ الزوراء (استثمار)
		5		5	10	10	0%	مليون 100 / طابوقة سنة	2020	2018	2	معمل طابوق الصورة/ الانشائية (استثمار)
		0		0	20	20	0%	مليون 80 طابوقة /سنويا	2020	2018	2	معمل طابوق القادسية / التوسع/ الانشائية (استثمار)
		15		5	0	0	0%	الف متر 100 مكعب / سنة	2020	2019	2	معمل ثرمستون بغداد/ الانشائية (استثمار)
		0		0	20	20	0%	مليون 80 طابوقة سنة/	2020	2018	2	معمل طابوق ديالى تأهيل وتشغيل / الانشائية (مشاركة)
		10		10	80	80	0%	غير محددة	2019	2019	٩ اشهر	مشروع تصنيع وتجميع معدات تخصصية خدمية / الهيدروليكية (استثمار)
		45		25	30	30	0%	مليون 2.16 طن / سنة	2019	2018	1	سمنت بابل / السمنت (الوصول للطاقة التصميمية)(استثمار)
		45		25	30	30	0%	الف 180 طن/سنة	2019	2018	1	معمل النورة/ السمنت الوصول للطاقة التصميمية (استثمار)
		0		0	20	20	0%	الف 309 طن/سنة	2020	2018	2	سمنت النجف / السمنت الوصول للطاقة التصميمية (استثمار)
		15		5	0	0	0%	طن 600 يوم	2020	2019	2	الزجاج المسطح / الشركة العامة الزجاج والحراريات (استثمار)

		40		30	30	30	0%	الف طن/سنة حبيبات مع اضافة خط جديد بطاقة الف طن 25 /سنة	2019	2018	1	معامل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ للوصول الى الطاقة التصميمية (مشاركة)
		32		20	8	8	0%		2020	2018	2	انشاء ورشة متخصصة لتطوير انتاج الكرفانات (استثمار)
		10		5	15	15	0%	مليون طن / سنة	2020	2019	2	خط انتاج الكبريت المصفى (استثمار)
		10		5	5	5	0%	من 90% التصميمية البالغة ١.١٢٥ مليون طن / سنة	2022	2018	4	تأهيل الشركة العامة للقوسفات (استثمار)
		0		0	20	20	40%	طاقة انتاجية ٢٦١ الف طن/ سنويا	2022	2012	4	معمل سمنت الفلوجة
		15		10	5	5	0%	الف ١٠ طن /سنة	2021	2018	3	مشروع قابلو الضغط المتوسط / اور(استثمار)
		6		5	19	19	0%	الف طن 100 /سنة	2021	2018	3	مصنع انابيب الملحومة طوليا (استثمار) الحديد والصلب
		10		10	10	10	0%	طن / 150000 سنة سكر ابيض لتر (600.000 سنة)(١٠٠ طن/ خميرة جافة فورية/سنة	2021	2019	3	معمل السكر والخميرة في الموصل/الغذائية (استثمار)
		15		10	5	5	0%	100000 طن/س نة	2021	2018	3	معمل سكر ميسان مع المزرعة/ لغذائية (استثمار)
		20		9	1	1	0%	الورق بانواعه ٨٢ طن / يوم) (المقوى ٥٤ طن/ يوم)	2020	2019	2	الصناعات الورقية (استثمار)
		20		10	0	0			2019	2019	2	معالجة العمالة الفائضة في الصناعة
		0		0	2	2	98%	الف طن 45 سنة	2019	2017	6	تاهيل مصانع الشركة العامة للزيوت النباتية / المرحلة الثانية (مشاركة)

<p>تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن للقطاع العام او الخاص او مشاركة بناءها خلال العام الاول على ان تقدم تسهيلات مصرفية ميسرة كبقية المشاريع حسب نوع المشاريع وحجمها واهميتها.</p>	<p>سريع</p>	تاهيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (المرحلة الاولى)	اشهر ٦	2008	2019	90%	100% (طن 36000) الاغطية الزراعية (طن 13500) أكياس بلاستيكية الطاقة التصميمية السنوية للمشروع الاثني عشر (طن 18000) واطي الكثافة الاكياس البلاستيكية (كيس 88000) قناني أر أو ألف (23040 قنينة) سنوياً	100	100	0	0	منجز وتم البدء بالتشغيل التجريبي الذي يتطلب شهر لبدء الانتاج في الاسبوع الاول من شهر تموز
		وحدات المعالجة الكيماوية والبايولوجية لمصنع الامين	اشهر ٦	2013	2019	80%	100% طاقة معالجة تبلغ 35م³ / ساعة	100	95	0	0	الباقى ٥% تمثل نسبة التشغيل التجريبي وأرسل الكادر للتدريب
		انتاج البطاريات المغلقة عديمة الادامة MF وبطاريات الطاقة الشمسية	1	2013	2019	77%	100% الطاقة الانتاجية بطارية (500,000 قياسية بطارية 125,000 (طاقة شمسية	6	6	9	8	
		تاهيل معامل الطابوق الفخاري في الشركة العامة للصناعات الانشائية	1	2009	2019	37%	100% الطاقة الانتاجية (٤٠٠) السنوية مليون طابوقة	10	10	25	28	
		تاهيل معمل الاسمدة الجنوبية رقم (٣) مع انشاء محطة توليد كهرباء	اشهر ٩			90%	100% لتحقيق طاقة انتاجية تبلغ 660000 طن من الامونيا و ٧٢٠٠٠ طن يوريا سنوياً	5	5	5	0	
		تاهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب/ المرحلة الاولى	2			6%	تحقيق طاقة انتاجية ١٢٢٠٠ طن حديد تسليح و ٨٨٠٠٠ مقاطع متوسطة ١٠٠%	5	5	25	54	
		مشروع بناء انظمة ادارية وتطوير الموارد البشرية مرحلة (٢)	3			3%	100%	0	0	5	9	

		1		1	10	10	44%	رفع الطاقة الانتاجية الى من ٣٧٥٠ المحولات الـ mva الطاقة الانتاجية للمقاييس الكهربائية الالكترونية ٣٠٠٠٠٠٠ مقياس سنويا والطاقة الانتاجية لمعمل الغابلو الضوئي ١٠٠٠ كم ١٠٠ %			1	تأهيل شركة دبال العامة للصناعات الكهربائية
		0		0	23	23	25%	100%			2	انشاء المجمعات الصناعية في العراق / المرحلة الثانية (البصرة وذي قار)
		5		3	5	5	52%	100%			4	انشاء محطات كهرباء قرب المجمعات الصناعية
لم تطلق التخصيصات المالية لغاية اعداد التقرير		0		0	3	3	23%	100%			4	مشاريع الخطط البحثية / هيئة البحث والتطوير الصناعي
لم تطلق التخصيصات المالية لغاية اعداد التقرير		2		1	3	3	69%	100%			4	المسح الجيولوجي والتحري والتقييم المعدني للخامات المعدنية
		0		0	1	1	77%	100%			3	تاهيل معمل الاسمدة الجنوبية (IQ-P6)
دراسات اولية		5		5	5	5	0%	100%			3	مشروع النبراس البتروكيمياوي العملاق / المرحلة الاولى (الدراسات)
المنجز عدد مشاريع		0		0	700	700	0%	مشروع 700			٦ اشهر	اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة / قطاع خاص
المنجز عدد مشاريع		322		250	50	50	0%	4997 مشروع			4	مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة / قطاع خاص قيد التنفيذ

		0		0	75	75	25%	100%			اشهر ٦	مشروع تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ للقطاع الخاص والمختلط	سريع	توحيد شروط وامتيازات مديرية التنمية الصناعية وقانون الاستثمار العراقي رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتطويرها وتسهيلها لصالح المستثمر المنتج الذي يوفر صناعة عراقية وتحقيق شعار "صنع في العراق" و"صنع بأيد عراقية".
تمت مخاطبة المحافظات لتسهيل منح قطع اراضي للمشاريع الصناعية علما ان عدد من طالبي الاجازات لديهم قطع اراضي خاصة بهم ولا يحتاجون الى تخصيص					50	75	25%	100%	2019	2019	اشهر ٦	مشروع تخصيص الاراضي الصناعية للقطاع الخاص بموجب دراسات الجدوى الاقتصادية المقرة	لم تحدد	منح الاراضي للأغراض الصناعية مجاناً أو بأسعار رمزية وتحدد مساحتها بحسب حاجة المشروع وبالتكامل مع وزارة الاسكان والاعمار وهيئة الاستثمار الوطنية، وفتح الباب للاستثمار الخارجي في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة واستقدام الماركات العالمية لتصنع منتجاتها جزئياً أو كلياً في العراق
دراسات اولية المشروع مكرر		5		5	5	5	0%	100%	2021	2019	3	الدراسات والتصاميم والاستشارات المشتركة وفقاً للاتفاقية الرأسية (HOA) لمشروع النبراس البتروكيمياوي العملاق/ التزام الجانب العراقي	لم تحدد	فتح الباب للاستثمار الخارجي في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة واستقدام الماركات العالمية لتصنع منتج انها جزئيا او كلياً في العراق
المحور الثاني : تقوية الإقتصاد														
		0		0	100	100	0%	100% طائفة 10	2019	2019 كانون الثاني	اشهر ٦	تصنيع الطائرات المسييرة الاستطلاعية والمقاتلة	سريع	التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية لتوفير احتياجات الجيش العراقي من الاسلحة والانتاء من وضع الخطط والتعليمات مع استمرار تسليح القوات المسلحة بأفضل انواع الاسلحة الفعالة التي تناسب طبيعة المعركة في العراق وخصوصاً جهود مكافحة الإرهاب
		0		0	100	100	0%	100% عربة 180	2020	2020 كانون الثاني	اشهر ٦	انتاج العربات المدرعة		

وزارة الزراعة

المحور الرابع : تقوية الإقتصاد

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
في حال اقرار القانون المعروض على مجلس النواب سي شمل ١٥ محافظة في عام ٢٠٢٠ وسيتم التخلص من مفهوم الاراضي الاميرية الموروثة من العهد العثماني ..الخ.		15		0	0	0	-	توحيد قوانين وقرار بحدود (١٥) بتشريع واحد	2020	2019	2	الغاء وتعديل تشريعات زراعية	متوسط	العمل جديا للتخلص من مفهوم الأراضي الاميرية الموروثة من النظم العثمانية السابقة، وملكية الدولة بشخص وزارة المالية وبقية الوزارات لمعظم اراضي البلاد، وتشريع قانون يحفظ الملكيات الزراعية والحيازة والاجارة والاستثمار لإنهاء الفوضى الحالية في ملكيات وحيازات الأراضي التي تثير منازعات كبيرة، وتمنع تطور الزراعة والتربية الحيوانية وتطور الحياة الريفية. وتوزيع الأراضي بأسعار رمزية او حتى مجانية عبر احياء مفهوم "الأرض لمن احياءها" و احياء الأراضي الموات. وتوفير التسهيلات المصرفية والتعاونية لتمويل الدورات الزراعية والحيوانية، ودعم الزراعة اساساً بدعم المخرجات الزراعية واعتبار جميع ذلك من اهم مقومات النهضة الزراعية المرتقبة
المشروع بحاجة لتوفير تخصيص مالي لغرض تمكين اللجان المشكلة لهذا الغرض من تنفيذ اعمالها حيث لم يتم الحصول على تخصيص مالي لحينه وسيتم اعادة النظر بالمستهدفات بعد الحصول على تخصيص مالي للمشروع.		15		0	0	0	0%	محافظة 15	2022	2019	2	تم تفعيل قانون (١١٧) لسنة ١٩٧٠	متوسط + طويل	
بسبب عدم اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالخطة الاستثمارية		2		0	0	0	53%	موقع 11	2022	بداية اكمال الانشاء ٢٠١٩	4	اكمال انشاء القرى العصرية في المحافظات	متوسط + طويل	توسيع تجربة القرى العصرية من خلال توفير القروض الميسرة

للمزارعين في عموم العراق والعمل على بناء عدد من القرى العصرية المجاورة لمزارع نموذجية زراعية وحيوانية في عدد من المحافظات لتكون مثلاً وقدوة لتشجيع عصنة الحياة الريفية والقروية وتنشيط الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات القروية والمحلية	بحوث الثروة الحيوانية (مشروع)	غير محددة(د ائمية)	2003	مستمر	انتاج (٥٠٠٠) طير محلي + هجين انتاج ٥٠٠٠ طير سمان انتاج ١٠٠٠ طير ديك رومي تربية واكثار النعام الاقريقي بعدد ٥٠ فرخ	اجراء بحوث ودراسات علمية وانتاج ٧٥٠ طير محلي + هجين اجراء بحوث ودراسات علمية وانتاج ١٥٠٠ طير سمان(توزيعه المستفيدين) انتاج ٢٣٠ طير ديك رومي	1000	1000	2000	2000	2000	المستهدف الكلي للمشروع ٩٠٥٠ طير والواقع الحالي ٤٤٠٠ المستهدف لعام ٢٠١٩ هو ١٨٥٠ دجاج محلي ٢٠٠٠ طير سمان، ٣٥٠ طير ديك رومي ٨٠٠ طير محلي هجين)*تجدر الاشارة الى ان العمر الكلي (تربية وانتاج) لكافة الطيور باستثناء النعام هو سنة واحدة تقريباً لذلك يتم استبدال القطيع بكامله سنوياً مع زيادة تدريجية.
	برنامج تنمية وتطوير مهارات وقابليات الفلاحين ومربي البثروة الحيوانية والمرأة اريفية لزيادة الانتاج	4	2019	2022	محافظة 15	0%	1	1	2	1	1	تم رصد تخصيصات مالية
	مشروع الإدارة المتكاملة لبساتين النخيل والحضبات	3	2019	2021	100%	0%	10%	0	10%	10%	10%	لم يتم الحصول على التخصيصات لحيته وسيتم النظر بالمستهدفات بعد الحصول على تخصيصات مالية للمشروع
	مشروع ترشيد استخدام المياه بالاساليب الحديثة	4	2019	2022	100%	0%	15%	15%	5%	5%	5%	تم رصد تخصيصات مالية
	مدارس المزارعين الحقلية لمحاصيل الخضر	4	2019	2022	680 فلاح	0%	33	0	33	34		لم يتم الحصول على التخصيصات لحيته وسيتم النظر بالمستهدفات بعد الحصول على تخصيصات مالية للمشروع
	مشروع التلقيح الاصطناعي في الجاموس وتحسين الكفاءة التناسلية للجاموس العراقي	4	2019	2022	انتاج ٢٥٠ الف قصبة لقاح مجمد من فحول الجاموس المنتخبة	0%	25000	0	0	15000		اولاً سيتم اعادة النظر بالمستهدفات وفق التمويل الذي سوف يتم الحصول عليه ثانياً بخصوص الفصل الثالث وجزء من الفصل الرابع لم يتم تحديد المستهدف وذلك بسبب توقف العمل والانتاج في مشروع التلقيح الاصطناعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على حيوية السائل المنوي
	توفير فرص للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي المعاهد الزراعية للمشاركة في النشاط الزراعي الإنتاجي، وتعديل لقانون (٢٤) لسنة ٢٠١٣ الخاص بالتفرغ الزراعي		اذار ٢٠١٩	مستمر			0	0	0	15		تم رفع التعديلات المقترحة على القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٣ من قبل وزارتنا / الدائرة القانونية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وبانتظار الاجابة.
تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني	البرنامج الوطني لاكثار				152	14	33	33	0	2		تم توفير التخصيصات المالية للبرنامج - مواعيد الزراعة لموسمي الربيع والخريف.

بتوفير القروض المناسبة بدون فائدة او بتحمل الدولة لفوائدها بضمان الانتاج وزيادة استخدام الانتاج الوطني في تلبية احتياجات السلة الغذائية وتقليل الاستيراد وتوفير مفردات البطاقة التموينية	سلالات و هجن محاصيل الخضر المحلية	4	2018	2021	دونم 66	12دونم	18	18	0		
	البرنامج الوطني لاكثار واصناف الفاكهة والزيتون المختلفة	5	2019	2023	1.79 مليون اصل	0%	300000	0	0	0	لم يتم اقرار البرنامج وتمويله لغاية تاريخه وسيتم اعادة النظر بالمستهدفات عند الحصول على التخصيص المالي. يتم زراعة العقل والبذور للفاكهة والزيتون في اشهر (كانون الاول و كانون الثاني) لضمان نجاح الزراعة لذا اصبحت خارج الفترة لاعداد هذا التقرير الفصلي
					2171 مليون	0%	258000	0	0	0	
	برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز للأصناف المعتمدة والمسجلة لدائرة البحوث الزراعية	5	2017	2021	دونم 990	دونم 231,5	0	0	210	0	خطة برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز لم تقر لحد الآن وبانتظار مناقشتها من قبل اللجنة التوجيهية للبرنامج علما ان مساحة ٢١٠ دونم يبدأ تنفيذ زراعتها في ١٩/٦/٢٠١٩
	برنامج إكثار بذور الرتب العليا لأصناف الشعير.	4	2017	2021	49267 دونم	مساحة ٢١ دونم	184,5	184,5	0	0	خطة برنامج اكثار بذور الرتب العليا لأصناف الشعير. تبدأ الزراعة في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني ٢٠١٨ ويكون الحصاد في نهاية نيسان وبداية مايس ٢٠١٩ وبمساحة ١٨٤,٥ دونم
	برنامج إدامة وإكثار السلالات وإنتاج هجن الذرة الصفراء المعتمدة في العراق .	5	2017	2021	تحدد المساحات الكلية للبرنامج حسب المواسم الزراعية بعد استكمال موافقة اللجنة التوجيهية للبرامج الوائية لاقرار خطة العمل	موسم ٢٠١٨ اكثار بذور السلالات النقية بمساحة ١٤٢ دونم	0	0	2	15	تم تنفيذ الموسم الربيعي ٢ دونم اعتباراً من ١٩/٣/٢٠١٩ ويستمر بالتنفيذ والمتابعة واطافة اسمدة وحصاد لغاية ١٩/٧/٢٠١٩ ثم تبدأ زراعة ١٥ دونم في الموسم الخريفي ٢٥/٧/٢٠١٩ ومستمرة الى ١٩/١١/٢٠١٩ علماً ان خطة برنامج ادامة واکثار السلالات وانتاج هجن الذرة الصفراء لم تقر لحد الآن.
	برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة .	غير محددة	2014	مستمر	اكثار بذور الرتب العليا من بذور النواة والاساس بالإضافة الى انتاج بذور التوبة والسنايل	موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ زراعة مساحة ١٨٥١,٢٠٠ دونم	3000	3000	0	0	خطة برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة تبدأ الزراعة في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني ٢٠١٨ ويكون الحصاد في نهاية نيسان وبداية مايس ٢٠١٩ وبمساحة ٣٠٠٠ دونم
البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة ي العراق .	غير محددة	2011	مستمر	انتاج ٧٥٠ كغم / دونم بذور الحنطة لتوفير الامن الغذائي للبلد (البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق)	موسم ٢٠١٨ انتاج ١٤٩٩٩٥٥ طن	750	750	750		ان خطة البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة يبدأ الموسم الزراعي لزراعة محصول الحنطة في شهر تشرين الثاني ويتم الحصاد في شهر حزيران ومعدل الانتاجية ٧٥٠ كغم /دونم والتي تمثل الغلة .	

							150	انتاج ٥٣٠ انعام العواسية (اكثر) وتحسين وراثي وتوزيع الحيوانات المنفيزة وراثيا للصفات الاقتصادية على المستفيدين واجراء البحوث العلمية عليها)	مستمر	2004	غير محددة	انتاج كباش الاغنام العواسية		
							0	انشاء ٢٠ حضيره فردية لطلائق الجاموس وقاعة جمع السائل المنوي ومختبر لجمع السائل المنوي ومختبر لتقييم وتخفيف السائل المنوي	مستمر	2018	غير محددة	مشروع التلقيح الاصطناعي في الجاموس (دعم المزارعين)		
							0	5000 دونم		2019	4	مشروع اقراض المزارعين لشراء منظومة ري حديثة لاعادة تأهيل بساتين النخيل والفاكهة والزيتون	متوسط	تشجيع الزراعة الحديثة وتطويرها ودعمها بالفروض لاسيما البيوت البلاستيكية والزراعات التي تقاوم انواعاً معينة من الملوحة والمياه والطرق التي تستخدم الدورة المائية بدون تربة. وغيرها من أنماط باتت تسد الحاجيات في الكثير من البلدان الأخرى وتساعد على التصدير
المحور الثالث: الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية														
							304الف دونم	750 الف دونم	2022	2011	11	مشروع استخدام تقانات الري والمكننة الحديثة	سريع	
لغاية الآن لم يتم اطلاق التخصيصات المالية للخطة الاستثمارية		67500		0	0	0							وضع خطة بالأرقام لشمول الاراضي الزراعية بمعدات الري الحديثة لضمان انتاج زراعي وفير واقراض المزارعين لهذا الغرض وبالتكامل مع وزارة الزراعة وبطريق مشترك واحد	
الخطة السنوية لعام ٢٠١٩ تتضمن تغطية طينية بنسبة ٣% من المستهدف الكلي ويمثل ١٥٠٠ دونم وتشجير ٨٠٠٠ شتلة ولم يتم اطلاق الصرف على المشروع من قبل وزارتي التخطيط والمالية لغاية الآن.* المخطط الاولي للاعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ المتبقي ١٥% و١٦% على التوالي حسب التخصيص الاساسي للمشروع (٧١٨٠٠) والذي تم تخفيضه من قبل وزارة التخطيط الى (٤٦٦٧٠ مليون) مما يؤثر على انجاز المستهدف الكلي للمشروع.		2%		1%	0	0			2021	2006	15	تثبيت الكثبان الرملية		
أولاً: عدم موافقة وزارة التخطيط على الفقرات المدرجة لعام ٢٠١٩ ثانياً: الفقرات المدرجة والمرفوضة من قبل وزارة التخطيط هي ليست اعمال مستحدثة انما اعمال لم يتم اكمالها ضمن المقاولات التي تم تسويتها رضائياً بموجب قرار(٣٤٧) ثالثاً ان الفقرات المدرجة في عام ٢٠١٩ سبق وان تم ادراجها عام ٢٠١٨ وتم سحب التخصيص المالي للمشروع لذلك العام رابعاً المستهدف الكلي للمشروع ١٠٠% الواقع الحالي ٧٦% المستهدف لعام ٢٠١٩ هو ٦% والمستهدف لعام ٢٠٠٠ هو ٦% والمستهدف لعام ٢٠٢١ هو ٦% والمستهدف لعام ٢٠٢٠ هو ٦%.		3%		2%	0	1%				2008		تطوير وتاهيل الطيران الزراعي في العراق		

وزارة النقل

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز - ف ٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكل (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
١- تم توقيع ملحق عقد رقم (٤) بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٩ وكلفة (٩٢,٥) مليون يورو/ مدة تنفيذ سنة ونصف ٢- لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الآن				1.50%	3.50%	3.50%	95%	100%	2019	2014	5	كاسر الامواج الغربي	لم تحدد	نجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر وان تعذر عن طريق شراكة عراقية اجنبية خلال المدة التي ستقتضيها الدراسات الفنية للمشروع ويجدول زمني يتم تدقيقه كل ثلاثة أشهر ويمرأحل متعددة وانجاز اعمال ميناء العراق الكبير
		30%		19.50%	2.50%	2.50%	43%	100%	2020	2008	2سنة من تاريخ 2019	اكمل مشروع خط سكة ساوة -حجامة مع ٣ جسور ومقترباتها	سريع	زيادة الاعتماد على السكك الحديدية وادخال تحسينات جوهرية في الشبكة الحالية بما يخفف عن النقل البري سواء للركاب او للبضائع لفك الازدحامات والحوادث على الطرق والتوقف عن الاضرار بالطرق بسبب الاحمال
لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الآن		0.20%		0.50%	0.30%	0.30%	77%	84%	2026	2001	8سنة من تاريخ 2019	مشروع (يوسفية -حلة - سماوة) للخطين الجديد الملاصق والقديم		
لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الآن					1.20%	0%	94%	100%	2022	2010	4سنوات من تاريخ 2019	مشروع مسيب كربلاء المقدسة		

المرحلة الاولى من مشروع القطار السريع بالاتفاق مع كونسورتيوم عالمي لتحقيق تكنولوجيا متقدمة مطبقة عالمياً، ليتم التعاقد والاستثمار قبل نهاية العام الاول	الثقيلة، وانجاز									
أكمال مشروع (سماوة- ناصرية -غبيشية)للخطين الجديد الملاصق والقديم	6 سنوات من تاريخ 2019	2004	2024	71%	61%	0.30%	0.30%	0.40%	0.30%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
اكمال مشروع (غبيشية - بصرة- ام قصر)للخطين الجديد الملاصق والقديم	5سنة	2002	2023	98%	83%	0.40%	0.40%	0.10%	2.50%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
مشروع شراء مواد ومكانن السكة الاختصاصية	4سنة من تاريخ 2019	2004	2022	100%	83%	0.10%	0.10%	1.40%	0.50%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
مشروع (بغداد - بيبي)للخطين الجديد الملاصق والقديم	8سنة من تاريخ 2019	2002	2026	61%	38%	0%	0%	0.50%	0.50%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
اكمال مشروع (بيبي حمام العليل) للخطين الجديد الملاصق والقديم	8سنة من تاريخ 2019	2001	2026	54%	41%	0.40%	0.40%	0.30%	0.30%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
مشروع (حمام العليل - موصل -ربيعه)للخطين الجديد والملاصق القديم	8سنة من تاريخ 2019	2002	2026	36%	23%	0%	0%	0.50%	0.50%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
اعادة اعمار جسر الفتحة	2سنة من تاريخ 2019	2004	2020	100%	37%	0%	0%	8%	13%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
مشروع شراء وحدات متحركة	4سنة من تاريخ 2019	2012	2022	100%	80%	0%	0%			ا- يتطلب استحداث (٧) مكونات (موازنة تكميلية) ٢-لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان
أستملاك خط بصرة - شلامجة	4سنوات من تاريخ 2019	2008	2022	100%	21%	0%	0%	2%	2%	لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان

تحويل شركة الخطوط الجوية العراقية الى شركة رابحة بمعدل مثيلاتها الاجنبية، وبجداول محددة، وبالشراكة مع شركات اجنبية ومحلية وفق النماذج العالمية الناجحة	لم يحدد	شراء طائرات كنديية	2	2015	2020	5	100%	0%					لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان	
شراء طائرات بوينغ (المرحلة الثانية)		4	2008	2025	25	طائرة	14							
توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن		2	2014	2020	100%	5,7%		0%	0%	5.00%	25%	١- ان نسبة المستهدف لعام ٢٠١٩ هي (٣٠%) حيث ان المبلغ المطلوب تخصيصه (٣٠ مليار) في حين تم تخصيص مبلغ (٥ مليار) لهذه السنة ٢- في النية تحويل المشروع الى تشغيل مشترك ٣- لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان		
رفع طاقة الموانئ الحالية لتصل الى ٢٣ مليون طن سنوياً. (وزارة النقل)		مشروع بناء ٨ بواخر متعددة الاغراض مختلفة الحمولة	11	2019	2029	100%	0%	0%	0%	6%	6.5 % (٢) باخرة			
		مشروع شراء بواخر صب عدد(٢)	2	2019	2020	100%	0%	0%	0%	25%	25%			
		مشروع نقل اشخاص من رصيف العشار الى جزيرة كيش وموانئ الخليج العربي وبالعكس	1	2019	2020	100%	0%	0%	0%	25%	25%	75%		
		شراء معدات مناولة للموانئ ***	11	2008	2019	99%	90%	0%	0%	5%	5%	5%		
		شراء وحدات بحرية	11	2008	2019	100%	95%	0%	0%	5%	5%		لم يتم استلام التمويل للتخصيصات المالية للمشروع لغاية الان	
		تأهيل قطاع الموانئ /المرحلة الثانية	7	2016	2022	100%	53%	6.70%	6.70%	7%	3.30%			
		مشروع تأهيل رصيف ٦ ميناء ام قصر الجنوبي)	1	2016	2019	100%	60%	10.10%	10.10%	14.90%	15%			
		مشروع تأهيل رصيف رقم ٩	1	2017	2019	100%	52%	0%	0%	24%	24%			
		مشروع تأهيل رصيف رقم ٥	1	2017	2019	100%	30%	15%	15%	25%	30%			
		مشروع تأهيل رصيف رقم ٧	1	2017	2019	100%	11%	9.90%	9.90%	34.10%	45%			
		مشروع تأهيل رصيف رقم ٤	1	2017	2019	100%	20%	4.50%	4.50%	35.50%	40%			

تم انجاز اعمال ترميم مستشفى ام قصر بنسبة ١٠٠ % المدرج ضمن العقد كمنافع اجتماعية		40%		20%	0%	0%	8%	100%	2020	2018	2	مشروع تأهيل رصيف رقم ٨
		25%		25%			0%	100%		-	2	مشروع انشاء رصيف نفطي في خور الزبير
		20%		20%			0%	100%			3	مشروع انشاء رصيف المواشي
		25%		25%			0%	100%				مشروع انشاء رصيف حاويات
		7%		16.40%	16.60%	16.60%	17%	100%		2017 (ملحق عقد)	2	تأهيل الأرصفة (١٥-١٢) وبناء أرصفة جديدة في أم قصر الشمالي
		11%		45%	4%	4%	1%	100%		2015 29/3/2018 (ملحق عقد)	2	تأهيل رصيف ١٦ ميناء أم قصر الشمالي ورصيف ٩ في خور الزبير
		5%		12%	3%	3%	15%	100%		2017	4	تأهيل رصيف رقم ١٧ مع إنشاء رصيفين جديدين في ميناء أم قصر الشمالي
								100%	2018			تأهيل رصيف رقم ١٨
		10%		9%	3%	3%	78%	100%	العمل مستمر ضمن فترة التنفيذ	2016	1	تأهيل رصيف رقم ١٩
		15%		14%	0%	0%	71%	100%	فترة التاهيل تتبع المدة المحددة لإدارة وتشغيل رصيفي ١٩،٢٠			تأهيل رصيف رقم ٢١
		5%		4%	1%	1%	صفر	50%	2024	2018	6	محطة متعددة الأغراض في قناة رقم ٢ ميناء أم قصر

إنشاء رصيف نفطي في قناة خور الزبير	2	2014		100%								العمل متوقف لحين زوال الاسباب الخاصة بتسوية تداخل ملكية الارض مع بلدية ام قصر
تأهيل الأرصفة ٢.٣.٤ في ميناء خور الزبير	1	2016	يوجد فترة تمديد للعقد	100%	75%	1%	1%	10%		14%		
تأهيل الأرصفة ٥.٦.٧ في ميناء خور الزبير	2	2016 2018 (ملحق عقد)		100%		44%	44%	20%		26%		
بناء رصيف نفطي بين الرصيفين ٤ و ٥ في خور الزبير	2	2018	2020	60%	0%			15%		15%		
بناء رصيف نفطي في ميناء خور الزبير (رصيف ١١)	2	2017	2020	100%	17%	29%	29%	4%		7%		
تأهيل رصيف ١٢ في خور الزبير	2	2017	2020	100%	35%	20%	20%	20%		20%		
أنشاء أرصفة بحرية نفطية على قناة خور الزبير	5	2017	2022	40%	0%	15%	15%	5%		20%		
تأهيل الارصفة ١.٢.٣ في ميناء أبو فلوس	2	2013 2018 (ملحق عقد)	2020	100%		18%	18%	40%		41%		
إنشاء رصيف تجاري ورصيف مسافرين في الواصلية	2	2018	2020	100%		11%	11%	20%		27%		

وزارة الاتصالات

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز - ف ٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
قطاع الاتصالات يتطلب تشريع القوانين - قانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - قانون هيئة الاعلام والاتصالات - قانون الاتصالات والمعلوماتية - قانون الجرائم الالكترونية هذه القوانين في طور التشريع في مجلس النواب					0	0	0	قانون	2019	2018	1	تشريع قانون للرقابة الالكترونية	لم تحدد	تشريع قانون للرقابة الإلكترونية وتأمين متطلبات الأمن السيبراني
تم مفاتحة دولة رئيس الوزراء بموجب كتابنا (٢٨/٣٢٤٦) في ٣١/٣/٢٠١٩ لحسم موضوع عائدية المشروع					0	0	0	4 مليون مشترك	2021	2019	3	الهاتف النقال 4G	متوسط	طرح الجيل الرابع من الهاتف النقال 4G بمشاركة الوزارة والقطاع الخاص
					0	0	0.6 مليون مشترك	4.6 مليون مشترك	2022	2018	5	مشروع الكابل الضوئي (بالمشاركة)	متوسط	اكمال متطلبات مشروع الكابل الضوئي وبجدول زمني واضح وتصحيح الخطأ والخسائر التعاقدية السابقة
وحدة القياس للمستهدف هي اللامدا (الطول الموجي)		40		30	15	15	35	500	2022	2010	13	تسويق البنى التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص	متوسط	مضاعفة سعة وسرعة شبكة الانترنت خصوصاً في استعمالاتها في البحث والتطوير وانجاز المعاملات

تم استكمال مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع الممول من القرض الياباني وسيتم الاعلان العالمي لمشاركة التشغيل والصيانة من قبل شركات عالمية رصينة		75764		200000	150000	150000	2.7 مليون مشترك	4015623	2021	2018	5	زيادة نسبة انتشار الهاتف الضوئي الثابت، والهاتف اللاسلكي	طويل الأمد	اعادة خدمة الهاتف الأرضي وربطه بشبكة الانترنت واعادة ثقة المواطن به كمنافس لشبكات الهاتف المحمول
تم تقديم الاستشارة للوزارات في موضوع الحكومة الالكترونية من خلال عضوية وزارتنا في لجنة الامر الديواني رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٦					100	100	80%	100%	2019	2010	9	ربط الدوائر في بغداد والمحافظات لاسلكياً (LTE)	سريع	تقديم الاستشارة الخدمية لكافة وزارات ودوائر الدولة لانجاز الحوكمة الالكترونية في كافة مرافق الدولة وخصوصا المصارف والدفع الالكتروني ودوائر التسجيل العقاري وقوى الامن الداخلي والدفاع
تمت الاحالة لتوسيع وتطوير احدى الشبكات الضوئية		20		20	0	0	0	ثلاثة شبكات ضوئية	2023	2019	5	تطوير وتوسيع الشبكات الضوئية		

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز - ف ٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
لا يمكن تحديد نسب المستهدف لعدم احالة المرحلة الأولى الحقول الغير مستوفية البيانات سيتم توفيرها عند التعاقد							0%	100%	-	-	-	مشروع ماء البصرة الكبير(بمراحله الأربعة)/البصرة	لم تحدد	التعاقد بأسرع وقت مع احدى الشركات العالمية الكبرى لإنجاز مشروع تحلية مياه البحر في البصرة على ان تنجز بجداول زمنية واضحة، ويعكس نفس الامر على المحافظات الجنوبية الاخرى التي تعاني من ملوحة المياه بشكل اقل
الشركة مملوكة وتعهدت بانجاز المشروع وتشغيله في ٢٠٢٠\٣\٣١		25%		5%	4.00%	5%	15%	0	2019	2016	2	مشروع ماء البصرة الكبير/المرحلة الثانية		
المستهدف الكلي للسنتين ١٠٠%														
العمل مستمر المستهدف الكلي لثلاث سنوات ١٠٠%		4%		5%	1%	4%	86%	0	2018	2014	3	مشروع ماء البصرة الكبير/المرحلة الثالثة		
العمل مستمر الكلي لأربع سنوات ١٠٠%		3%		5%	2%	3%	87%	0	2018	2014	4	مشروع ماء البصرة الكبير/المرحلة الرابعة		
المشروع متوقف ولم يتم المباشرة لأن فترة التنفيذ ٤ سنوات وليس ٣ سنوات كما ارسل اليكم بالبرنامج المعدل سابقا قيد المصادقة لتكليف شركة المعتصم لغرض تنفيذ الجسر عند ورود التمويل		35%		30%	6%	7%	17,72%	100%	2022	2018	3	انشاء جسر شمال الناصرية ومقترياته	طويل	انجاز طرق حلقية لمدن العراق الكبيرة (RING ROAD) وبجدول زمني واضح ومن ذلك اكمال الطرق الحلقية المتوقفة وغير المكتملة ومنها الطريق الحلقى السرير للعاصمة بغداد
		2%		3.00%	60%	60%	58%	100%	2022	2018	4	انشاء جسر الكوت الثاني ومقترياته (جسر الكارضية والطريق الحولي بطول ٣٠ كم محافظة واسط		

		1%		1%	0%	1%	97%	100%		2005	اشهر 6	المجمع السكني في ذي قار / حي الصدر	سريع	البدء ببناء وحدات سكنية تقلص بشكل واضح الفجوة بين العرض والطلب وتوزيعها على العوائل المسجلة تحت خط الفقر في سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي لا تمتلك دار سكن لائقة
وما تبقى من نسبة إنجاز تكون للشهرين الأخيرين من العام وبانتظار التمويل لبدا العمل		1%		1%	0%	1%	95%	100%		2008	10 اشهر	المجمع السكني في النجف / حي القدس		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	19,3%	100%		2012	4	المجمع السكني في كربلاء/ الجزيرة (١)		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	71,3%	100%		2010	3	المجمع السكني في صلاح الدين / مطاردة		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	63,1%	100%		2005	3	المجمع السكني في ديالى / الغالبية		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	35,5%	100%		2011	4	المجمع السكني في نينوى / الأرجبة		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	52,8%	100%		2010	3	المجمع السكني في ديالى / الكاطون		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	55,5%	100%		2011	3	المجمع السكني في الديوانية / الدغارة		
تكون الفترة المحددة ٤ بدل ٣ لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	32,3%	100%		2011	3	المجمع السكني في المثنى/ الجربوعية		
تكون الفترة المحددة ٢ بدل ٣ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل		8%		7%	0%	5%	60%	100%		2010	3	المجمع السكني في البصرة / شط العرب (١)		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	33,9%	100%		2014	4	المجمع السكني في الفلوجة / الجبيل و الخراب		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	66,3%	100%		2011	3	مؤسسة الشهداء /المجمع السكني في البصرة / الصبخ		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	3,9%	100%		2014	4	مؤسسة الشهداء /المجمع السكني في البصرة / شط العرب (٣)		
تكون الفترة المحددة ٣ بدل ٤ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل		8%		8%	0%	5%	33,2%	100%		2012	4	مؤسسة الشهداء /المجمع السكني في البصرة / شط العرب (٢)		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	65,7%	100%		2012	3	مؤسسة الشهداء /المجمع السكني في البصرة / الزبير		
تكون الفترة المحددة ٢ بدل ٣ ويوجد تصحيح في الواقع الحالي تكون النسبة ٥٠% بدل ١٠,٦% لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل		8%		8%	0%	5%	51,6%	100%		2011	3	المجمع السكني في كربلاء / الجزيرة (٢)		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	4%	100%		2012	4	المجمع السكني في صلاح الدين / عرموشية (١)		
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدا العمل		0%		0%	0%	0%	29%	100%		2011	2	المجمع السكني في قضاء مخمور		

المجمع السكني في الانبار / هيت	2	2011		100%	84%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في الانبار / عنه	2	2012		100%	96,6%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في ذي قار / سوق الشيوخ	4	2012		100%	32,4%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في المثنى / الرميثة	3	2012		100%	47,9%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في الديوانية / الحمزة	4	2012		100%	36,6%	5%	0%	7%	7%	تكون الفترة المحددة ٣ بدل ٤ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل
المجمع السكني في بابل / الفاسم	4	2012		100%	10,8%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في ديالى / الخالص	4	2013		100%	23,9%	5%	0%	7%	7%	تكون الفترة المحددة ٣ بدل ٤ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل
المجمع السكني في ذي قار / الشرطة	3	2013		100%	61,3%	5%	0%	7%	7%	تكون الفترة المحددة ٢ بدل ٣ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل
المجمع السكني في الديوانية / حي الإسكان	4	2012		100%	39%	5%	0%	7%	8%	تكون الفترة المحددة ٣ بدل ٤ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل
المساكن الاقتصادية / المجمع السكني في ذي قار / كشمرة ١	4	2014		100%	1,08%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المساكن الاقتصادية / المجمع السكني في واسط / الدبوني	4	2014		100%	14,4%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المساكن الاقتصادية / المجمع السكني في بغداد / نهروان ٢	4	2014		100%	18,6%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في نينوى / قضاء سنجار	3	2013		100%	41%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في نينوى / قضاء تلعفر	4	2015		100%	28%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في واسط / العزيزية	3	2013		100%	52,2%	5%	0%	6%	7%	تكون الفترة المحددة ٢ بدل ٣ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل
المجمع السكني في واسط / زرباطية	3	2013		100%	31,7%	0%	0%	0%	0%	تكون الفترة المحددة ٤ بدل ٣ لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في ميسان / البتيرة (أورمانة)	3	2012		100%	44,7%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل
المجمع السكني في ميسان / المجر	2	2012			73%	0%	0%	0%	0%	لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الانجاز مرتبط ببدء العمل

لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	39%	100%		2013	3	واطنة الكلفة / المجمع السكني في الديوانية / الجيسة - الشامية
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	5,8%	100%		2014	4	واطنة الكلفة / المجمع السكني في ذي قار / عككة
يوجد تصحيح في الواقع الحالي تكون النسبة ١٢,١% بدل ١١,١% لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	11,1%	100%		2014	3	واطنة الكلفة / المجمع السكني في المثنى / طحربة
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	7,6%	100%		2014	3	واطنة الكلفة / المجمع السكني في الديوانية / السنبة
يوجد تصحيح في الواقع الحالي تكون النسبة ٢٥% بدل ٢٥% لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	25%	100%		غير مباشر به	4	واطنة الكلفة / المجمع السكني في الديوانية / الشناقفة
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	56,9%	100%		2011	3	المجمع السكني في البصرة / حي القبلة
تكون الفترة ٢ بدل ٣ لم تسجل نسبة وتاريخ إنجاز لعدم ورود التمويل	7%		6%	0%	5%	43,5%	100%		2012	3	المجمع السكني في واسط / الصويرة
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	52,3%	100%		2013	3	المجمع السكني في ذي قار / قلعة سكر
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	37,3%	100%		2013	4	المجمع السكني في ميسان / الكميت
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	4,2%	100%		2014	4	المجمع السكني في ميسان / قلعة صالح
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	33,7%	100%		2014	3	المجمع السكني في الديوانية / عفك
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%	12,8%	100%		2014	4	المجمع السكني في ميسان / مؤسسة الشهداء
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%						المجمع السكني في صلاح الدين / سامراء (١)
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%						المجمع السكني في الانبار / الكرابلة
لا يوجد تخصيص مالي لهذا العام وتاريخ الإنجاز مرتبط ببدء العمل	0%		0%	0%	0%						المجمع السكني في كربلاء / الحديبية (١)
	3%		2%	5%	5%	68,39%	100%	2022	2018	4	انشاء المرور السريع رقم (١) جزء ط٦ الممر الايمن ومدخل السماوه الفرعي

الاحمال طريق المرور السريع وتأهيله على ان يكتمل التأهيل وتتكامل هذه المسؤولية المشتركة مع وزارة النقل	متوسط /طويل	انشاء المرور السريع ط٦ جزء ديوانية / ناصرية (الممر الايسر)	2	متوقف	/	100%	93,01%	0%	0	2%		2%	المشروع ليس له تغطيه مالية ضمن خطة عام /٢٠١٩ مدة التنفيذ سنة وليس سنتين في حالة توفر التخصيص متوقف على قرار ٣٤٧
		ربط المرور السريع رقم (١) بمدينة (حلة /كيش) بطول ١٣ كم محافظة بابل	3	2018	2020	100%	91,49%	2%	3%	2.00%		2%	فترة التنفيذ سنتين وليس ٣سنوات كما ارسل اليكم بالبرنامج المعدل سابقا
		ربط المرور السريع رقم (١) المرحلة الاولى ط/٤ وط/٥	4	2018	2021	100%	13%	9%	9%	6%		5%	لم يتم المباشرة في مقاوله طء ضمن المشروع لسحب العمل منه
اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب أخرى	لم تحدد	مشروع ماء كركوك-المرحلة الثانية/ كركوك(١٠٠٠م٣/ساعة)	1	2010	2016	100%	87%	5%	4%	3%		3%	
		مشروع ماء الكوت/ واسط(١٠٠٠م٣/ساعة)	1	2012	2015	100%	54%	6%	6%	15%		20%	
		مشروع ماء الزبيدية/ واسط(١٠٠٠م٣/ساعة)	1	2013	2015	100%	62%	6%	8%	10%		15%	
		مشروع ماء الهاشمية- المدحتية/ بابل(٦٠٠م٣/ساعة)	1	2014	2015	100%	90%	5%	3%	2%		3%	
		مشروع ماء المسيب- الاسكندرية-جرف الصخر/ بابل(٦٠٠م٣/ساعة)	2	2013	2016	100%	35%	10%	4%	5%		5%	
		مشروع ماء قري الحلة- المحاويل/ بابل(١٠٠٠م٣/ساعة)	1	2011	2015	100%	93%	0%	0%				
		مشروع ماء ابي غرق/بابل(٤٠٠م٣/ساعة)	1	2013	2016	100%	95%	3%	1%	2%			
		مشروع ماء النجف-كوفة/ النجف(١٦٠٠م٣/ساعة)	2	2016	2016	100%	49%	6%	6%	11%		5%	
		مشروع ماء السماوة/ المثنى(١٠٠٠م٣/ساعة)	2	2012	2015	100%	48%	7%	1%	5%		5%	
		مشروع ماء الاصلاح – الجبايش/ ذي قار(٣٠٠م٣/ساعة)	1	2013	2016	100%	الكلي(٩٣,٥) % الاعمال التكميلية(٤) %٦	24%	7%	10%		15%	
		مشروع ماء العمارة/ ميسان(١٦٠٠م٣/ساعة)	1	2008	2014	100%	89%	3%	2%	1%		2%	
		مشروع ماء النهروان/ بغداد(٤٠٠م٣/ساعة)	1	2012	2015	100%	67%	8%	7%	5%		15%	

		2%		5%	5%	5%	88%	100%	2011	2009	1	مشروع ماء الحسينية/م٢/ بغداد(١٠٠٠م٣/ساعة)
		20%		10%	12%	12%	53%	100%	2015	2012	1	مشروع ماء ناحية الزهور المركزي/ بغداد (١٠٠٠م٣/ساعة)
					0%	0%	52%	100%	2014	2011	2	مشروع ماء القوش/ نينوى (٢٠٠٠م٣/ساعة)
		1%		22	2%	2%	18%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء (القيارة، الشورة، تل عبيطة)/ نينوى(٣٠٠٠م٣/ساعة)
		23		22	0%	0%	15%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء تازة/ كركوك (٢٠٠٠م٣/ساعة)
		0		0	0%	0%	48%	100%	2015	2011	2	مشروع ماء خان بني سعد/ ديالى (٤٠٠٠م٣/ساعة)
		5%		13%	2%	2%	5%	100%	2016	2012	2	مشروع ماء جديدة الشط/ ديالى(٢٠٠٠م٣/ساعة)
		5%		5%	3%	3%	62%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء السادة الجبور/ ديالى(٢٠٠٠م٣/ساعة)
		5%		60	0%	0%	50%	100%	2015	2013	2	مشروع ماء السلام والسراجق والمنصورية/ ديالى(٤٠٠٠م٣/ساعة)
		5%		25	0%	0%	16%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء الدجيل/ صلاح الدين(٤٠٠٠م٣/ساعة)
		0		0	0%	0%	36%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء بلد/ صلاح الدين (٤٠٠٠م٣/ساعة)
		5%		15	4%	4%	6%	100%	2014	2012	2	مشروع ماء القادسية/ صلاح الدين (٣٠٠٠م٣/ساعة)
		0		0	0%	0%	42%	100%	2014	2013	2	مشروع ماء الفلوجة/ الانبار(٤٠٠٠م٣/ساعة)
		5		65	2%	2%	58%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء البغدادى- الدولاب/ الانبار(٣٠٠٠م٣/ساعة)
		5%		5%	2%	2%	28%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء ناحية الكفل/ بابل(٤٠٠٠م٣/ساعة)

		2%		40	1%	1%	37%	100%	2017	2013	2	مشروع ماء الخيرات/الجدول الغربي/ كربلاء(٤٠٠٠م٣/ساعة)
		0		0	0%	0%	52%	100%	2016	2011	2	مشروع ماء الشامية/ القادسية (٤٠٠٠م٣/ساعة)
		5%		25	0%	0%	16%	100%	2015	2012	2	مشروع ماء الناصرية /٢م/ ذي قار(١٠٠٠م٣/ساعة)
		18%		16%	83.00%	66.00%	0%	100%	2018	2011	1	مقاولة تصميم وتنفيذ تجهيز مجاري الحمداية (تسليم مفتاح)
		12%		11%	40%	42%	0%	100%	2015	2012	2	مشروع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة /الجانب الأيسر لمدينة الموصل (المرحلة الأولى) في محافظة نينوى
		12%		13%	29%	35.00%	0%	100%	2015	2013	2	مشروع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة /الجانب الأيسر لمدينة الموصل (المرحلة الثانية) في محافظة نينوى
		2%		2%	26.00%	96.00%	0%	100%	2014	2012	1	مشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطرية مع محطتي الرفع (SL46وSL47)
		14%		10%	16.00%	51.00%	0%	100%	2015	2013	2	مناقصة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع اربع محطات رفع لمدينة الموصل /الجانب الايسر/المرحلة الرابعة
		0%		0%	68.00%	100%	0%	100%	2017	2012	1	تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة مجارى برطلة /نينوى بطاقة تصميمية (٤٩٤٢م٣/يوم
		27%		22%	5%	1.00%	0%	100%	2015	2013	2	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الايمن ١ م (line one)

		18%		30%	3.00%	2.00%	0%	100%	2015	2013	2	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الايمن م٢ line two
		0%		0%	3.00%	100%	0%	100%	2017	2012	1	تنفيذ محطة معالجه مع شبكات الإمطار والمجاري الثقيلة الفرعيه والرئيسية لمحطات الرفع في مركز محافظه كركوك مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى لمحطة المعالجة (تسليم مفتاح)
		0%		0%	96.00%	100%	0%	100%	2018	2008	1	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري بعقوبة بطاقة تصميمية (٤٨٨٠٠ م٣/يوم
		0%		0%	74%	100%	0%	100%	2014	2012	1	مناقصة تنفيذ الأعمال التكميلية لنواقص شبكة مدينة بعقوبة/ديالى
		20%		25%	6.00%	10.00%	0%	100%	2016	2012	2	مناقصة أعداد دراسة وتصاميم مشروع مجارى (محطة معالجة مع شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع)مدينة بعقوبة /الجانب الغربي في محافظة (ديالى) مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى (تسليم مفتاح)
		13%		19.00%	31.00%	28.00%	0%	100%	2015	2012	2	أعداد الدراسة والتصاميم لمشروع معالجه مع شبكات مجاري الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعيه والرئيسية ومحطات الرفع لمدينه الخالص مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى من المشروع (تسليم مفتاح)

		20%		40%	40%	40%	0%	100%	2014	2012	1	أعداد دراسة وتصاميم مشروع شبكات مجارى الأمطار والثقيلة (الفرعية والرئيسية مع محطات الرفع (للأحياء الغير مخدومة في مدينة الدجيل في محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع (تسليم مفتاح)
		7%		7%	58%	59%	0%	100%	2014	2012	2	أعداد دراسة وتصاميم محطة معالجة مجارى مدينة تكريت م٢ في محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية لمحطة المعالجة (تسليم مفتاح بطاقة تصميمية (٣٦٠٠٠)م٣/يوم
		18%		25%	50%	22%	0%	100%	2015	2012	2	أعداد دراسة وتصاميم محطة معالجة مجارى مدينة بلد م٢ في محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية لمحطة المعالجة (تسليم مفتاح) بطاقة تصميمية (٨٥٠٠)م٣/يوم
		0%		0%	62%	100%	0%	100%	2014	2011	1	مشروع مجارى الفلوجة بطاقة (٣٥٠٠٠) م٣/يوم
		2%		0.00%	82.00%	98%	0%	100%	2018	2011	1	مشروع مجارى الرمادي م١ بطاقة (١٠٠٠٠٠) م٣/يوم
		0%		0%	99.00%	100%	0%	100%	2012	2007	1	تنفيذ شبكه مجاري الكوت
		0%		0%	67.00%	100%	0%	100%	2018	2013	1	وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات مجارى النعمانية(تسليم مفتاح)

		0%		0%	88%	100%	0%	100%	2014	2011	1	تصميم و تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات مجاري العزيمية(تسليم مفتاح)
		0%		0%	78.00%	100%	0%	100%	2018	2012	1	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة شبكات مجاري الامطار ومحطة الرفع المرحلة الاولى لمدينة الصويرة/محافظة واسط
		13%		5.00%	75.00%	82.00%	0%	100%	2019	2013	1	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة محطة المعالجة وشبكات المجاري وامطار ومحطات الرفع /المرحلة الاولى لمدينة العي/محافظة واسط
		0%		0%	96%	100%	0%	100%	2018	2012	1	مشروع اعداد الدراسة والتصاميم لشبكات الصرف الصحي والامطار ومحطات معالجة مع تجهيز وتنفيذ المرحلة الاولى لمحطات المعالجة (الصوب الكبير والصوب الصغير) لمدينة الحلة / م١
		9%		19%	28.00%	32%	0%	100%	2016	2014	2	الخطوط الناقلة لشارع الحلة - الديوانية ضمن مشروع مجاري الحلة /م٢
		13%		19%	17.00%	28%	0%	100%	2016	2014	2	الخطوط الناقلة لشارع ٦٠ ضمن مشروع مجاري الحلة /م٢
		4%		3.00%	96%	93.00%	0%	100%	2018	2008	2	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مياه المجاري لمدينة كربلاء م٢ مع تجهيز ونصب المعدات الميكانيكية والكهربائية
		8%		10%	92.00%	82%	0%	100%	2015	2009	1	تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الحر بطاقة تصميمية (٣٧٠٠٠)م٣/يوم

		0%		0%	92%	100%	0%	100%	2014	2010	1	تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر / كربلاء المقدسة تسليم مفتاح
		0%		0%	95.00%	100%	0%	100%	2017	2008	1	تجهيز وتنفيذ محطة المعالجة مع خط ناقل / م٣
		6%		2%	89.00%	92.00%	0%	100%	2017	2009	1	مناقصة تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة كربلاء / م٤
		0%		0%	80.00%	100%	0%	100%	2015	2009	1	تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري الأحياء السكنية / كربلاء المقدسة / م٤
		0%		0%	65.00%	100%	0%	100%	2014	2009	1	تنفيذ وتجهيز محطة مجارى الهندية / كربلاء المقدسة بطاقة تصميمية (٢٥٠٠٠) م٣/يوم
		0%		0%	71.00%	100%	0%	100%	2014	2011	1	تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية / كربلاء المقدسة / تسليم مفتاح
		0%		0%	80.00%	100%	0%	100%	2014	2008	1	تجهيز وتنفيذ ونصب محطة معالجة مجاري النجف / م٢ بطاقة تصميمية (١٠٠٠٠) م٣/يوم
		0%		0%	98%	100%	0%	100%	2017	2014	ستة أشهر	تجهيز وتنفيذ وفحص وتشغيل الخط المغذي لمحطة معالجة ٣٣KV مجاري النجف م٢
		0%		0%	99.00%	100%	0%	100%	2018	2013	1	مشروع تدقيق التصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مجاري الثقيلة والامطار مع محطات رفع مدينة النجف الاشرف / م(٢-٣)
		0%		0%	51.00%	100%	0%	100%	2017	2011	1	مشروع مجاري الديوانية م٢ بطاقة (١٠٠٠٠) م٣/يوم
		0%		21%	88%	79.00%	0%	100%	2016	2012	1	تجهيز وتنفيذ شبكة مجارى مع محطات الرفع (٥امطار+٤ ثقيلة) لقضاء الرميثة

		8%		3%	72.00%	89.00%	0%	100%	2015	2009	1	تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة الناصرية(صوب الجزيرة بطاقة تصميمية (٧٠٠٠)م٣/يوم +صوب الشامية بطاقة تصميمية (٦٥٠٠)م٣/يوم)
		18%		6%	55%	76.00%	0%	100%	2015	2012	1	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات مجاري الناصرية
		100%		100%	55%	100%	0%	100%	2016	2013	2	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الرفاعي بطاقة تصميمية (٦٠٠٠) م٣/يوم
		12%		13%	61.00%	50.00%	0%	100%	2016	2012	2	أعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري (محطة معالجة مع شبكات مجاري الأمطار ومجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع لمدينة ألسطهر مع تجهيز وتنفيذ وصيانة المرحلة الأولى للمشروع (تسليم مفتاح)
		0%		0%	30.00%	100%	0%	100%	2014	2011	1	مشروع تصميم وتنفيذ وتجهيز وصيانة مجاري الزبير (تسليم مفتاح) بطاقة تصميمية (١٢٠٠٠)م٣/يوم
		30%		20%	29.00%	30%	0%	100%	2016	2013	2	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة المعالجة (مركز تصفية حمدان ٥م)
		15%		12%	52%	48%	0%	100%	2016	2013	2	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة المعالجة (مركز تصفية حمدان ٤م)
		0%		0%	93.00%	100%	0%	100%	2017	2011	1	مشروع مجاري الحسينية بطاقة (٦٥٠٠)م٣/يوم (تسليم مفتاح)

				0%	0%	51.00%	100%	0%	100%	2014	2013	1	أعداد دراسة وتصاميم مشروع مجارى محطة المعالجة مع شبكات الأمطار والمجارى الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع لناحية الرشيد (محافظة بغداد) مع تجهيز وتنفيذ وصيانة المرحلة الأولى للمشروع (تسليم مفتاح)		
			0%	0%	93%	100%	0%	100%	2016	2012	ستة أشهر	اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري سوق الشيوخ			
			0%	0%	50%	100%	0%	100%	2014	2013	ستة أشهر	اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري الصينية			
			0%	0%	100%	100%	0%	100%	2013	2013	أربعة أشهر	اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري الاسكندرية والمسيب			
			0%	0%	100%	100%	0%	100%	2017	2014	1	تنفيذ بناية مركز مجاري المناذرة			
			0%	0%	60%	100%	0%	100%	2013	2012	1	تنفيذ بناية مركز مجاري راوة			
			0%	0%	82.00%	100%	0%	100%	2014	2012	1	تنفيذ بناية مركز مجاري برطلة			
يتم تحديد حجم العمل وفقاً لوجود حاجة لذلك			متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	63%	100%	متعدد	متعدد	متعدد		تاهيل وصيانة الطريق والجسور في المحافظات	سريع	انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسابها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات وتقديم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات
فترة التنفيذ سنتين وليس ٣سنوات كما ارسل اليكم بالبرنامج المعدل سابقا			10%	10%	14%	14%	37%	100%	2020	2018	3	انشاء الممر الثاني لطريق ديوانية - عفك - آل بدير بطول ٥٢ كم			
			9%	10%	6%	6%	50%	100%	2020	2018	2	انشاء الممر الثاني لطريق الشوملي -المدحتية / هاشمية بطول ٣٨ كم			
تاريخ الانجاز لغاية ٢٠٢١			8%	10%	8%	9%	18%	100%	2020	2018	3	انشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس -الحمزة ٦٢ كم			
تاريخ الانجاز لغاية ٢٠٢٢/بسبب تاخر المقاول باستئناف العمل			5%	10%	5%	10%	11%	100%	2021	2018	4	انشاء الممر الثاني لطريق (كوت -بدره -مهران) بضمينه جسر (كلالة -بدره) بطول ٧٦ كم			

انشاء جسر الفلوجة الثالث	3	2018	2020	100%	69%	10%	12%	10%		5%	ان جسر من مشاريع المستمره حيث تم تخصيص مبلغ ضمن خطة عام /٢٠١٩ من قبل وزارة التخطيط فترة التنفيذ سنتين
اعمار الجسور وتأهيل الطرق المتضررة (جسر الرضوانية على المرور السريع)	3	متعدد	متعدد	100%	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد	فترة التنفيذ سنتين وليس ٣سنوات كما ارسل اليكم بالبرنامج المعدل سابقا
اعادة اعمار جسر الفيحاء في البصرة	2	متوقف	متوقف	100%	98,59%	0%	0%	1.00%		1%	فترة التنفيذ سنة وليس سنتين كما ارسل اليكم بالبرنامج المعدل سابقا/متوقف لحين اطلاق التمويل
تأهيل جسر الكرامة في محافظة واسط	2	متوقف	متوقف	100%	90%	0%	0%	5%		5%	فترة التنفيذ سنة وليس سنتين وتم تخصيص مبلغ من قبل وزارة التخطيط وستتم الاستئناف العمل حين اطلاق التمويل
استبدال الجسور القديمة في الديوانية (جسر سومر)	3	متوقف	متوقف	100%	3%	0%	0%	30%		20%	تم تخصيص مبلغ ضمن خطة/٢٠١٩ فترة التنفيذ سنتين و نسبة الانجاز الحالي هو ٢٠ وسيتم استئناف العمل حال صدور الخطة
انشاء جسر علي الغربي	2	2018	2019	100%	84%	4%	0%	5%		5%	تم توجيه انداز الى المقاول لاستئناف العمل
انشاء الممر الثاني لطريق حرية /عباسية	1	مدرج	غير مدرج	100%	غير مدرج	0%	0%	0%		0%	لم يدرج في خطتنا
انشاء الممر الثاني لطريق يعقوبة -بني سعد -بغداد القديم بطول ٤٣ كم	2	متوقف	متوقف	100%	85%	0%	0%	3%		3%	فترة التنفيذ ٣سنوات وفترة الانجاز الحالي ٤٥ كون المرحلة الثانية تم الغاء الاحالة/واستئناف العمل حين اطلاق التمويل وهذه النسب للمرحلة الاولى حيث تخصيص مبالغ من وزارة التخطيط
انشاء مقالع ابو غارتل اللحم بطول ٤٥كم في محافظة ذي قار	2	متوقف	متوقف	100%	66%	0%	0%	5%		5%	قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل
انشاء طريق قره تبه عمر مندان /مفرق بغداد كركوك بطول ٣٣كم	3	متوقف	متوقف	100%	58,7%	0%	0%	5%		6%	قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل
انشاء طريق الحج البري بطول ٢٣٩كم على مراحل	4	متوقف	متوقف	100%	26,3%	0%	0%	3%		5%	الم يرد تخصيصه من وزارة التخطيط وكذلك متوقف على قرار ٣٤٧
انشاء طريق الرحاب /البصية بطول ١٣٤كم	4	متوقف	متوقف	100%	9%	0%	0%	6%		5%	قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل
انشاء الممر الثاني لطريق كربلاء /الرزازة الاخضر معمل بطول ٩٠كم	3	متوقف	متوقف	100%	70%	0%	0%	5%		5%	قرار ٣٤٧ ومدة التنفيذ سنتين
انشاء الممر الثاني لطريق سماوة مملحة طريق عبدالله ابو نجم بطول ١٨,٢ كم	2	متوقف	متوقف	100%	58%	0%	0%	5%		10%	قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل
انشاء جسر القرنة الثاني/ محافظة البصرة	2	متوقف	متوقف	100%	71%	0%	0%	10%		19%	فترة التنفيذ سنة وليس سنتين كما ارسل اليكم بالبرنامج المعدل سابقا وتم تخصيص مبلغ من وزارة التخطيط لغرض استئناف العمل ولم يرد التمويل لحد الان

فترة التنفيذ سنتين وليس ٣ سنوات كما ارسل اليكم بالبرنامج المعدل سابقا/لتقاطعات الجسر		3%		4%	3%	3%	88%	100%	2020	2018	3	انشاء جسر الهندية الثاني ومقترياته / محافظة كربلاء
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		5%		5%	0%	0%	48%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء جسر عز الدين / محافظة البصرة
تم المباشرة الفعليه في شهر الثاني من عام ٢٠١٩		35%		34%	31%	31%	0%	100%	2019	2018	1	الاعمال التكميلية لجسر الدراجي الكونكريتي البديل عن جسر العائم
تم تخصيص للمشروع من قبل وزارة التخطيط ولم يرد لحد الان		4%		5%	0%	0%	11%	100%	متوقف	متوقف	4	انشاء طريق دورة / يوسفية للمرور السريع بطول ١٤ كم محافظة بغداد
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		4%		3%	0%	0%	5%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء طريق راوة - الحضر
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		5%		5%	0%	0%	13%	100%	متوقف	متوقف	4	طريق تكريت الطوز البديل
المشروع متوقف على قرار ٣٤٧ علما وزارة التخطيط لم تخصص مبالغ للمشروع		5%		5%	0%	0%	36%	100%	متوقف	متوقف	3	تكملة طريق خدمة الزائرين (بغداد – جسر السكة) بطول (٢١,٧٥) كم
تم تخصيص مبلغ من قبل وزارة التخطيط بخطة عام ٢٠١٩ ولم يرد التمويل لحد الان		10%		6%	0%	0%	59%	100%	متوقف	متوقف	3	تبليط (٣٨,٥) كم طرق في مناطق احوار محافظة ذي قار/ برنامج انعاش الاحوار
تمت احالة مقطعين من المشروع ومباشرة بالعمل بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩ وتم ايقاف العمل لحين ورود التخصيص من وزارة الداخلية		5%		4%	3%	3%	0%	100%	/	لم يحال	4	الطريق الحدودي بين عرعر- عنازة بطول ٢٣٣ كم وعلى مراحل
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		5%		5%	0%	0%	47%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء طريق كسك –ربيعه بممرين والممر الثاني من ٤٢ كم -٦٧ كم
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		3%		3%	0%	0%	91%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء الممر الثاني لطريق بعقوبة – خانقين – المنذرية
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		3%		3%	0%	0%	10%	100%	متوقف	متوقف	4	انشاء الممر الثاني لطريق رمادي - حديثة بطول ١٤٠ كم (المرحلة الاولى)
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		6%		5%	0%	0%	70%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء الممر الثاني لطريق مدخل الصويرة مع انشاء جسر ثاني على نهر دجلة بطول ٢ كم من تقاطع بمستويين (جسر ضمن الطريق)

قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		3%		3%	0%	0%	22%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء الممر الثاني لطريق المؤدي الى قضاء الطارمية بطول ١٥ كم
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		5%		5%	0%	0%	30%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء الممر الثاني لطريق منفذ الشيب الحدودي / تقاطع (عمارة - طيب - مشر - كحلاء) - الحدود الايرانية بطول (١٣٥,٤٤) كم
تم تخصيص مبلغ ضمن خطة/٢٠١٩ من قبل وزارة التخطيط لاستئناف العمل لحين اطلاق التمويل		5%		5%	0%	0%	33%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء جسر حديثة ومقرياته / محافظة الانبار
قرار ٣٤٧ ومدة التنفيذ سنة				1%	0%	0%	99%	100%	متوقف	متوقف	2	انشاء جسر العامرية في الفلوجة /محافظة الانبار
		5%		5%	0%	0%	14%	100%	متوقف	متوقف	3	استبدال الجسور العائمة لستة مواقع (المرحلة الثانية) جسر السندية
		5%		5%	0%	0%	82%	100%	متوقف	متوقف	2	استبدال الجسور العائمة بجسور ثابتة (المرحلة الثالثة)
المشروع سحب عمل عليه لم يرد تخصيص من وزارة التخطيط					0%	0%	90%	100%	متوقف	متوقف	2	اكمال انشاء جسورال حفاظ على المصب العام / محافظة ذي قار
المشروع متوقف بقرار ٣٤٧ ولم يرد تخصيص من وزارة التخطيط		5%		3%	0%	0%	9%	100%	متوقف	متوقف	4	انشاء جسر الموصل السادس ومقرياته طول الجسر ٥٠٠ م وطول المقتريات ٢٦ كم
تم تخصيص مبلغ ضمن خطة/٢٠١٩ من قبل وزارة التخطيط لاستئناف العمل لحين اطلاق التمويل		5%		3%	0%	0%	13,50%	100%	متوقف	متوقف	3	انشاء جسر تكريت الكونكريتي (جسر شمال تكريت) ومقرياته
قرار ٣٤٧ المشروع تم انهاء رضائيا					0%	0%	26%	100%	متوقف	متوقف	2	اعادة تاهيل وتطوير طريق شط العرب ناحية عتبة (بطول (١٩,٢٥) كم
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		5%		3%	0%	0%	0%	100%	متوقف	متوقف	4	تعريض وتأهيل الطريق العام كوت - بغداد ضمن محافظة واسط و بطول (120 كم
قرار ٣٤٧ مدة التنفيذ سنة ولم يرد تخصيص من قبل وزارة التخطيط		2%		2%	0%	0%	96%	100%	متوقف	متوقف	2	تطوير وتوسيع طرق بغداد- كربلاء المقدسة

قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل					0%	0%						انشاء محطات وزن الشاحنات التجارية على شبكة الطرق والجسور بواقع (٧٥) محطة في المحافظات عدا اقليم كردستان
لم يتحصل الموافقه على ادراج ضمن خطة الدائرة		متعدد		متعدد	متعدد	متعدد						قرض اعادة اعمار المناطق المحررة من الارهاب والممولة من البنك الدولي ومتطلباته
لم يتحصل الموافقه على ادراج ضمن خطة الدائرة		0%		0%	0%	0%			2020			المشاريع التي تمول من القرض الالماني KFW جسر القيارة
لم يتحصل الموافقه على ادراج ضمن خطة الدائرة		0%		0%	0%	0%			2019			جسر المرعي الحدود ، المثنى الاول
قرار ٣٤٧ وفي طور إيجاد الحلول لأستئناف العمل		5%		5%	0%	0%						انشاء جسر الزوية و مقترياته
المشروع منجز					100%	100%						انشاء الممر الثاني لطريق بغداد - كركوك بجزيئه سليمان بيك / العظيم و سليمان بيك / داقوق
بسبب وجود الاندثارات في النفق كون المشروع كان متوقف منذ سنة ٢٠١٣		9%		10%	5%	10%	71%	100%	2019	2010	1	انشاء تقاطعات مجسرة في الرمادي (ساحة الزيوت)
		15%		15%	2%	2%	38%	100%	2020	2014	2	انشاء تقاطع مجسر في محافظة المثنى /تقاطع القدس
		25%		30%	7%	7%	8%	100%	2020	2014	2	انشاء تقاطع مجسر في محافظة ذي قار /تقاطع الاسكان
		25%		20%	0%	0%	35%	100%	2020	2013	2	انشاء تقاطعات مجسرة في محافظة ميسان / عدد ٢)المرحلة الاولى-تقاطع الكرامة ، المرحلة الثانية تقاطع البتيرة (
		20%		12%	0%	0%	16%	100%	2020	2013	2	انشاء تقاطع مجسر في محافظة صلاح الدين /تقاطع الدلة

		20%		15%	0%	0%	1%	100%	2020	2013	2	تقاطع مجسر الاوقاف في الرمادي – ادراج جديد ٢٠١٣
		20%		13%	0%	0%	77%	100%	2019	2013	1	تبليط الشوارع وتطوير الاحياء السكنية (الزهراء والبتول) قضاء . علي الغربي محافظة ميسان – (جديد)
تاريخ الانجاز ٣١/١٢/٢٠٢٠ عدد سنوات الانجاز سنتين وليست سنة واحدة		25%		15%	0%	0%	21%	100%	2019	2013	1	تبليط الشوارع وتطوير الاحياء السكنية في مدينة النجف/ محافظة النجف – (جديد)
تمت الاحالة وبانتظار توقيع العقد		20%		10%	0%	0%		100%		2013	/	تبليط الشوارع وتطوير الاحياء السكنية في مدينة الكوت/واسط- (جديد)
سحب عمل					0%	0%	0%	100%		2013		اعداد الدراسات المرورية ودراسات النقل الشامل للمدن/الحلة
سحب عمل					0%	0%						اعداد الدراسات المرورية ودراسات النقل الشامل للمدن/ البصرة
سحب عمل					0%	0%						اعداد الدراسات المرورية ودراسات النقل الشامل للمدن/ الكوفة
منجز					100%	100%	100%	100%	منجز	2013	1	تبليط شوارع في قضاء الميمونة – ادراج جديد ٢٠١٣
تاريخ الانجاز ٣١/١٢/٢٠١٩		2%		5%	7%	7%	86%	100%	2018	2013	1	تبليط شوارع في ناحية الزهور – ادراج جديد ٢٠١٣
		4%		5%	8%	8%	83%	100%	2019	2013	1	تبليط شوارع في قضاء الهندية – ادراج جديد ٢٠١٣
دعوى قضائية					0%	0%	37%	100%	2019	2013	1	تبليط وتاهيل شوارع ناحية امرلي
تاريخ الانجاز ٣١/١٢/٢٠٢٠ عدد سنوات الانجاز سنتين وليست سنة واحدة		30%		30%	0%	0%	10%	100%	2019	2013	1	تبليط الشوارع في قضاء الطوز
		20%		20%	0%	0%	23%	100%	2020	2014	2	تقاطع الجمهورية المجسر /الديوانية
تاريخ الانجاز ٣١/١٢/٢٠٢٠ عدد سنوات الانجاز سنتين وليست سنة واحدة		20%		10%	0%	0%	5%	100%	2019	2015	1	تطوير الشوارع والارصفة والجزرات الوسطية في بلد

وزارة الشباب والرياضة

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - فء (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
اعداد مسوده مقترح قانون لصندوق تنمية الشباب ورفعته الى الساده اعضاء هيئة الرأي لغرض المناقشة		5%		10%	10%	10%	10%	100%	2023	2018	6	انشاء صندوق سيادي لتنمية الشباب في المجالات كافة	لم تحدد	وضع الاجراءات العملية لتحسين الشباب العراقي ومساعدتهم لاكتشاف قابلياتهم وكفاءاتهم
		10%		5%	5%	5%	0%	100%	2023	2008	6	تمكين الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل		واصالتهم وللاتباع عن السلوكيات والعادات المضرة صحياً واخلاقياً ،
مستمر التنسيق مع الجهات المعنية		5%		5%	0%	0%	0%	100%	2022	2018	5	تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة للشباب بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف المحلية والمنظمات الدولية		واعادة تفعيل عمل المؤسسة الشبابية في مهمة كسب وتنظيم ورعاية الشباب لممارسة هواياتهم الثقافية والفنية والعلمية والرياضية وتحفيز المواهب المتميزة متهم كل في حل
		40000		30000	30000	30000	50000	100%	2022	2009	24	تعزيز الشعور الوطني لدى الشباب ومشاركتهم الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية		تخصصه ، ونشر ثقافة العمل الطوعي لتنمية القابليات البشرية والمجتمعية وفي
عدم وجود تخصيص		10%		5%	2%	5%	5%	100%	2022	2018	5	تنفيذ برامج وانشطة الخطة الخمسية لقطاعي الشباب والرياضة ٢٠١٨-٢٠٢٣		خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية والانسانية،
		0%		25%	25%	25%	50%	100%	2019	2018	2	اعداد رؤية ٢٠٣٠ للشباب للسنوات العشر القادمة وبما ينسجم مع الهيئة الديمقراطية والتنمية المستدامة		
		10%		15%	25%	25%	50%	100%	2019	2018	2	اعداد مسح شامل للشباب العراقي ليتم وضع سياسات وبرامج للشباب على كافة المستويات		

		80		80	70	70	180	400	2022	2009	14	عقد الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الشباب والرياضة	والسعي الجاد لوضع المادة ٣٦ من الدستور موضع التنفيذ ونشر الممارسة الرياضة في الاوساط الاجتماعية ولكل الشرائخ والاعمار لما في ذلك من فوائد اقتصادية وصحية وتربوية ونفسية وامنية
عدم وجود تخصيص		6		5	0	5	8	40ظاهرة	2022	2018	5	رصد مجموعة من الظواهر السلبية في شريحة الشباب ووضع الحلول الناجعة	
عدم وجود تخصيص		5%		10%	0%	10%	5%	100%	2022	2019	4	تنشيط منتديات الشباب والرياضة في محافظات العراق من خلال رسم خطط وبرامج لمنتديات الشباب والرياضة بالتعاون بين الوزارة والمحافظات وفق البرنامج الحكومي وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الانشطة	
عدم وجود تخصيص		16		16	0	0	0	42نشاط	2020	2018	3	تنفيذ مشروع بغداد عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٠	
غير مستهدف في الفصل الأول		25000		25000	0	0	3500	250000 مستهدف	2022	2018	5	مشروع بناء السلام (برامج وتدريبات وورش حول السلام وتقنياته واعادة اللجمة الوطنية بين فئات المجتمع)	
		250		250	1319	500	2250	3000 موظف	2022	2008	15	التطوير المؤسسي من خلال برامج وورش تدريبية لرفع كفاءة الموظفين لتقديم خدمة افضل	
		5%		5%	5%	5%	5%	100%	2022	2012	11	اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية	
		10%		5%	5%	5%	5%	100%	2022	2019	4	اكتشاف ورعاية المواهب العلمية	
		10%		5%	5%	5%	5%	100%	2022	2018	5	اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية	
عدم وجود تخصيص		10%		10%	2%	5%	0%	100%	2022	2019	4	صناعة القيادات الشبابية (تنفيذ برامج وانشطة وورش لصناعة القيادات الشبابية)	

		50%		50%	0	0	0%	100%	2019	2019	1	البرنامج والانشطة الاسلامية المستضافة في العراق ٢٠١٩		
غير مخطط له ضمن الفصل الاول		7%		3%	0%	0%	0%	100%	2022	2019	4	تأسيس الاكاديميات والمراكز العلمية (اكاديمية الشباب للطيران، مركز الاردوبيو، مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات، المركز العلمي للتميز والابداع)		
		25%		25%	50%	50%	0%	100%	2019	2019	1	اعداد تعليمات العمل التطوعي		
		5%		5%	10%	10%	20%	100%	2022	2018	4	برامج تنفيذية للعمل التطوعي		
		5%		5%	5%	5%	10%	100%	2022	2019	4	وضع برامج تنفيذية لممارسة الرياضة للجميع		
عدم وجود تخصيص		4%		3%	0%	3%	5%	100%	2022	2012	11	توفير المساحات الخضراء لممارسة الرياضة للجميع بالتعاون مع المحافظات		
		2		0	0	0	0	5	2020	2018	3	اقرار القوانين الخاصة بالرياضة	لم تحدد	الاسراع باكمال تعديل وتحديث وتشريع القوانين المعطلة للمؤسسات الرياضية كافة، ووضع حد للتقاطعات والاختلافات المضرة في الاوساط الرياضية
		1		0	0	0	0	1	2019	2018	2	اقرار القوانين الخاصة بالشباب		
		15%		10%	0%	0%	50%	100%	2020	2019	2	اعداد هيكل تنظيمي ينظم الحركة الرياضية في العراق (مجلس اعلى للرياضي)	لم تحدد	التفكير بإعادة بناء هيكلية تنظيمية حديثة تؤمن للحركة الرياضية ونتائجها ديمومة وتصاعد في التطور والاستقرار
		20%		15%	15%	15%	50%	100%	2019	2018	2	مراجعة الهيكل التنظيمي للووزارة وبما يتناسب مع توجهات الحكومة		

		30%		35%	35%	35%	100%	100%	2022	2004	19	مواصلة الدعم المعنوي	لم تحدد	مواصلة الدعم المعنوي والمادي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها المختلفة، ومواصلة الدعم المقدم الى اللجنة الاولمبية الوطنية لمتحمدي الاعاقه بما يضمن لها مواصلة مسؤولياتها
		5%		5%	5%	5%	10%	100%	2022	2019	4	اقامة أنشطة مشتركة في المدارس ومنتديات الشباب	لم تحدد	اعادة الفعاليات الشبابية والرياضة الى المدارس والتوسع في فتح مدارس الموهبة الرياضية
		10%		10%	5%	5%	0%	100%	2022	2019	4	دورات وورش تدريبية وندوات واجتماعات لتشجيع الاندية الرياضية على التحول الى مؤسسات اجتماعية ذاتية التمويل)	لم تحدد	تشجيع الاندية الرياضية على التحول الى مؤسسات اجتماعية تعتمد على فعاليتها ونشاطاتها في تمويل نفسها
		5%		5%	10%	10%	20%	100%	2022	2012	10	اعداد وتنفيذ برامج للتحسين المستمر لقيادات المؤسسات الشبابية والرياضية للارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية	متوسط	اكمال الابنية الرياضية المتعاقد عليها
قلة التخصيص المالي		1%		1.47%	0.73%	1.47%	78%	100%	2022	2007	15	أنشاء قاعات رياضية في بغداد والمحافظات عدد (٥)		
غير مستهدف في الفصل الأول		0.20%		0.20%	0%	0%	98%	100%	2022	2007	15	أنشاء منتديات متخصصة وثقافية عدد (٧) في بغداد والمحافظات		
غير مستهدف في الفصل الأول		0.20%		0.30%	0%	0%	97%	100%	2022	2007	15	أنشاء مسابح اولمبية عدد (٥) في المحافظات		

منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	منجز	100%	100%	2022	2008	14	انشاء وتطوير وتأهيل (٤) مديريات للشباب والرياضة في بغداد والمحافظات
غير مستهدف في الفصل الأول		0.40%		0.40%	0%	0%	96%	100%	2022	2008	14	نشاء ملاعب سعة (١٠٠) متفرج في نواحي بغداد والمحافظات عدد (١٢)
غير مستهدف في الفصل الأول		0.90%		0.90%	0%	0%	91%	100%	2022	2008	14	أنشاء ملاعب رياضية سعة (٢٠٠) متفرج في اقضية بغداد والمحافظات عدد (٢٠)
غير مستهدف في الفصل الأول		1.60%		1.60%	0%	0%	84%	100%	2022	2008	14	أنشاء قاعات رياضية مغلقة سعة (٥٠٠) متفرج في اقضية بغداد والمحافظات عدد (٦)
غير مستهدف في الفصل الأول		3.80%		3.80%	0%	0%	62%	100%	2022	2008	14	تصميم وأنشاء قاعات رياضية مغلقة سعة (١٠٠٠) متفرج في بغداد والمحافظات عدد (٦)
غير مستهدف في الفصل الأول		0.80%		0.80%	0%	0%	92%	100%	2022	2008	14	أنشاء منتديات شبابية نموذجية في بغداد و المحافظات عدد (١٠)
غير مستهدف في الفصل الأول		4.90%		4.90%	0%	0%	52%	100%	2022	2008	14	أنشاء مسابح اولمبية جديدة عدد (٥) في بغداد والمحافظات مع ازالة وانشاء مسبح اولمبي في ديالى عدد (١)
غير مستهدف في الفصل الأول		1.50%		1.50%	0%	0%	85%	100%	2022	2008	14	أنشاء منتديات رعاية علمية عدد (٢) في المحافظات
غير مستهدف في الفصل الأول		0.20%		0.20%	0%	0%	98%	100%	2022	2008	14	انشاء مخزن على شكل جملونات في بغداد والمحافظات عدد (١٣)

اعداد الدراسات والتصاميم والمسوحات للمدن الرياضية الجديدة (مع الاستثمارات والتسيج والابواب الخارجية بموجب التصاميم الحديثة في بغداد والمحافظات) في التاجيات، واسط	11	2011	2022	100%	50%	3.33%	0%	3.33%	عدم وجود تخصيص
اعداد الدراسات والتصاميم وتطوير وتأهيل ملعب الشعب الدولي ليكون بسعة (٦٠,٠٠٠) متفرج وبصاميم جديدة	11	2011	2022	100%	20%	0%	0%	8%	غير مستهدف في الفصل الأول
أنشاء ساحات متعددة الاغراض مسيجة مغطاة بالتارتان عدد (٣٨) في بغداد والمحافظات الكلفة = التخصيص = ١,٢٥٠ مليار	14	2008	2022	100%	98%	0%	0%	0.17	غير مستهدف في الفصل الأول
تصميم وانشاء مكتبة مركزية	11	2011	2022	100%	10%	0	0	9	غير مستهدف
ترميم ابنية ذات ثلاث طوابق عدد (٦) مع ملحقاتها مع تطوير السياج الخارجي للمدينة	14	2008	2022	100%	100%	منجز	منجز	منجز	منجز
انشاء المدينة الرياضية في البصرة	14	2008	2022	100%	94%	0.40%	0.40%	0.40%	
تصميم وتنفيذ ملعب نادي الزوراء مع الملحقات بسعة (١٢,٥٠٠) متفرج و ٥,٠٠٠ متفرج في مدينة الصدر	14	2008	2022	100%	52%	3.20%	3.20%	3.20%	
أنشاء منتديات شبابية في اقضية ونواحي بغداد والمحافظات صنف A,B,C (عدد / (١٢)	14	2008	2022	100%	89%	0	0	1.07%	غير مستهدف في الفصل الأول

انشاء قاعات رياضية	مغلقة سعة (٥٠٠) متفرج في بغداد والمحافظات عدد (١١)	14	2008	2022	100%	100%	0	0	0	0	0	تسوية حساب
انشاء قاعة رياضية مغلقة سعة (١٠٠٠) متفرج في المثنى	12	2010	2022	100%	100%	0	0	0	0	0	0	تسوية حساب
انشاء بيوت شباب في كربلاء والمثنى	14	2008	2022	100%	60%	0%	0%	4%	4%			غير مستهدف في الفصل الأول
اعداد الدراسات والتصاميم وانشاء مراكز حاسوب عدد (١٠)	11	2011	2022	100%	97%	0	0	0.49%	0.49%			غير مستهدف في الفصل الأول
اعداد الدراسات والتصاميم وانشاء قاعات بولنك ، سكواش ، ريشة ، طاولة ، مصارعة ، رفع اثقال بنائية متعددة الأغراض) ضمن المدينة الشبابية	11	2011	2022	100%	56%	2.64%	0%	2.64%	2.64%			عدم وجود تخصيص
تصميم وانشاء بناية متعددة الاغراض تتضمن متحف ، مركز حاسوب ، مكتبة ، دارضيافة ، في كربلاء و واسط عدد (٢)	12	2010	2022	100%	63%	0%	0%	3.95%	3.95%			غير مستهدف في الفصل الأول
تصميم وانشاء ملعب سعة (٢٠) الف متفرج في واسط	11	2011	2022	100%	100%	0	0	0	0	0	0	تسوية حساب
انشاء قاعات رياضية نوع كي سبان في بغداد والمحافظات عدد (٤٠)	13	2009	2022	100%	88%	0%	0%	1.16%	1.16%			غير مستهدف في الفصل الأول
انشاء ملاعب مثيلة بلثيل الصناعي في بغداد والمحافظات عدد (١٧)	12	2010	2022	100%	97%	0.20%	1.79%	0.20%	0.20%			
ازالة واعادة انشاء منتديات شباب في بغداد والمحافظات عدد (٧)	11	2011	2022	100%	47%	0%	0%	5.31%	5.31%			غير مستهدف في الفصل الأول

غير مستهدف في الفصل الأول		3.07%		3.07%	0%	0%	69%	100%	2022	2011	11	انشاء بيوت شباب في بغداد والمحافظات عدد (٣) في (كركوك - ذي قار - سامراء / صلاح الدين)
عدم وجود تخصيص		2%		2%	0%	2.00%	70%	100%	2022	2011	11	انشاء قاعة رياضية سعة (٧٠٠٠) متفرج مغلقة متكاملة عدد(١) في بغداد /
غير مستهدف في الفصل الأول		0.40%		0.40%	0%	5	96%	100%	2022	2010	12	اعداد الدراسات والتصاميم وانشاء ملعب سعة (٥٠٠٠) متفرج في بغداد والمحافظات عدد (٤)
غير مستهدف في الفصل الأول		1.08%		1.08%	0%	0%	89%	100%	2022	2010	12	انشاء مديرية شباب ورياضة عدد ٦ في بغداد والمحافظات / مستمر
غير مستهدف في الفصل الأول		7.58%		7.58%	0%	0%	25%	100%	2022	2012	10	انشاء قاعة رياضية اولمبية سعة (٢٥٠٠) متفرج عدد (٣) في بغداد والمحافظات
		1.53		1.53%	8.25%	1.53%	77%	100%	2022	2011	11	تأهيل وتطوير ملعب كركوك الاولمبي
عدم وجود تخصيص		5.00%		5.00%	0%	0%	50%	100%	2022	2011	11	تأهيل القبة الفلكية وازضافة الملحقا الخاصة بها (مسارح وكافتريات) في متنزة الزوراء متضمناً التاثيت والاجهزة التخصصية
عدم وجود تخصيص		2.47%		2.47%	0.43%	2.40%	63%	100%	2022	2011	11	تصميم وانشاء ملاعب سعة (٣٠,٠٠٠) متفرج عدد (٤) في بغداد والمحافظات
تسوية حساب	0	0	0	0	0	0	100%	100%	2022	2011	11	تطوير وتأهيل ملعب ميسان الاولمبي
		2.93%		2.93%	12.50%	2.93%	56%	100%	2022	2011	11	ازالة وانشاء ملعب الميناء في محافظة البصرة
							—	—	—	—	—	اجراء المسوحات وتحريات التربة واعداد التصاميم لمشاريع الخطة الخمسية

تطوير وتأهيل مسبح الشعب الاولبي	11	2011	2022	100%	100%	0	0	1.20%	1.20%	غير مستهدف في الفصل الأول
انشاء مقر للجنة البارالمبية الوطنية العراقية / مستمر	11	2011	2022	100%	59%	0	0	4.10%	4.10%	غير مستهدف في الفصل الأول
تطوير وتأهيل المنشآت الشبابية والرياضية في بغداد والمحافظات عدد (١٧)	11	2011	2022	100%	74%	0	0	2.60%	2.60%	غير مستهدف في الفصل الأول
انشاء ملاعب ثيل صناعي في اقصية ونواحي بغداد والمحافظات عدد (٥٨)	11	2011	2022	100%	94%	0.42%	0.42%	0.42		
انشاء ساحات متعددة الاغراض مغطاة بالتارتان في نواحي وقرى بغداد والمحافظات عدد (١٠٥)	11	2011	2022	100%	87%	0	0	1.30%	1.30%	عدم وجود تخصيص
انشاء ملاعب سعة (٥٠٠٠) متفرج في بغداد المحافظات عدد (٤)	11	2011	2022	100%	74%	1.73%	1.73%	1.73%		
انشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في اقصية ونواحي بغداد والمحافظات عدد (٢٠)	11	2011	2022	100%	63%	2.43%	0%	2.43%		عدم وجود تخصيص
اكساء ساحة كونكرتية واسفلتية بالتارتان في بغداد والمحافظات عدد (٢٢)	11	2011	2022	100%	93%	0	0	0.67%	0.67%	غير مستهدف في الفصل الأول
تصميم وانشاء ملعب سعة (٣٠,٠٠٠) متفرج في كربلاء	7	2011	2018	100%	100%	0	0	0	0	تسوية حساب
جراة المسوحات وفحوصات التربة لانشاء ملعب سعة (٦٠,٠٠٠) متفرج في التاجيات / الكرخ	11	2011	2022	100%	28%	4.80%	2.93%	4.80%	4.80%	قلة التخصيص المالي

		2.67%		2.67%	9.54%	2.67%	60%	100%	2022	2010	12	اجراء المسوحات وفحوصات التربة لانشاء ملعب عدد (٢) سعة (٣٠,٠٠٠) متفرج في الرصافة ومدينة الصدر /
عدم وجود تخصيص		2.23%		2.23%	0	2.23%	67%	100%	2022	2011	11	تصميم وتنفيذ وانشاء فندق عدد (٢) في البصرة
قلة التخصيص المالي		4.67%		4.67%	2.81%	4.67%	30%	100%	2022	2012	10	تصميم وانشاء ملاعب سعة (٣٠) الف متفرج عدد (٤)
		5.80%		5.80%	5.80%	5.80%	13%	100%	2022	2012	10	تصميم وانشاء ملعب سعة (٢٠) الف متفرج في المثنى
غير مستهدف في الفصل الأول		10%		10%	0	0	0%	100%	2022	2013	9	تصميم وتنفيذ وانشاء مستشفى الطب الرياضي التخصصي سعة (٥٠) سرير في المدينة الشبابة \ بطريقه المشروع الكامل (تسليم مفتاح)
غير مستهدف في الفصل الأول		9.53%		9.53%	0	0	5%	100%	—	—	—	شراء واستملاك اراضي لمشاريع الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات

وزارة الموارد المائية

المحور الثالث : الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز -ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		3		1	0.5	1	63%	75%	2035	2011	25	الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي	سريع	اعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق، ووضع بدائل ناجحة لشحة المياه من خلال دراسة يقدمها خبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		4		4	2	6	48%	100%	2022	2019	14	دراسة التحريات الهيدروجيولوجية		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		1		0.5	0.1	0.5	97%	100%	2020	2010	11	تنفيذ القناة الأروائية الناقلة للمياه ضمن مشروع ري شط العرب / دعم القطاع الزراعي (١٤١,٦ كم)		
		4		3	0	0	كم 9	كم 56	2022	2004	19	دراسة ومعالجة التآكل في شط العرب		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		5		6	3	4	50%	100%	2022	2004	19	مسح التربة وتصنيف الأراضي		
		3		3	5	5	63%	100%	2022	2006	17	الدراسات والبحوث التطبيقية		
		6		9	12	12	13%	100%	2022	2011	12	تقييم ومراقبة وإدارة الموارد المائية المشتركة لحوضي دجلة والفرات داخل وخارج العراق		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		5		4	0	2	54%	100%	2021	2004	18	استصلاح الأراضي المتبقية من مشروع نهر سعد (٧٥ الف دونم)		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		1.5		1	0	0.5	70%	100%	2021	2004	18	مشروع حربة - دغارة (٧٦٤ الف دونم)		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		16		9	0	5	0%	100%	2021	2005	17	ري المثنى (٤١ الف دونم)		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		4		3	0	2	81%	100%	2020	2004	17	الرمادي م / ٥ (١٣١ الف دونم)		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		12		10	0.05	5	46%	100%	2021	2004	18	مشروع شرق الغراف (٤٥٥ الف دونم)		

تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		2		1	0	1	53%	100%	2021	2004	18	غرب الغراف (٣٣٧ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		7		5	0.9	4	53%	100%	2021	2005	17	مشروع الرميثة (١٤٤ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		7		5	1	4	54%	100%	2021	2005	17	مشروع حلة - كفل (١٧٣ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		9		6	1	4	26%	100%	2022	2007	16	مشروع كفل/شنافية (٢٢٨ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		7		5	0	4	33%	100%	2021	2007	15	كوت - بتيرة (٦٦,٢ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		4		3	0	2	62%	100%	2021	2006	16	حلة - ديوانية (٢٧٣,٨ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		7		5	1	5	31%	100%	2021	2004	18	مشروع الحسينية (١٠١ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		7		3	0	3	0%	100%	2022	2010	13	إستصلاح أراضي ديوانية/شافعية (٣٨٠ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		10		3	0	2	39%	100%	2021	2004	18	ري مهروت (١١٠ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		10		7	0	3	18%	100%	2022	2008	15	بني حسن (٣١٣ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		5		1	0	1	75%	100%	2020	2004	17	اعادة احياء مزرعة السويب (٢٠ الف دونم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		12		3	0	2	46%	100%	2022	2009	14	مشروع القناة الرئيسية لري الجزيرة الشرقي (٥,٨٧ كم)
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		0.3		0.4	0	0.3	95%	100%	2021	2004	18	الاعمال التكميلية لمنظومات السيطرة الرئيسية للسدود والسدات
بانتظار موافقة وزارة التخطيط على زيادة الكلفة الكلية		2.5		1.5	0	1	18%	100%	2021	2004	18	الاعمال المدنية للمحطة الكهرومائية لسد العظيم
		0.3		0.3	0.4	0.4	1%	5%	2022	2010	13	اعمال المعالجة الدائمة لاسس سد الموصل بضمها اعمال التحشية
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		6		4	0	1	45%	89%	2023	2012	12	تحسين مشاريع حوضي دجلة والفرات
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		6		5	1.5	2	محطات 7	محطة 60	2023	2012	12	تأهيل وتطوير محطات الضخ لنهر دجلة والفرات

تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		5		4	0	1	58%	92%	2023	2012	12	انشاء سداد واقية ومستلزمات معالجة الفيضان
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		4		7	0	1	150	غير محدد حسب الشحة او الفيضان	2022	2012	11	تجهيز ونصب المضخات الجديدة
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		55		40	0	5	ناظم 1000	ناظم 3400	2025	2012	14	تأهيل منشآت السيطرة للمحافظات الواقعة على نهري دجلة والفرات
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		2		2	0	0	ناظم 15	غير محدد	2022	2008	15	انشاء نواظم جديدة في المحافظات الواقعة على نهري دجلة والفرات
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		4		4	1.5	2	46%	100%	2022	2004	19	تنفيذ اعمال برنامج انعاش الاهوار
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		0.6		0.2	0	0.2	28%	100%	2022	2012	11	انشاء سدة مراقبة على طول الحدود العراقية الايرانية موازية للسدة الايرانية الحالية
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		4		3	1.5	2	17%	100%	2022	2012	11	خطة اللجنة الوطنية للاهور والاراضي الرطبة في العراق
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		5		2	0	2	49%	85%	2024	2006	19	اعمال المسح
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		7		5	0	3	73%	100%	2020	2006	15	النقاط التثليثية في البلد
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		5		4	0	1	46%	100%	2022	2004	19	دراسات المشاريع الاروائية وإعداد التصاميم
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		4		2	0	1	61%	100%	2022	2004	19	دراسات وتحريات وتصاميم السدود الصغيرة
		1		1	0	0	65%	100%	2022	2004	19	دراسات وتحريات استشارية
		100		0	0	0	0%	100%	2019	2014	5	تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام/ ٢٠١٤
عدم موافقة وزارة التخطيط على اعادة ادراج المشروع		10		10	0	2	11%	100%	2022	2005	18	دراسة نوعية مياه الانهر الرئيسية في العراق
عدم موافقة وزارة التخطيط على اعادة ادراج المشروع		10		7	0	2	25%	100%	2022	2004	19	دراسة التحريات الهيدرولوجية
عدم موافقة وزارة التخطيط على اعادة ادراج المشروع		5		5	0	4	44%	100%	2022	2005	18	انشاء شبكة المحطات الهيدرولوجية

اعداد قاعدة بيانات مكانية GIS	18	2005	2022	100%	51%	2	0	5	5	5	عدم موافقة وزارة التخطيط على اعادة ادراج المشروع
التحكم بمنشآت الضبط وإدارة تشغيلها	19	2004	2022	100%	18%	1	0	10	10	10	عدم موافقة وزارة التخطيط على اعادة ادراج المشروع
زيادة حصة العراق السنتوية من نهر الفرات	4	2019	2022	393 م³/ثا	290 م³/ثا	320	376	320	320	320	زيادة الإيرادات بسبب السيول هذا العام
الاتفاق على الاطلاقات المائية لهر دجلة عند الحدود العراقية - التركية	1	2019	2019	100%	310 م³/ثا	370	1172	370	370	370	زيادة الإيرادات بسبب السيول هذا العام
تعديل وتفعيل مذكرة التفاهم لعام/ ٢٠١٢ مع ايران	5	2019	2023	100%	0%	0	0	20	20	20	
تفعيل فقرة المياه من محضر اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية لعام/ ٢٠١٨	2	2019	2020	100%	0%	0	0	25	25	25	
تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية العليا للمياه	6	2017	2022	100%	50%	10	10	5	5	5	
البحث والتعليم والتطوير لاستدامة الموارد الطبيعية لبحيرة ساوة	4	2019	2022	100%	0%	1	0	15	4	15	عدم موافقة وزارة التخطيط على ادراج المشروع
مشروع تغذية ماء السماوة الكبير (٥٨ كم)	6	2014	2019	100%	20%	10	0	45	25	45	رفع مبلغ القرض من قبل وزارة التخطيط
تجهيز وصيانة اعمال التحشية واعادة تأهيل المنافذ السفلى لسد الموصل	4	2016	2019	100%	76%	16	16	0	8	0	
تاهيل قطاع الري / القرض الياباني	10	2018	2028	100%	0%	5	0	10	5	10	رفع المشروع من قبل وزارة التخطيط
مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي للمناطق المحررة/ وزارة الموارد المائية	3	2019	2021	100%	0%	5	5	20	5	20	

قلة التخصيص المرصد وتاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		60		30	1	10	15 كم	5 الاف كم	2065	2015	50	تبطين جداول الري ضمن حوضي دجلة والفرات / مرحلة ثانية	لم تحدد	البدا بمشروع تبطين القنوات المائية الفرعية باستخدام المعدات والمكانن المعطلة حاليا في مخازن وشركات وزارة الموارد المائية وذلك لتقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه او الاستعاضة عنها بالانابيب
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		14		10	6	7	152 جمعية	غير محدد حسب طلب مستخدمي المياه	2022	2010	10	نشر جمعيات مستخدمي المياه في محافظات متعددة	سريع	وضع خطة بالارقام لشمول الاراضي الزراعية بمعدات الري الحديثة لضمان انتاج زراعي وفير واقراض المزارعين لهذا الغرض وبالتكامل مع وزارة الزراعة وبطريق مشترك واحد
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		0.6		0.3	0	0.1	100%	100%	2019	2012	8	مشروع ابو غريب الرائد للري المغلق / دعم القطاع الزراعي (المشروع منجز والمتبقي اقبال التيار الكهربائي لمحطات الضخ)		
لن تتم المباشرة هذا العام بسبب الوضع الامني في موقع العمل		0		0	0	0	88%	100%	2020	2008	13	اكمال القنوات المعلقة والمنشآت الحقلية لمساحة ٢١,٥ الف دونم في كركوك / دعم القطاع الزراعي (٢١,٥ الف دونم)		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		215		215	461	470	11012 بئر	900 بئر سنوياً	2022	2009	مستمر	حفر ابار النفع العام	لم تحدد	السعي لزيادة الخزين المائي للبلاد وتوفير مصادر اضافية من المياه من مصادر اخرى كالمياه الجوفية

		3		3	4	4	71%	100%	2020	2011	10	انشاء ناظم ابو صخير	سريع	وانشاء تدوير المياه واستخدام المياه المالحة في زراعات واحتياجات تتناسب مع هذه المياه
قلة التخصيص المرصد وتاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		1.2		1.2	0.966	1.1	15 مليون م	3.5 مليون م	2022	2007	16	ازالة الترسبات مقدم السدات الرئيسية	لم تحدد	كري الانهر من قبل القطاع العام وفق خطط مدروسة والسماح للشركات بالاستثمار في هذا المجال كما كان عليه الامر قبل عقود طويلة في العراق. ومنح المزيد من الاجازات للقطاع الاهلي لكري الانهر والقنوات مقابل استثمار الطمي و "الزميزج" الذي توفره هذه العملية
قلة التخصيص المرصد وتاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		8000		10000	7500	8000	غير محدد	26 الف كم سنويا	2022	2016	7	تطهيرت الجداول والمبازل / مرحلة ثانية		
قلة التخصيص المرصد وتاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		5.5		8	1.764	3	76 مليون م	16.5 مليون م سنويا	2022	2007	16	كري الانهر وتفرعاتها		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		23		5	0	1	15%	100%	2025	2007	19	توسيع شط الحلة وشطي الديوانية والدغارة		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		7.2		7	6.3	7.8	59%	100%	2022	2010	13	تاهيل ناظم شط البصرة		العمل الجاد والسريع بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والبلديات لانهاء رمي النفايات في الانهار والترع واختلاط المياه الثقيلة والمالحة والملوثة بالمياه الجوفية او الصالحة للشرب والاستخدام السليم والتقليل
		2		1.5	2.5	2.5	85%	100%	2022	2008	15	اكمال تنفيذ الاعمال بموجب التصاميم لسداد بحيرة الدلمج والاعمال الملحقه بها		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		2		1.2	0.6	1.8	80%	100%	2021	2008	14	حفريات واكمال العمود الرئيسي للمصب العام		
قلة التخصيص المرصد وتاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		1200		600	0	200	13 الف دونم	48 الف دونم	2037	2012	25	انشاء وتاهيل المبازل الحقلية للمشاريع	سريع	

تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		1		1	0.001	0.7	95%	100%	2020	2008	13	أكمال المرحلة الاولى من مبزل الفرات الشرقي / دعم القطاع الزراعي		من امتداد اللسان الملحي في شط العرب وفق الدراسات التي اعدتها وزارة الموارد المائية وتحديثها لتلبية التحديات المتزايدة وصولاً لحل حاسم وواضح لهذه المشكلة كأولوية خاصة
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		0.1		0.05	0	0.05	99.80%	100%	2019	2008	12	أكمال المرحلة الاولى من مبزل شرق الغراف / دعم القطاع الزراعي		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		0.05		0.03	0	0.02	99.90%	100%	2019	2008	12	أكمال تنفيذ ميازل غرب الغراف / دعم القطاع الزراعي		
تاخر المصادقة على الخطة وعدم التمويل		55		40	2	5	0%	100%	2019	2018	2	دراسة معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب		

وزارة الثقافة والسياحة والآثار

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - فء (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
تم افتتاح سينما ومسرح المنصور بحضور السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار، وافتتح الساحة ابوابها للجماهير خلال الايام القادمة بعد استكمال الاجراءات الامنية 'ولقد رفضت مبدأ الاستثمار للساحة من قبل شركة (انوارفدك) وسيتم اعادة اجراءات الاستثمار ويجاد مستثمرين جدد .	0	0	0	25%	75%	75%	صفر	100%	2019	2019	اشهر 3	ساحة الاحتفالات	سريع	تحويل الاصول الجامدة كالمسرح والابنية الاخرى الى اصول متحركة رابحة مساهمة في التنمية الثقافية للبلاد من خلال استثمارها من قبل القطاع الخاص العراقي او الاجنبي
قامت الوزارة بارسال كافة الخرائط الخاصة بالمسرح وكذلك دراسة الجدوى الخاصة بالمسرح (فلاش ميموري) كما تم الاتفاق على ارسال لجنة من دولة قطر ان هذا العمل هو هدية من دولة قطر للشعب العراقي وستبدأ الاجراءات في الشهر القادم والتي تعتمد على سرعة الانجاز في الاجراءات المتخذة من قبل دولة قطر .	0	12,5	0	12,5	25%	25%	صفر	100%	2020	2019	شهر 18	مسرح الرشيد		
	0	0	0	0	1	1	صفر	1	2022	2018	سنوات 4	المسرح الوطني		
	0	0	0	0	9	10	صفر	40 جائزة	2022	2015	مستمرة	جائزة الابداع العراقي	سريع	تشجيع حركة الترجمة ووضع جائزة لأفضل كتاب مترجم، وأفضل عمل فني او مسرحي او ثقافي بشكل سنوي في كافة الابداعات الثقافية والمعرفية لغرض الترفيه عن الشعب وتفتيح طاقاته والتلاقح الثقافي مع بقية شعوب العالم
عدم توفر تخصيص ضمن عام ٢٠١٩ وفي حالة توفره في الفصل الاخير من موازنة الطوارئ يمكن تنفيذها في الفصل الرابع	0	1	0	0	0	0	صفر	1	2019	2019	شهر 11	مؤتمر السياسات الثقافية للمرحلة القادمة		
عدم توفر تخصيص ضمن عام ٢٠١٩	0	1	0	1	0	2	صفر	اسبوع 16	2022	2019	4	اقامة وتبادل للاسابيع ثقافية داخل وخارج العراق		
	0	1	0	0	0	0	صفر	4 مسابقات	2022	2019	سنوات 4	اقامة مسابقات الابداع الشبابي المعاصر		

تشجيع حركة السياحة وتسهيل دخول السواح الى العراق بالتكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية	سريع	برامج تنفيذية في الجانب السياحي مع البلدان الاخرى	4	2019	2022	بلدان 6	برنامج 1 تنفيذي	0	0	1	0	2	0	فيما يتعلق بالبرامج التنفيذية لعام ٢٠١٩ مع بلدان (المغرب ، سوريا ،بحرين) وكما يلي : المغرب :تم عرض مسودة البرنامج التنفيذي في مجال التعاون السياحي على الجانب المغربي (خلال اجتماع الرباط) في الشهر التاسع من عام ٢٠١٨ ، وتم مفاتحة وزارة الخارجية بموجب كتابنا العدد ٢٣٥٠ في ٢٠١٩/٢/١١ لاعلامنا رأي الجانب المغربي حول تفعيل اتفاقية التعاون السياحي الموقعة عام ١٩٧٦ (وردت اجابة وزارة الخارجية بكتابها العدد ٤١٤ في ٢٠١٩/٢/٢٠ في التاكيد على سفارتنا في الرياض) سوريا :تم عرض المسودة على الجانب السوري خلال اجتماع دمشق في ٢٠١٥/٤/١٠ وقاموا بأجراء بعض التعديلات والملاحظات وتم احالة رأي الجانب السوري الى مكتب السيد الوزير بموجب كتابنا المرقم ٣٥٥ في ٢٠١٩/٤/٢٠ لاستحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على تعديلات الجانب السوري (الدائرة القانونية) وبانتظار الاجابة البحرين :تم اعداد البرنامج التنفيذي وعرضه على الجانب البحريني ومفاتحة وزارة الخارجية بموجب كتابنا العدد ٢٣٣٤ في ٢٠١٩/٢/١١ لاعلامنا رأي الجانب البحريني حول البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاقية التعاون السياحي الموقعة عام ١٩٨٠ (وردت اجابة وزارة الخارجية بكتابها العدد ٤٥٤ في ٢٠١٩/٣/٧ في التاكيد على سفارتنا في المنامة للمتابعة).
		ابرار مذكرات تفاهم في المجال السياحي مع البلدان الاخرى	4	2019	2022	بلدان 11	مذكرات 3 تفاهم	0	0	0	0	4	0	فيما يتعلق بمذكرات التفاهم لعام ٢٠١٩ مع البلدان (لبنان،اذربيجان ،مصر ،تونس) وكمايلي لبنان:تم عرض مسودة مذكرة التفاهم في المجال السياحي على الجانب اللبناني ، وتم مفاتحة وزارة الخارجية بموجب كتابنا العدد ١٧٣٩ في ٢٠١٩/٢/٣ لاعلامنا رأي الجانب اللبناني حول مسودة مذكرة التفاهم في المجال السياحي (بنتظار الاجابة) اذربيجان :تم عرض مسودة مذكرة التفاهم على الجانب الاذري ومفاتحة وزارة الخارجية بموجب كتابنا العدد ١٩٣٤ في ٢٠١٩/٢/٥ لاعلامنا رأي الجانب الاذري حول مسودة مذكرة التفاهم في المجال السياحي (وردت اجابة وزارة الخارجية بكتابها العدد ٣٧٨ في ٢٠١٩/٢/١٧ في التاكيد على سفارتنا في باكو). مصر :تم عرض مسودة مذكرة التفاهم على الجانب المصري وتم التأكيد عليهم عبر القنوات الدبلوماسية بموجب كتابنا المرقم ٥٧٦٦ في ٢٠١٩/٤/١٤ . تونس:تم عرض مسودة مذكرة التفاهم مع الجانب التونسي عبر القنوات الدبلوماسية بموجب كتابنا المرقم ٣٨٠٤ في ٢٠١٩/٣/١٠ ووردت من الجانب التونسي بعض الملاحظات وتم احالتها الى الدائرة القانونية في هيئة السياحة في ٢٠١٩/٤/٢٢ لبيان الرأي .

					2	4	صفر	18	2022	2019	4	اقامة عروض ازياء للخريجين من مركز التدريب		
					100%	10%	صفر	100%	2019	2019	اشهر 3	انشاء سوق الكتروني للالعمال الفنية لغرض تسويقها		
				1%	صفر%	0	صفر%	98%	2019	2010	1	المسح السياحي والآثاري والتراثي في العراق م/١ و٣		
				0	صفر	0	صفر	98%	2019	2011	1	صيانة عقرقوف ومعابدها		
				0	صفر	0	صفر	96%	2019	2014	1	تأهيل المدرسة المستنصرية		
				0	صفر	0	صفر	90%	2019	2012	1	صيانة وتاهيل مرقد يوشع ،جنيد ،السرسقطي ،بهلول		
				0	100%	80%	0%	100%	2019	2019	اشهر 3	تاهيل وصيانة متحف الزعيم عبد الكريم قاسم		
				0	10%	5%	فندق الرشيد جزيرة بغداد	100%	2022	2019	سنوات 4	استثمار المرافق السياحية التابعة لهيئة السياحة (فندق المريد، داراستراحة سفوان، مجمع ساوة السياسي، ارض فندق النجف، ارض فندق السلام، فندق بابل السياسي (الحلة) ، ارض الوركاء، موقع سد العظيم، ارض فندق الموصل، فندق نينوى السياسي، مجمع عين تمر السياسي، داراستراحة النخيب		
				0	0	0	صفر	اتفاقية 1	2019	2019	اشهر 6	دعم الشباب المخرجين السينمائيين وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات مع المراكز العالمية للانتاج السينمائي	الاستثمار في المرافق السياحية المختلفة كالآثار والاهوار وجبال كردستان العراق	سريع
				0	0	0	صفر	اتفاقية 1	2019	2019	اشهر 6	دعم الشباب المخرجين السينمائيين وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات مع المراكز العالمية للانتاج السينمائي		

	0	1	0	0	1	1	صفر	قاعة 10	2022	2019	4	تأهيل وتشغيل القاعات والمسارح والمصاهر الفنية والتراث الشعبي		
	0	0	0	0	5	5	صفر	20	2019	2019	اشهر 6	منح اجازات فرقة اهلية في المحافظات وبغداد		
	0	1	0	2	2	3	صفر	36	2022	2019	4	اقامة دورات تدريبية ضمن مركز تدريب الازياء		
	0	0	0	0	0	25%	75%	100%	2019	2009	1	تأهيل بنائية ورشة العود لصناعة الالات الموسيقية	سريع	الاهتمام بالفنانين في قطاع السينما والمسرح والاعمال الفنية الاخرى من خلال تشجيعهم على تأسيس شركة للإنتاج الفني والاعلامي مساهمة في كل محافظة ودعمهم بالاقتراض بمبادرة خاصة.
	0	1	0	1	3	2	مستمرة	مسرحية 16	2022	2019	4	انتاج مسرحيات		
	0	25%	0	25%	20%	50%	صفر	100%	2019	2019	1	عربة مسرح الطفل		
	0	0	0	0	0	0	صفر	100%	2020	2020	1	مهرجان مسرح الطفل المدرسي الدولي		
	0	16	0	16	19	22	صفر	نشاط 216	2022	2019	4	القيام بالزيارات وانشطة كشفية ورياضية مع القيام بالفعاليات والزيارات الميدانية		
	0	2	0	1	2	3	6	اغنية 24	2022	2019	4	اغاني للاطفال		
	0	0	0	0	3	2	2	فلم 8	2022	2019	4	انتاج افلام وثائقية قصيرة		
	0	2	0	2	4	4	صفر	دورة 40	مستمر	2019	4	دورات تطويرية خاصة للاطفال	سريع	الاهتمام بمسرح الطفل وانتاج مسرحيات وفعاليات مختلفة كزيارة مناطق العراق المتنوعة والمتاحف والسفريات المدرسية والانشطة الكشفية والرياضية وتنمية القابليات لتنمي شعورهم في حب الوطن والتعرف على طبيعة المجتمع والحياة والتطلع نحو المستقبل المشرق وان يتكامل
	0	4	0	4	18	8	صفر	معرض 64	2022	2019	4	معارض مطبوعات الدار		
	0	40	0	40	78	48	صفر	512	2022	2019	4	احتفالات ومهرجانات ثقافية		

	0	1	0	0	1	1	2	8	2022	2019	سنوات 4	مسابقات رسوم الاطفال		هذا العمل مع مديريات التربية في المحافظات المختلفة التي تضع جدول للمساعدة والنشاطات المتبادلة
	0	9	0	9	18	18	صفر	مجلة 144	مستمر	2019	سنوات 4	اصدارات مجلات		
	0	1	0	1	0	0	صفر	بحث 8	مستمر	2019	سنوات 4	بحوث اطفال		
	0	150	0	0	0	0	-	منتج 150	2019	2019	1	مشروع انتاج ازياء للاطفال تاريخية وفلكلورية تستخدم في المسارح المدرسية ومراكز الطفل ولعموم محافظات العراق		
لعدم توفر تخصيص مالي	0	10%	0	5%	0	15%	صفر	100%	2021	2019	3	اقامة سوق للمنتجات الفنية وادوات العمل الفني (بازار)	سريع	تهيئة الظروف المناسبة والدعاية الجيدة للأعمال الفنية لصنع سوق محلي ودولي لبيعها بغرض تحسين مستوى دخل الفنانين والمساهمة في زيادة الدخل القومي للبلاد ويتم هذا بالتكامل مع السفارات العراقية في الخارج
لعدم توفر تخصيص مالي	0	25%	0	25%	0	50%	صفر	معارض 4	2022	2019	4	الترويج للأعمال الفنية والتواصل مع السفارات لتنظيم معارض خارج العراق وتوسيع الاعمال الفنية		
	0	10	0	10	42	25	صفر	240	2022	2019	4	انتاج حلي واكسسوارات		
	0	0	0	0	11	4	صفر	28	2022	2019	4	اقامة عروض ازياء خارج العراق وداخله ومعارض لبيع منتجات الدار		
	0	5%	0	10%	10%	10%	-	100%	2022	2019	سنوات 4	مقترح انشاء ٧ مدن سياحية بمواصفات عالية البصرة (ساحة الخليج)،الناصرية (الجايش)، السماوة (عين الصيد)،واسط الديوانية (هور الملج)،ميسان (هور ام نعا)،صلاح الدين(الثراث مصب السحافي)،ديالى (بحيرة حميرين) ديالى (سد العظيم) الانبار(سد حديثة)	سريع	استثمار البحيرات والصحاري والجبال والمغارات والترويج لها سياحياً

وزارة الهجرة والمهجرين

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤ (٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلّي (عدد أو نسبة)	تأريخ الإنجاز	تأريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
		45%		45%	10%	10%	صفر	100%		2019	٦ اشهر	مسح تجريبي بالعينة لـ ٦٠٠ شخص مقسم على اربع دول	متوسط -طويل	دراسة إنجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد ولأسباب مختلفة تتضمن سيرهم الذاتية التفصيلية لمتابعة شؤونهم ومساعدتهم او الاستفادة من خبراتهم داخل وخارج البلاد
تم انجاز واجهة القاعدة وتصميم الهيكل الرئيسي				75%	25%	25%	صفر	100%		2019	٣ أشهر	تصميم قاعدة بيانات وفق نتائج المسح التجريبي		
					100%	100%	صفر	100%		2018	٤ أشهر	اعداد استمارة لتسجيل العراقيين (ورقية وتطويرها الى الكترونية)		
		6		3	2	3	صفر	مؤتمر 24		2019	2	حملات دعائية وترويجية وعقد مؤتمرات		
يتم نشر الاستمارة بعد الانتهاء من تصميم القاعدة لارتباطه بالنشاط السابق (٥٠% نشر في وسائل التواصل ٥٠% نشر عن طريق تطبيقات)		50%		50%	0%	0%	صفر	100%		2019	2	نشر الاستمارة من خلال المواقع الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي وضمن تطبيقات الاجهزة الذكية.		
		15%		10%	0	0	لا يوجد	100%	2020	2019	2	توثمة وزارة الهجرة والمهجرين مع وزارات الدول ذات الجارب المماثلة لاحتضان الاجئين(كندا واستراليا امريكا السويد والنروج)		
		20%		15%	10%	15%	لا يوجد	٢ مليون عراقي	2020	2019	2	انشاء المركز العراقي للهجرة		

تم تشكيل لجان الخاصة بالشراء والاعتدال ومقابلة المستفيدين والعمل جاري على اختيار المستفيدين وتوقف العمل بسبب عدم توفر التمويل ونقل المبالغ من تخصيصات الوزارة وتحويلها الى المحافظات بعنوان اعادة الاستقرار		400		400	0	200	صفر	عائلة 4000	2022	2019	4	مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل للعائدين	متوسط	العمل مع المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع الدولي لعودة النازحين الى مدنها وقراهم بجدول زمني محدد على ان ينتهي ذلك في مدة سنتين
المشروع متوقف عند نسبة انجاز ٧٥% بسبب عدم توفير تخصيصات مالية ضمن موازنة ٢٠١٩ لاكمال المشروع .		0		0	0%	0%	75%	شقة 300	2020	2010	5	تشديد مجمع البصرة السكني		
تم تخصيص المبلغ وانتظار التمويل للايفاء بالتزامات الشركة خلال الفصل الثالث.				50%	صفر	صفر	50%	100%			2	مشروع حراسات مجمع البصرة		
		25%		25%	50%	50%	صفر	100%	2019	2019	1	مشروع توفير مؤشرات احصائية عن ذوي الاحتياجات الخاصة للنزحين من النزوح الطارئ		
تم تقسيم المشروع لمرحلتين المرحلة الاولى بعينة (١%) وبحجم (١٠١٩) عائلة .تم انجازها بالكامل .المرحلة الثانية بعينة (٥%) وبحجم (٤٩٧١) عائلة .				50%	50%	50%	صفر	سنوياً 100%	2022	2019	4	مشروع تقييم اوضاع نازحي المخيمات (يكرر سنوياً) لدمج وغلق المخيمات		
		50,000		50 000	100 الف	100 الف	صفر	200 الف عائلة	2020	2019	2	اغاثة النازحين بسلة غذائية وسلة صحية ومزلية واغطية وفرش		
لم يتم التنفيذ بسبب عدم توفر التخصيصات المالية ومناقلة المبالغ من موازنة الوزارة الى المحافظات بعنوان اعادة الاستقرار		2000		2000	0	1000	لايوجد	20000 وحدة سكنية	2022	2019	4	توفير وحدات سكنية لفئات العناية (للعوائل الهشة)		
لم تتم المباشرة بالتنفيذ بسبب نقل تخصيصات المالية من موازنة الوزارة الى المحافظات لغرض اعادة الاستقرار		400		400	0	200	صفر	عائلة 2000	2020	2019	2	توزيع منح مالية لغرض ترميم الدور المتضررة في المناطق المحررة لتشجيع العودة الطوعية		
تم تخصيص مبلغ ٥٠ مليار دينار وسيتم المباشرة بالتوزيع		50000		50000	9	33000	لايوجد	733000 عائلة	2022	2019	4	تشجيع العودة الطوعية من خلال توزيع المنح المالية		

بانتظار التخصيص المالي من وزارة المالية لتفعيل المكاتب المتبقية					2	9	2 مكتب	9 مكاتب	2019	2019	اشهر 6	فتح مكاتب للوزارة في الدول التي تضم كثافة كبيرة للاجئين العراقيين في الخارج الدول (يونان - السويد - استراليا - امريكا - بريطانيا - بلجيكا - النمسا)	سريع	متابعة شؤون العراقيين المهاجرين خارج العراق بالتعاون والتكامل مع سفاراتنا في الخارج
تم اختيار اعضاء المجالس المؤقتين وارسال الاسماء الى وزارة الخارجية					9	9	لا يوجد	مجالس 9	2019	2019	اشهر 6	إنشاء مجالس جاليات من المهاجرين العراقيين للتواصل		
					100%	100%	لا يوجد	100%	2019	2019	اشهر 6	تفعيل الجانب الالكتروني للتواصل مع العراقيين في دول الخارج		
تم ارسال الاسماء الى وزارة الخارجية					50	50	لا يوجد	سفير 50	2019	2019	اشهر 6	تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاختيار السفراء بالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة وعقد مؤتمر في بغداد بحضور السفراء المرشحين	سريع	اعتماد المهاجرين العراقيين المتميزين سفراء محبة وسلام من شعب العراق الى شعوب العالم المختلفة لتعزيز صورة العراق على المستوى الدولي
					100%	100%	لا يوجد	100%	2019	2019	6 اشهر	إقرار السياسة الوطنية للاستفادة من العراقيين في دول المهجر	سريع	مساعدة هيئة الاستثمار الوطنية والوزارات الاخرى في البحث وجلب رؤوس الاموال العراقية المهاجرة للعودة للعراق

امانة بغداد

الملاحظات	تشرين الأول - ف٤(٢٠١٩)		تموز - ف٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
وردت ضمن المحور الخامس وزارة الاعمار والإسكان والبلديات														
المشروع متوقف منذ تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٦ بسبب أمر الغيار رقم (٣) حيث وردت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على زيادة نسبة الاحتياط العام للمقاوله بموجب قرارهم المرقم (٤٤ لسنة ٢٠١٩) وحالياً بصدد إستكمال كافة إجراءات توفير التخصيص المالي والسيولة المالية للمشروع بحدود (٤,٦٣٧,٦٢٠,٠٠٠) الف دينار وكذلك لتغطية أمر الغيار رقم (٣) عن طريق المناقلة							85%	100%	2016	2009	13 اشهر	صيانة وادامة وتشغيل مشاريع مياه المجاري	لم تحدد	اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب أخرى
وجود انحراف بسبب تأخر صدور الاعتماد الخاص باستيراد المواد الميكانيكية والكهربائية		7%		7%	1%	5%	83%	100%	2019	2009	4 اشهر	تنفيذ الخط الرئيسي الناقل في جانب الكرخ / الخط الغربي الاضافي مع تنفيذ محطة ضخ دورة رقم ٢ مع خطوط الدفع التابعة لها		
نسبة الواقع الحالي (٩٢,٢٨%) كتابنا المرقم (٧٩٧) في (٢٦/٢/٢٠١٩)				3%	5%	6%	87%	100%	2019	2009	4 اشهر	تنفيذ الخطوط الرئيسية التي ستربط على الخط الشمالي الشرقي مع محطة ضخ رئيسية عدد/١		
		41.15%		29%	18.85%	19%	11%	100%	2020	2018	2	تبليط واكساء المحلات والشوارع الرئيسية في مدينة بغداد / الأفرار الجديد	سريع	انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسائها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات وتقدم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات

البنك المركزي العراقي

الملاحظات	تشرين الأول - ف ٤ (٢٠١٩)		تموز - ف ٣ (٢٠١٩)		نيسان - الفصل الثاني (٢٠١٩)		الواقع الحالي (عدد أو نسبة)	المستهدف الكلي (عدد أو نسبة)	تاريخ الإنجاز	تاريخ بداية التنفيذ	الفترة المحددة للتنفيذ	المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	فقرة البرنامج الحكومي
	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف								
(وردت ضمن المحور الرابع / وزارة المالية)														
قام البنك بارسال كتاب الى لجنة الشؤون الاقتصادية بخصوص فتح الاعتمادات المصرفية لغاية (٥٠) مليون دولار في المصارف الاهلية تم تحويلها الى وزارة المالية					0%	5%	80%	100%	2019	2018	2	زيادة السقف الائتماني للا اعتمادات الحكومية من المصارف الخاصة الى ٥٠ مليون دولار	متوسط	تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به، وتحويل المصارف الى وظيفتها الاساسية وهي الاقراض من اجل التنمية بفوائد أو أرباح معقولة عن الفائدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي وحسب طبيعة المخاطر المتعلقة بكل عملية اقراض، واعتماد ان المصرف الذي لا يساهم في الاقراض بنسبة محددة من رأس ماله الاسمي او لا يقدم تسهيلات مصرفية تساعد في
					49	50	35%	100%	2019	2018	2	برنامج التمويل الإسلامي المجمع		

					59	59	28%	100%	2019	2018	2	مشروع تأمين التكافل		التنمية البشرية والاقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفاً محدداً ازاءه من البنك المركزي
قيد الإنجاز أذ تم إحالة إلى السلطة التشريعية لغرض المصادقة					0	10	60%	100%	2019	2017	3	قانون صكوك الاستثمار الإسلامية		

					10	16	71%	100%	2020	2016	5	تطوير مبادرة اترليون لدعم المشاريع الصغيرة والكبيرة	لم تحدد	المصارف عتلة التنمية والواسطة الاساسية لجشد رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية ليتسنى تمويل المشاريع في شتى المجالات. وان عملاً اساسياً يبقى مطلوباً للهبوض بالقطاع المصرفي بجناحيه العام والخاص. واهمية وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في دعم المصارف والرقى بمستوياتها لتستطيع القيام بدورها في التنمية وعدم الاعتماد في وجودها على عمليات مزاد العملة وصرفها. وما لم تنجز هذه المهمة فان الاختناق سيستمر كسمة اساسية للاقتصاد الوطني
أنجزت باقل من الفترة المخططة لها	أنجزت	أنجزت	أنجزت	أنجزت	30	30	70%	100%	2020	2016	5	مراجعة وتطوير اجراءات الاقراض المعول بها في المصارف والمؤسسات المشاركة في توفير خدمات التمويل الاصغر		

السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية الى اقتصاد العملة الرمزية والإلكترونية، والسعي لسحب الاموال المجمدة حالياً خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة بتقديم الحوافز والضمانات لتحقيق هذا الغرض. والسعي لتحريك الاموال المجمدة في المصارف الحكومية والاهلية لفرض تنشيط شتى النشاطات الاقتصادية والمجتمعية	لم تحدد	الاستراتيجية الوطنية للاشمول المالي	2	2019	2020	100%	0%	5	5					69%تم تحقيقها خلال ٢٠١٦ الى ٢٠١٨ (تهيئة مستلزمات اعداد الاستراتيجية) اما اعداد الاستراتيجية خلال ٢٠١٩ فتم تحقيق ٥% أي ان مجموع المنجز ٧٤%
		توفير بطاقات السفر لدفع المصاريف في الخارج ضمن سعر صرف نافذة العملة دون الحاجة الى مخاطر حمل واستعمال النقد في الخارج.	1	2019	2019	100%	0%	25	25					تم التواصل مع شركة visa card و master card لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة معهم
